
HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
ENGINEERING


ROSETTI MARINO

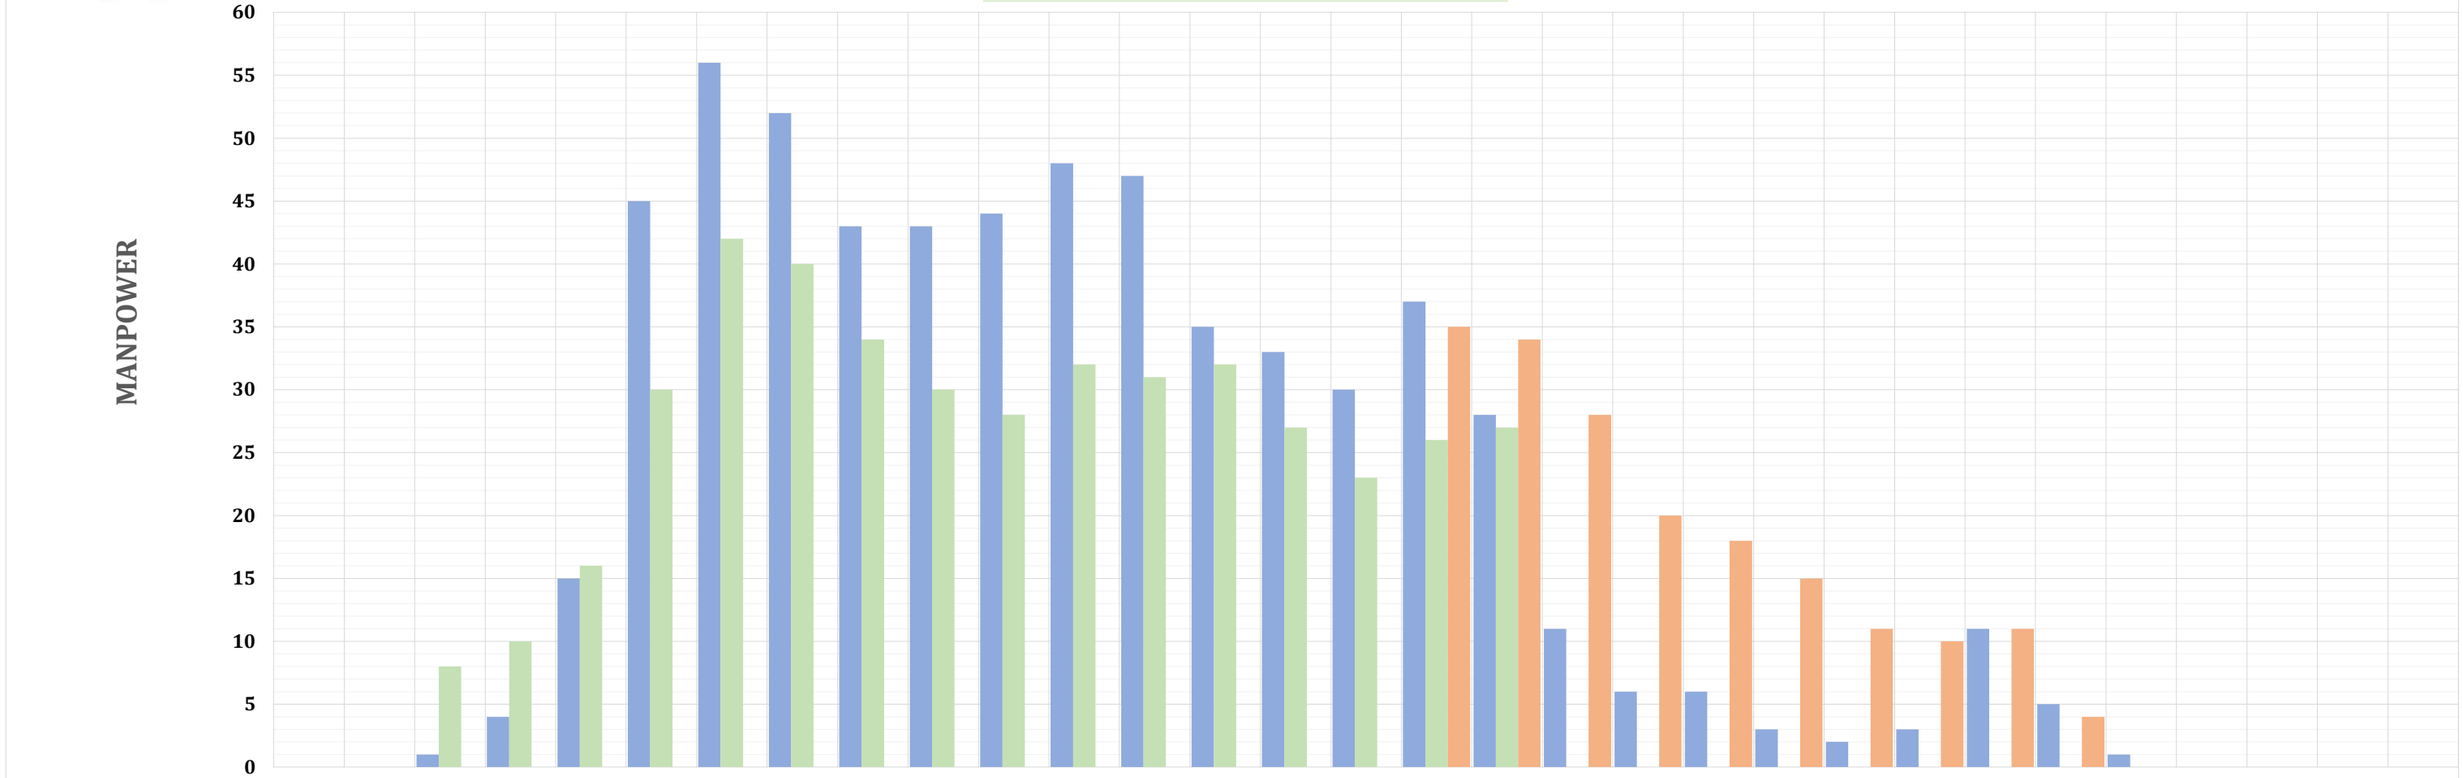

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	1	4	15	45	56	52	43	43	44	48	47	35	33	30	37	28	11	6	6	3	2	3	11	5	1	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	34	28	20	18	15	11	10	11	4	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	8	10	16	30	42	40	34	30	28	32	31	32	27	23	26	27													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
T&I ENGINEERING


ROSETTI MARINO

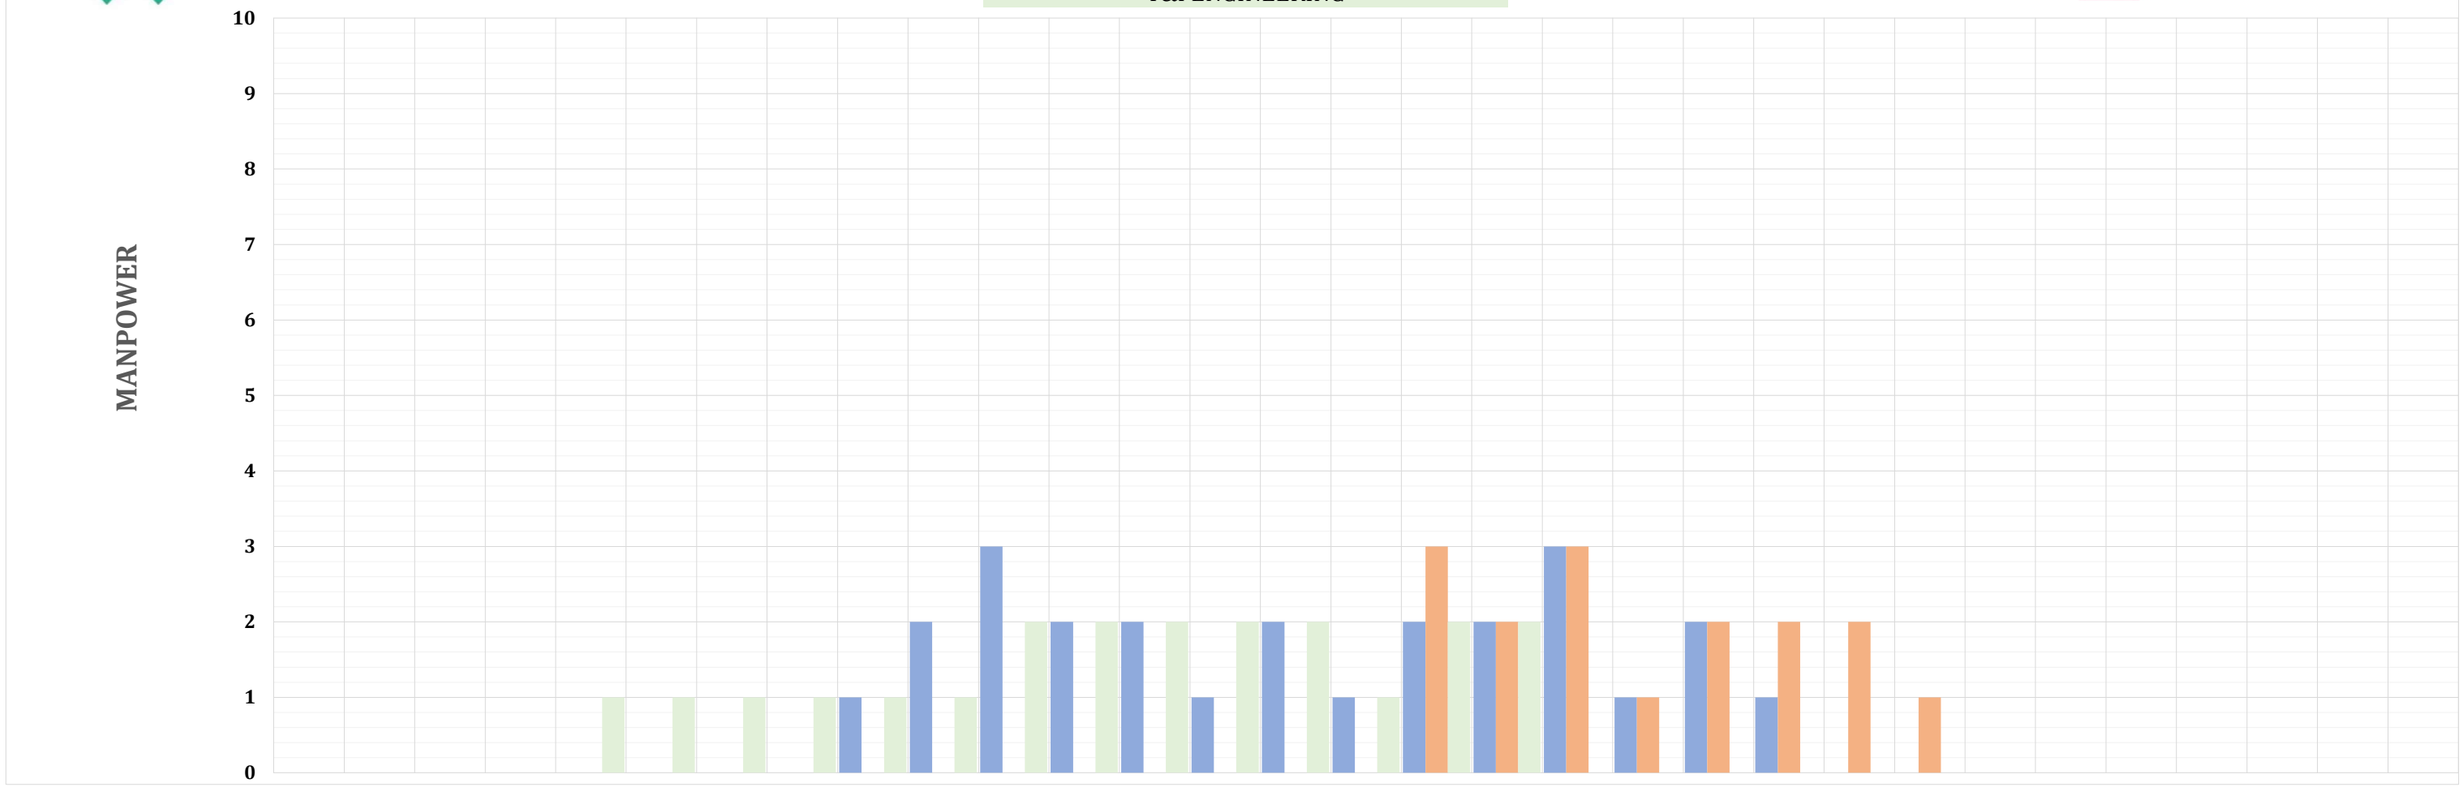

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	1	2	1	2	2	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2													


HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
PROCESS ENGINEERING

ROSETTI MARINO

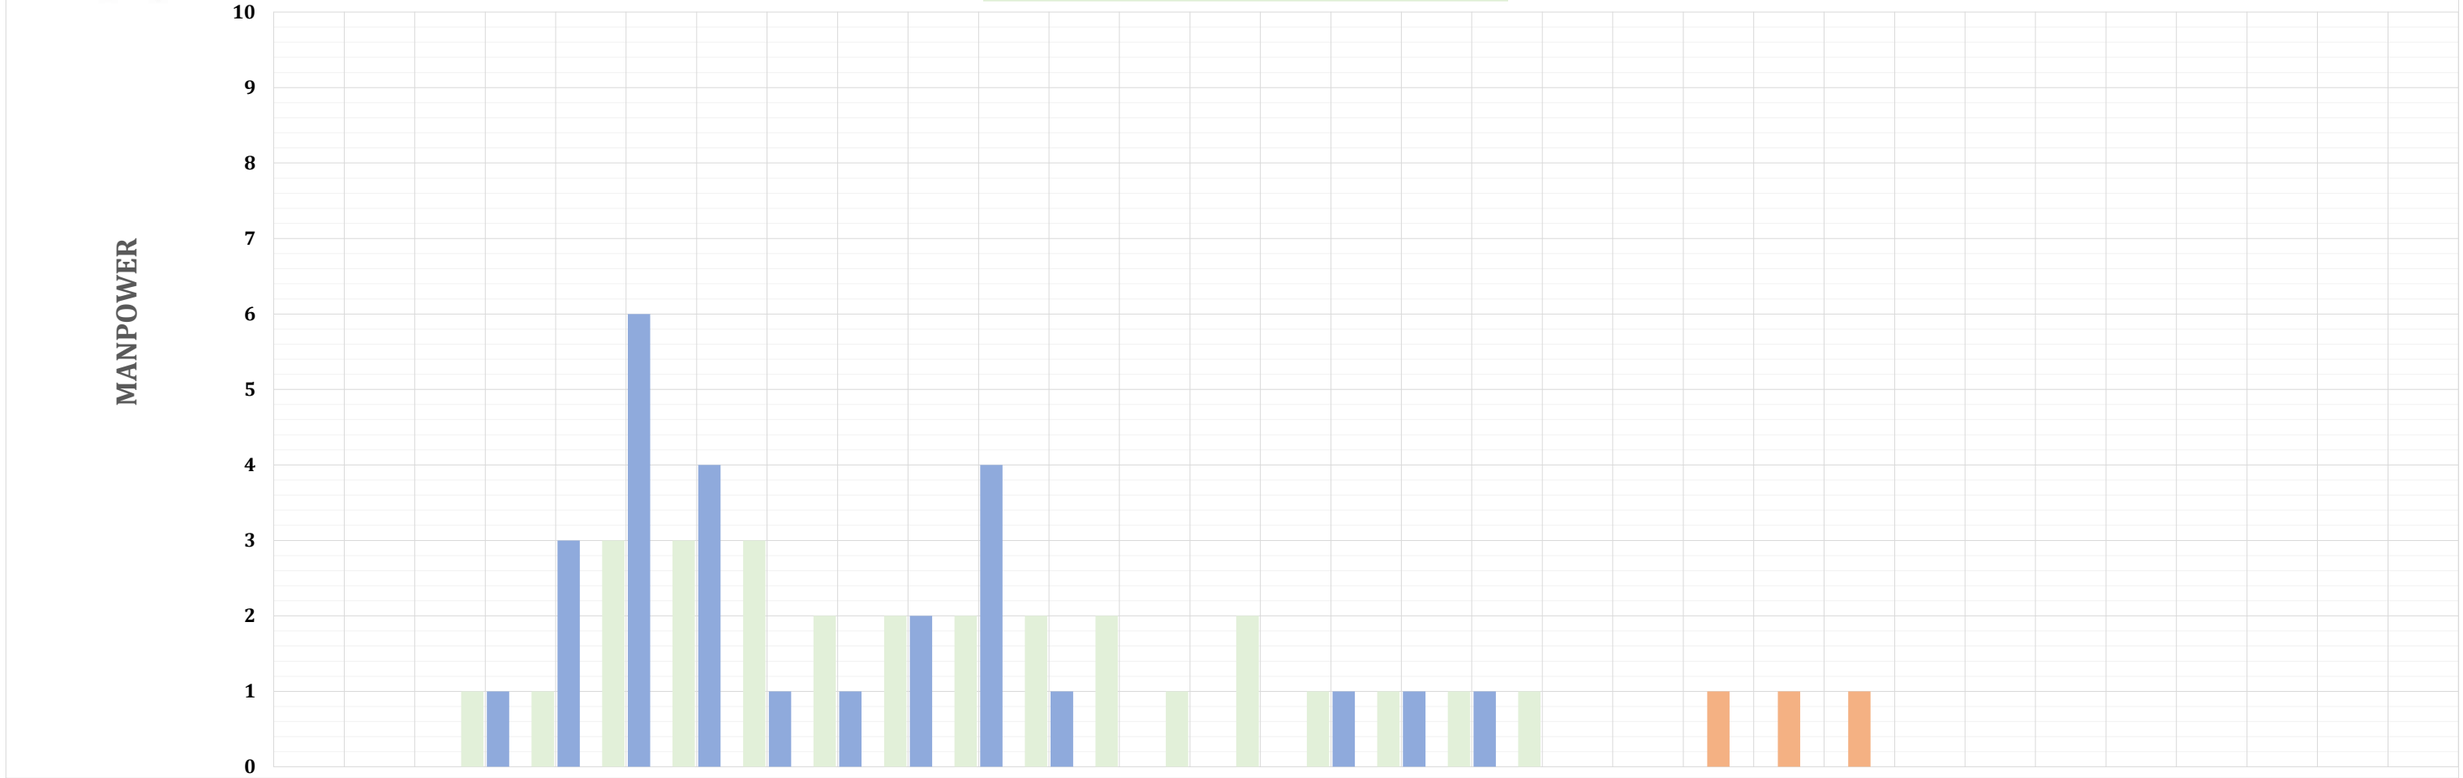

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	1	3	6	4	1	1	2	4	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1													


HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
ABB ENGINEERING

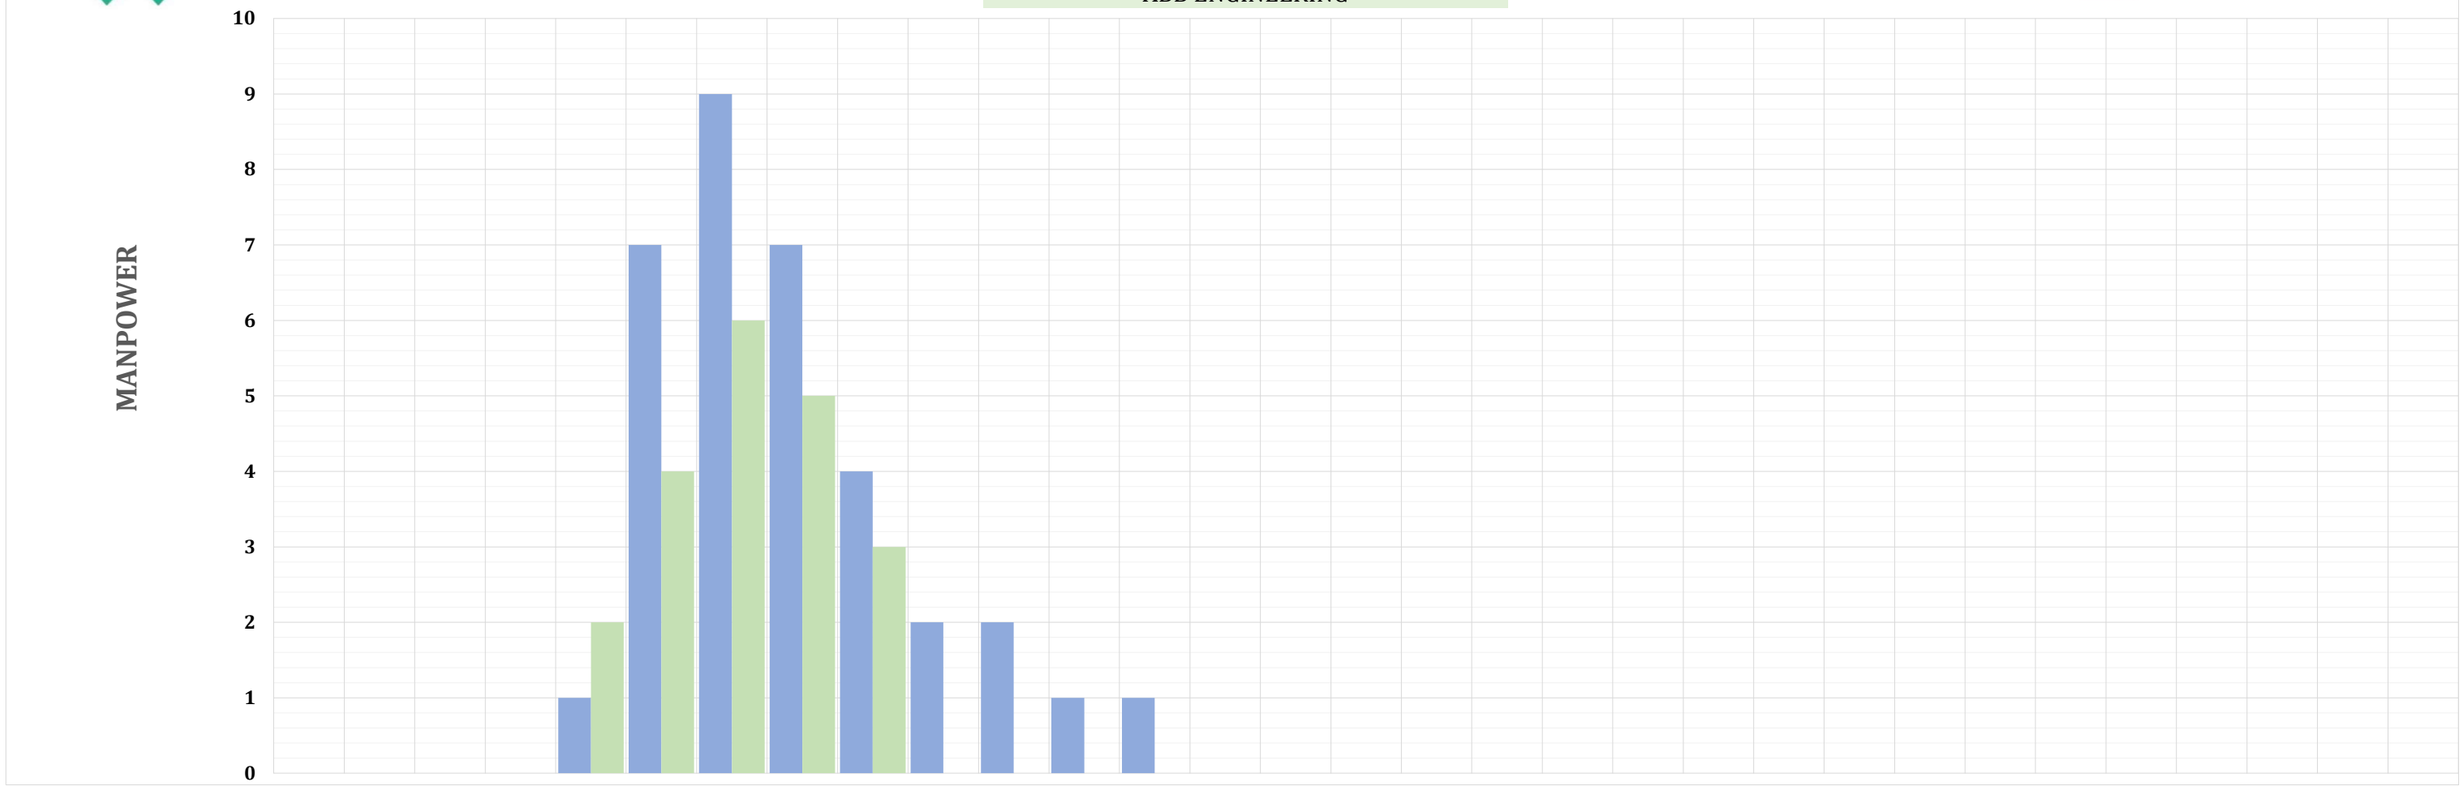

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	1	7	9	7	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	2	4	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
ELECTRICAL ENGINEERING


ROSETTI MARINO

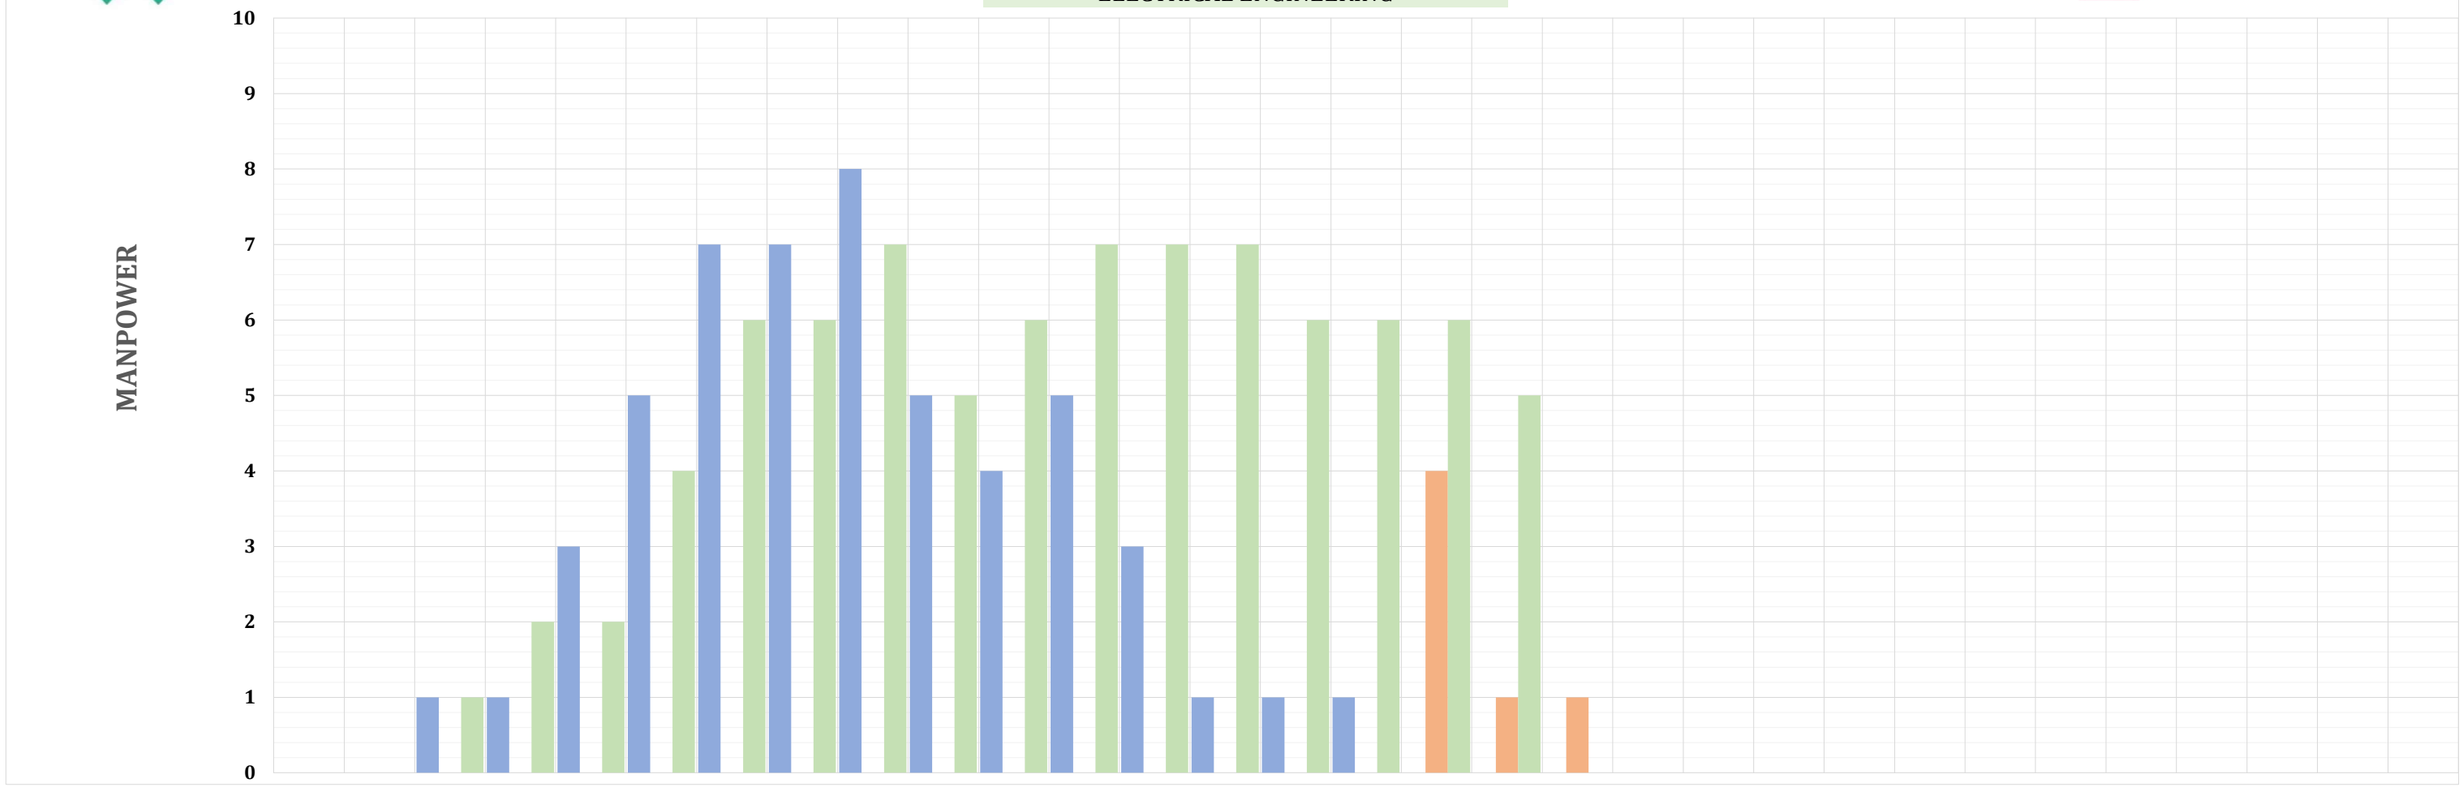

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	1	1	3	5	7	7	8	5	4	5	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	1	2	2	4	6	6	7	5	6	7	7	7	6	6	6	5													


HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEERING

ROSETTI MARINO

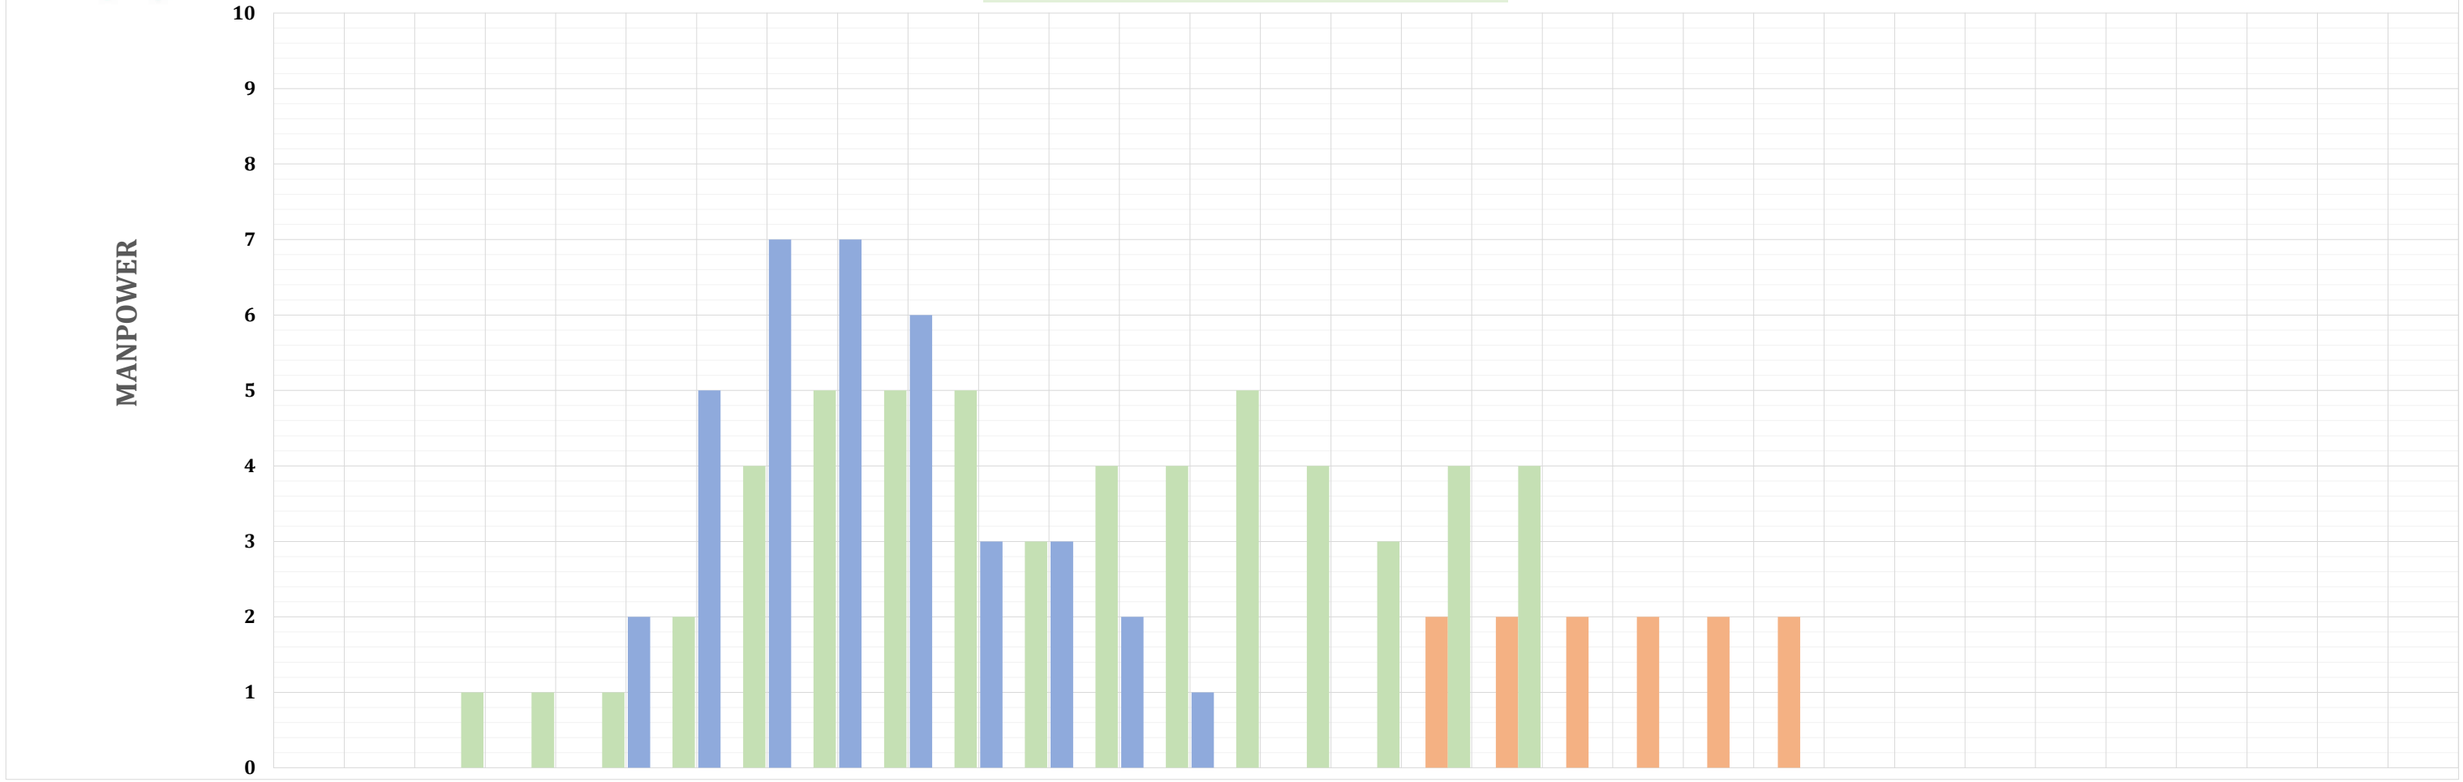

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	2	5	7	7	6	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	1	1	1	2	4	5	5	5	3	4	4	5	4	3	4	4													


HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
TELECOMM ENGINEERING

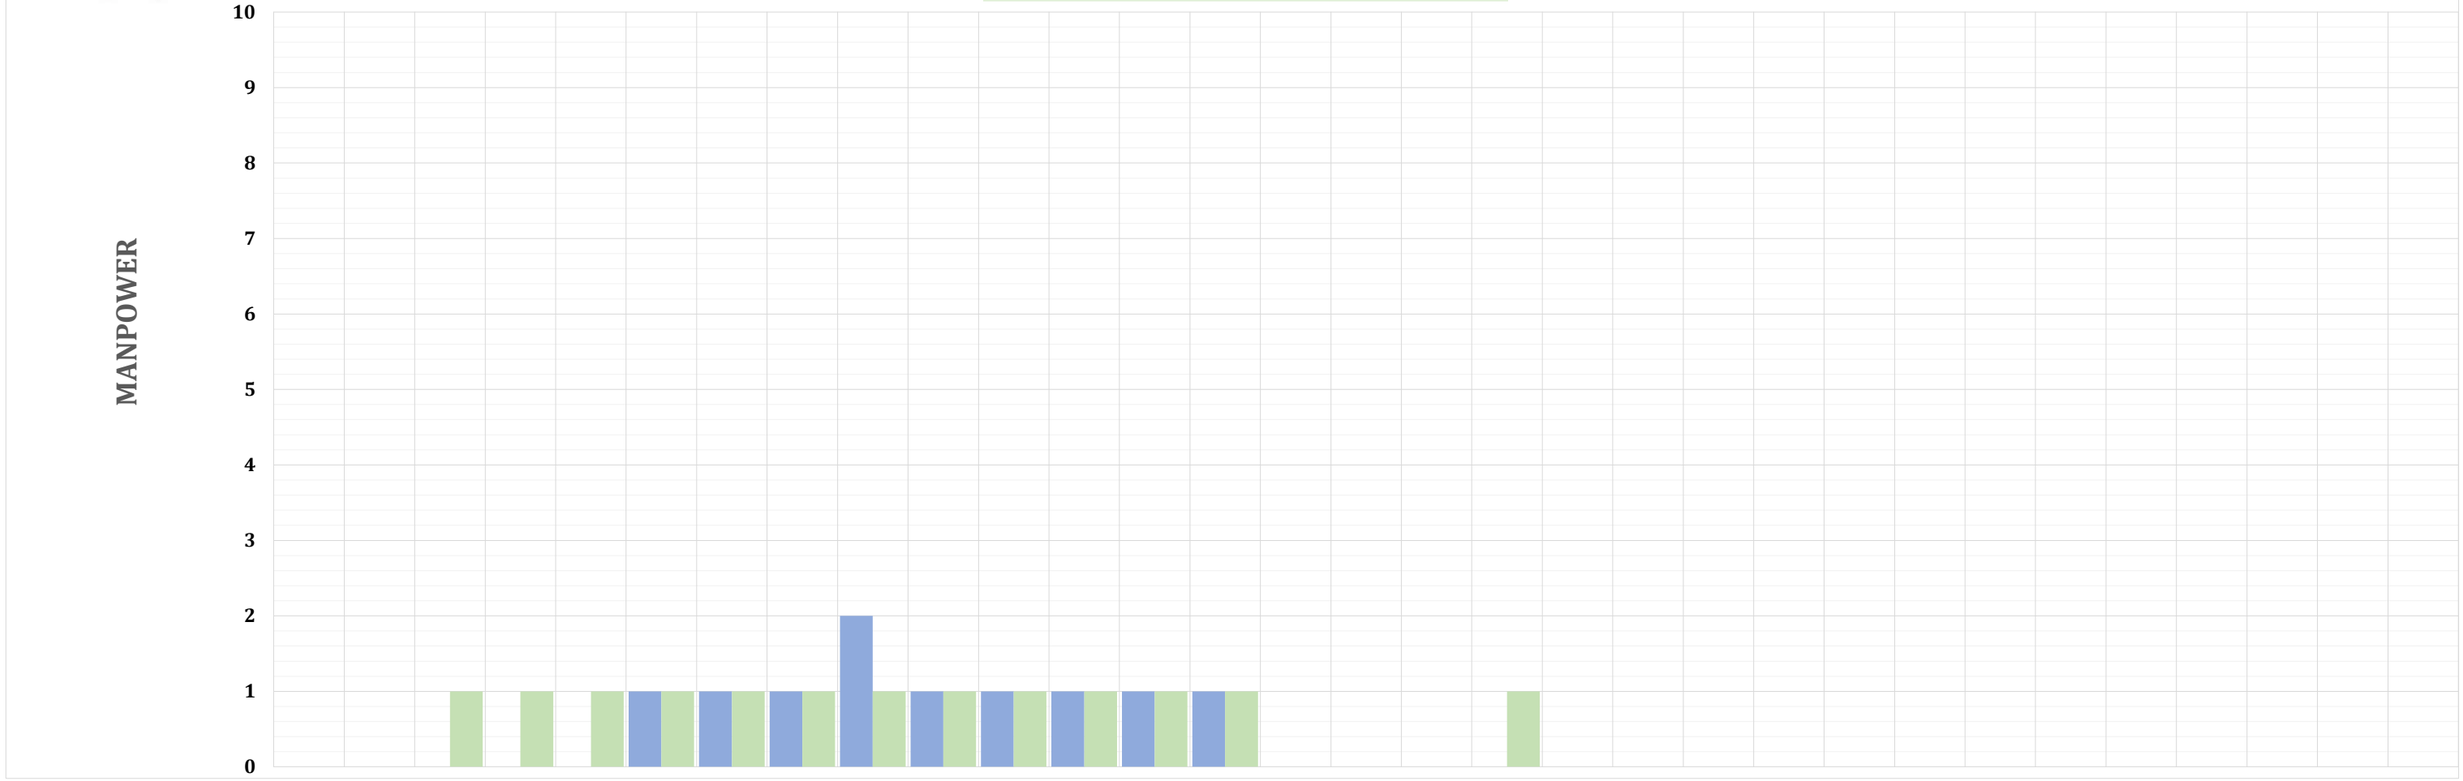

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
SAFETY ENGINEERING


ROSETTI MARINO

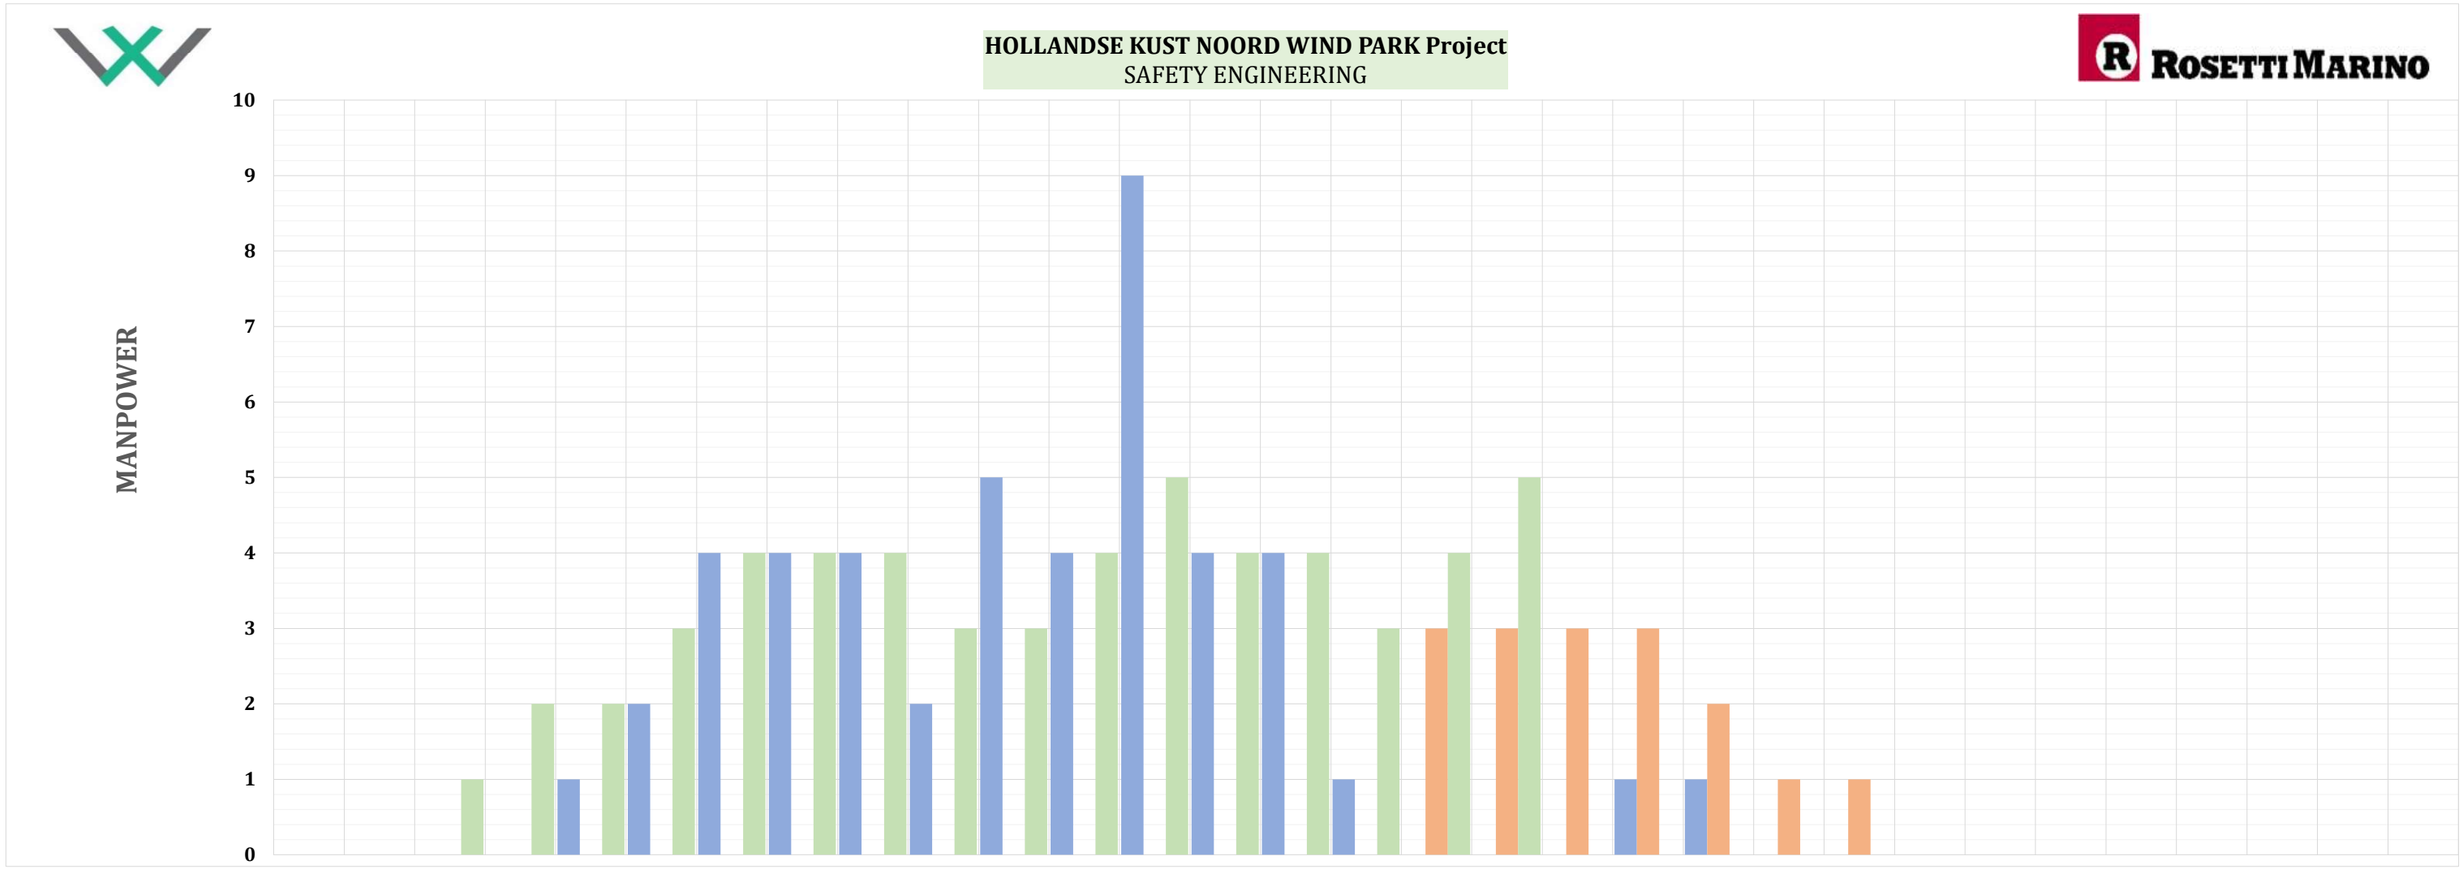

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	1	2	4	4	4	2	5	4	9	4	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	1	2	2	3	4	4	4	3	3	4	5	4	4	3	4	5													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
MECHANICAL ENGINEERING


ROSETTI MARINO

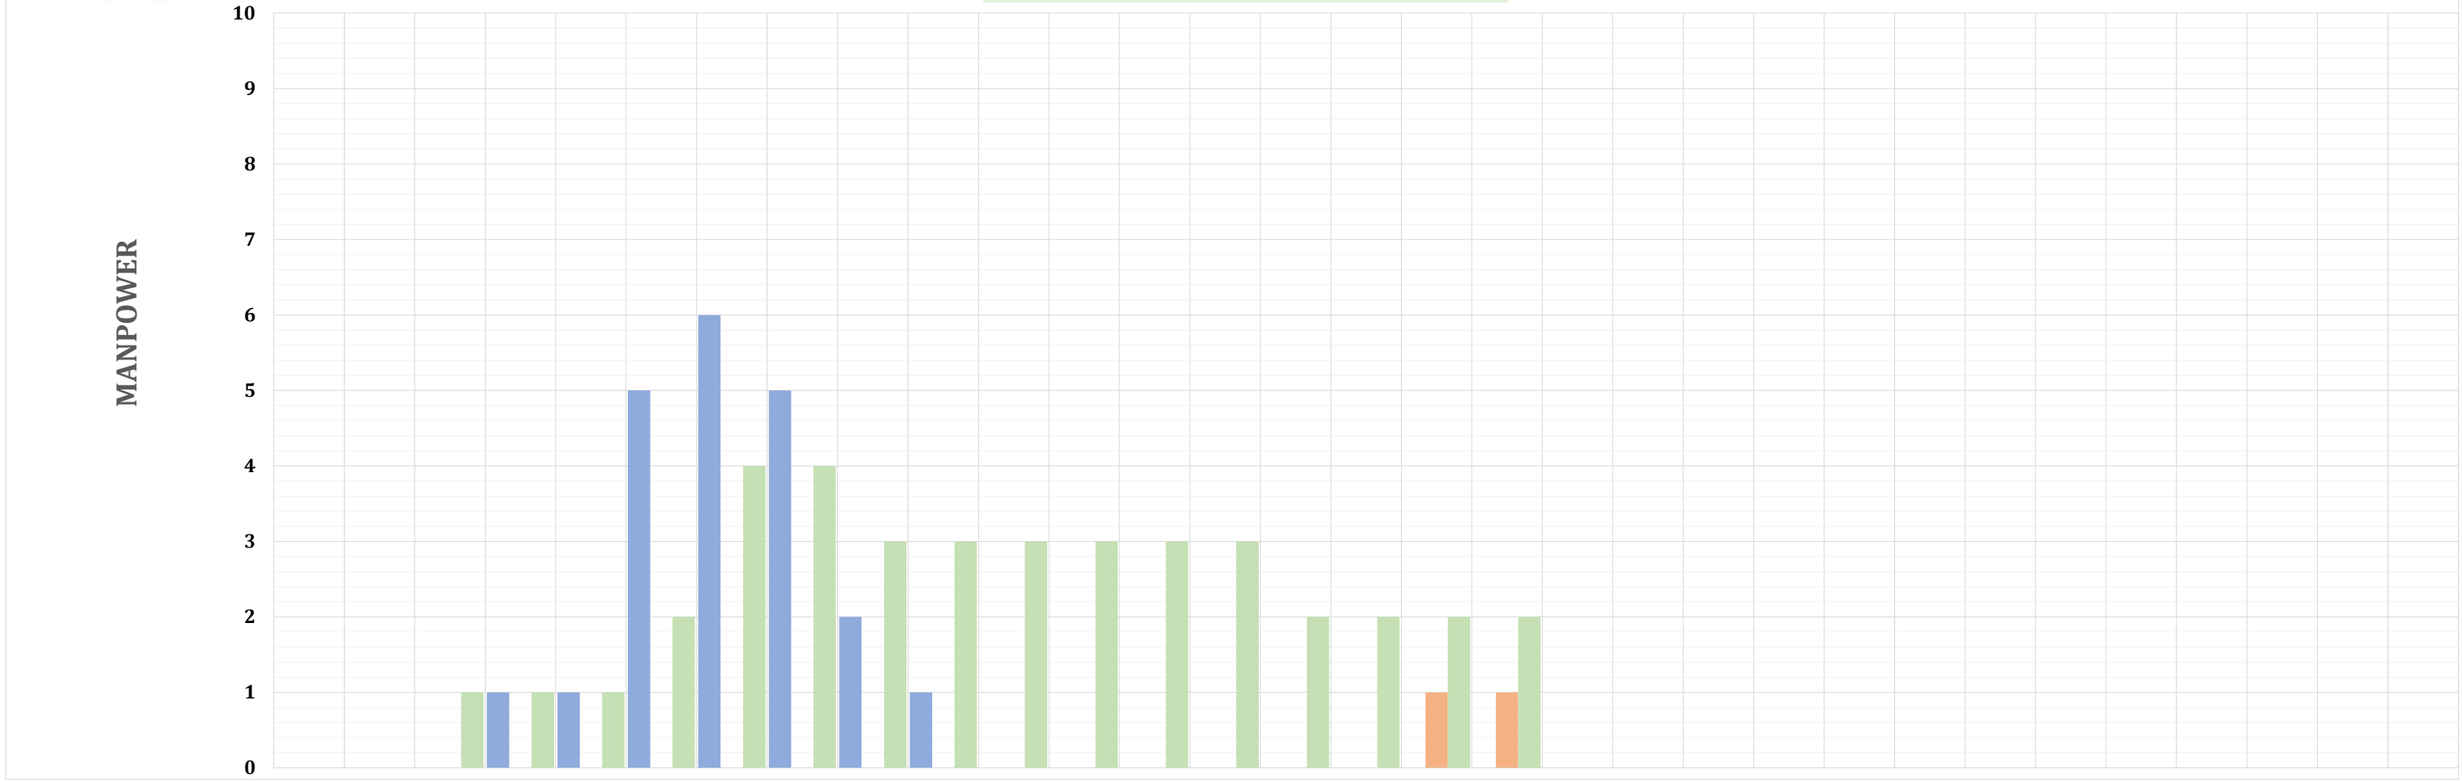

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	1	1	5	6	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	1	1	1	2	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
PIPING ENGINEERING


ROSETTI MARINO

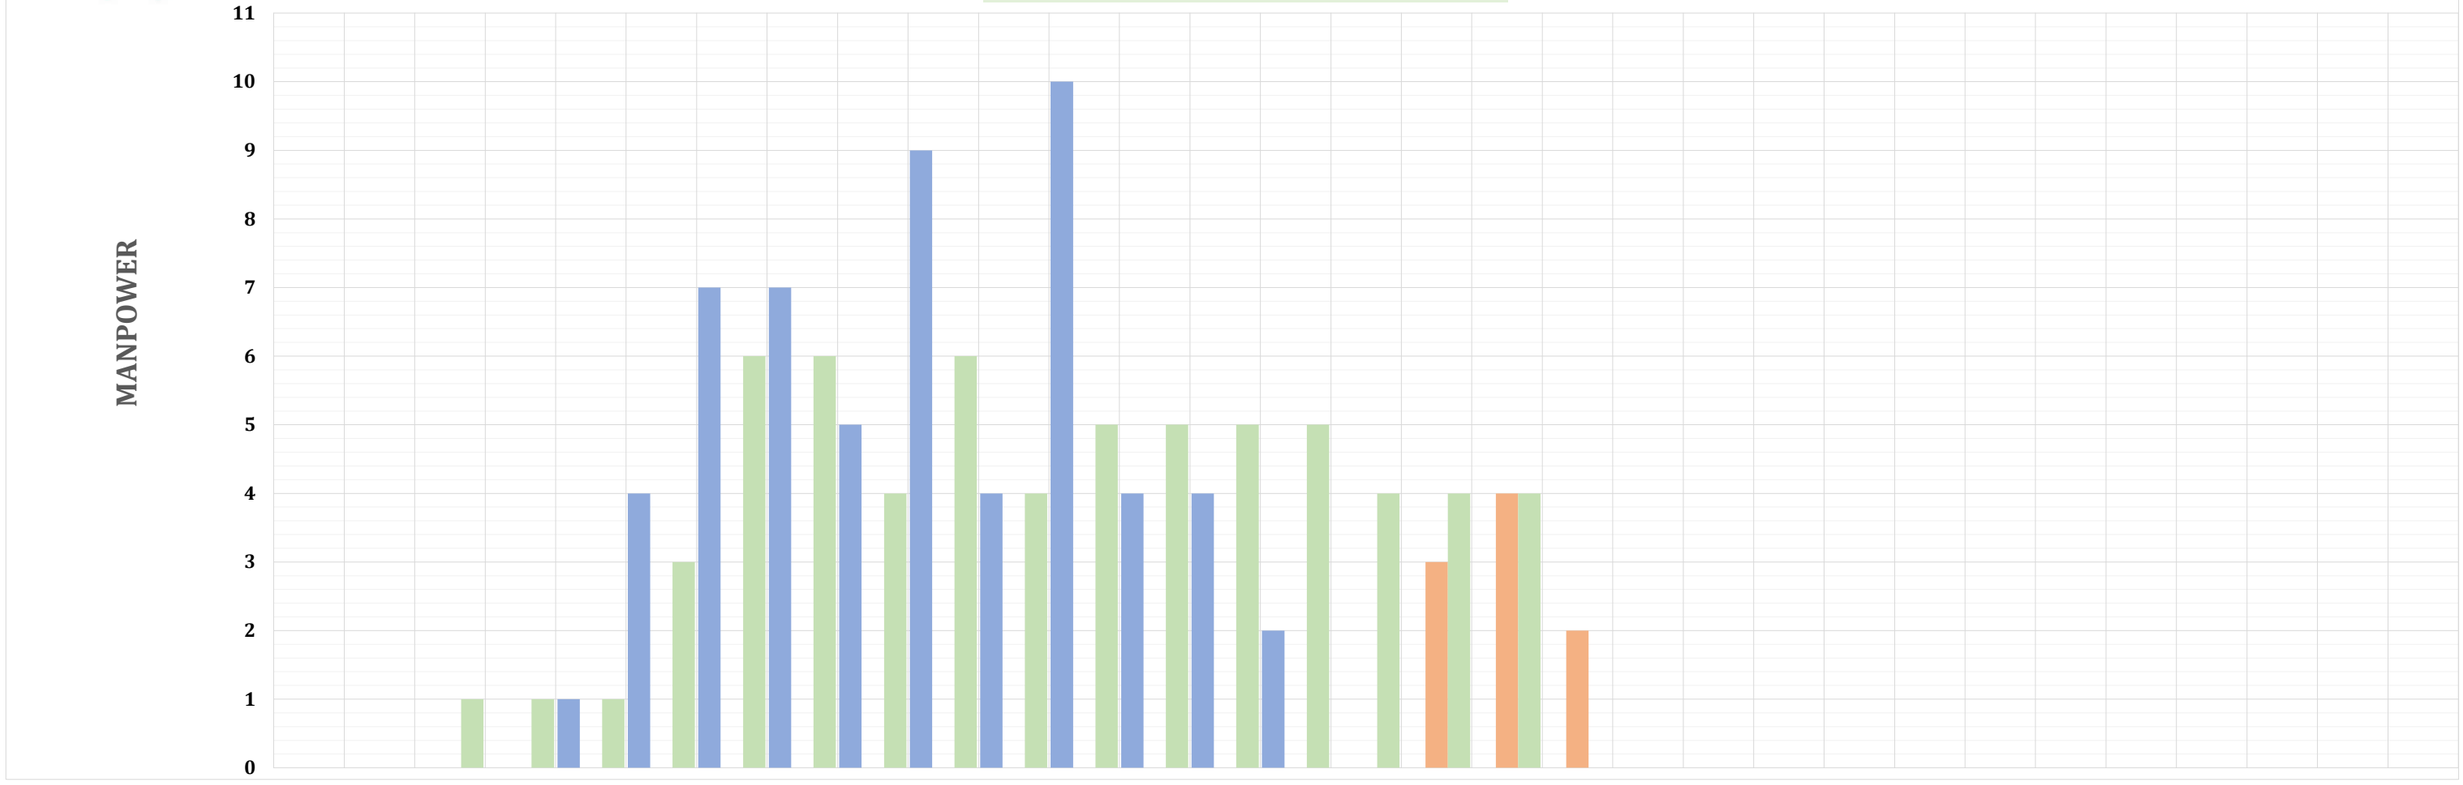

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	1	4	7	7	5	9	4	10	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	1	1	1	3	6	6	4	6	4	5	5	5	5	4	4	4													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
ARCHITECTURAL ENGINEERING


ROSETTI MARINO

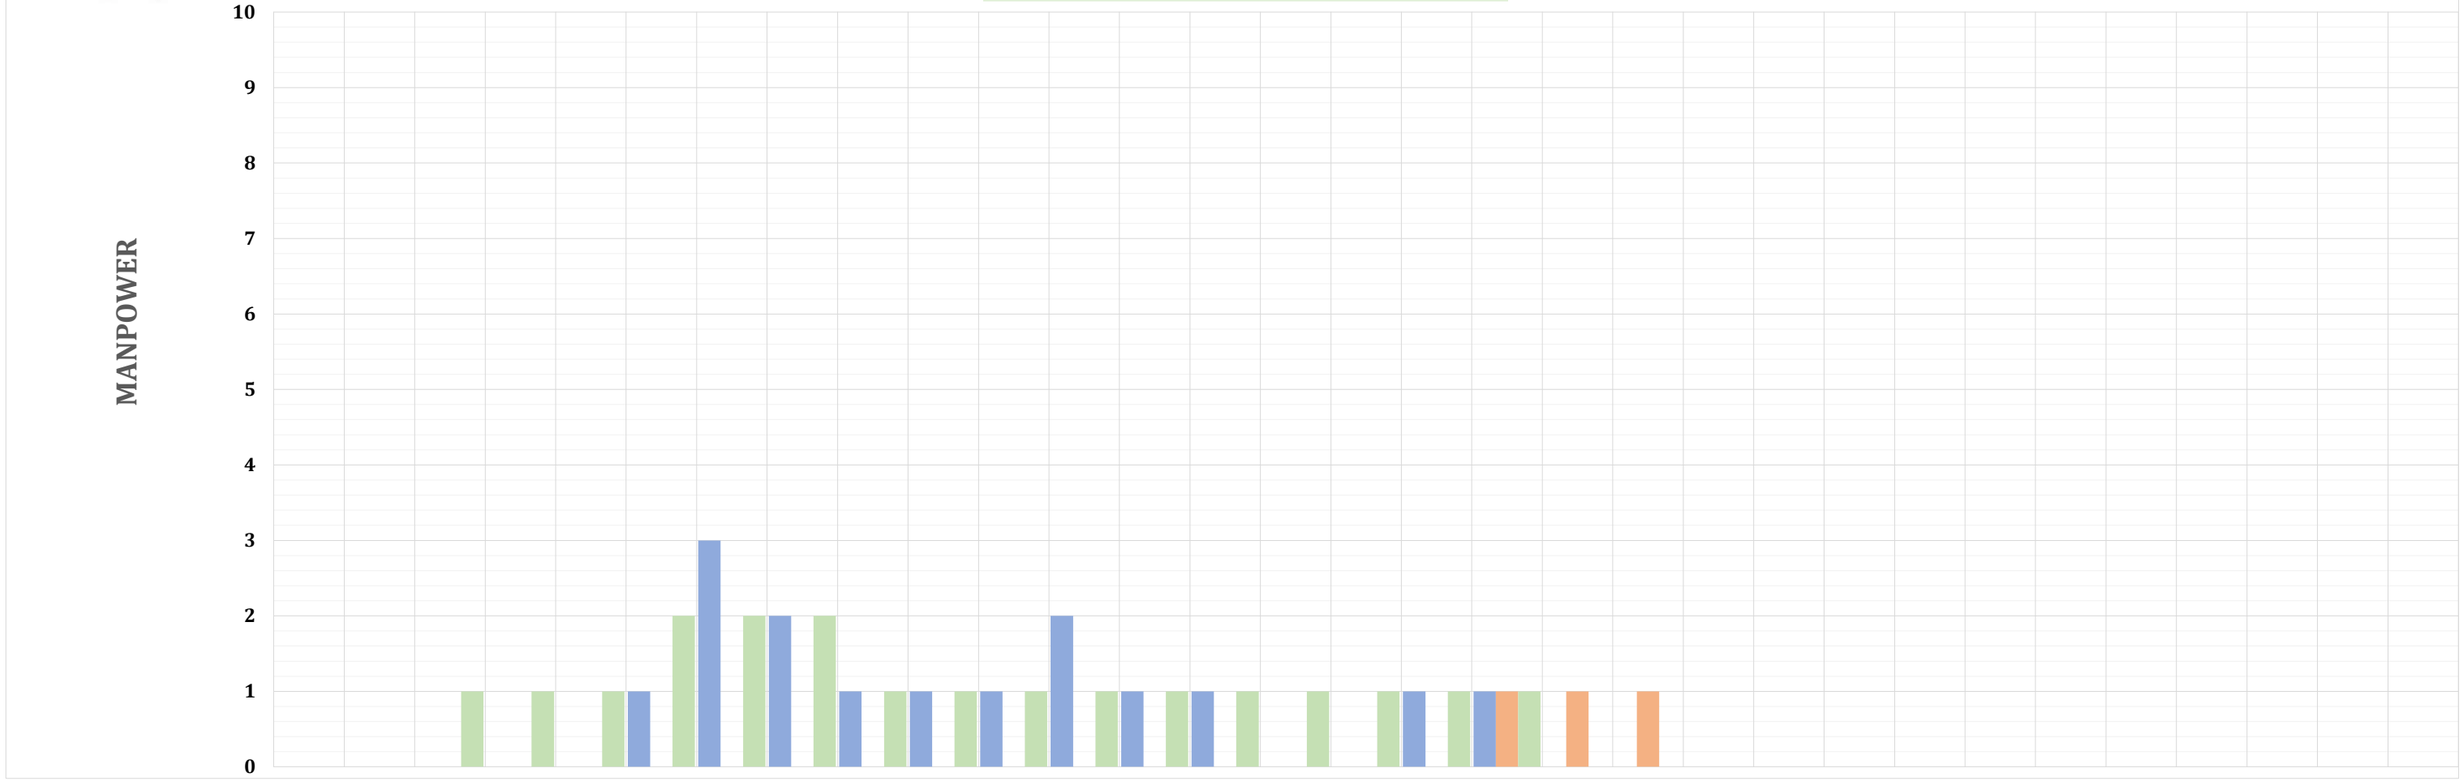

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
STRUCTURAL ENGINEERING


ROSETTI MARINO

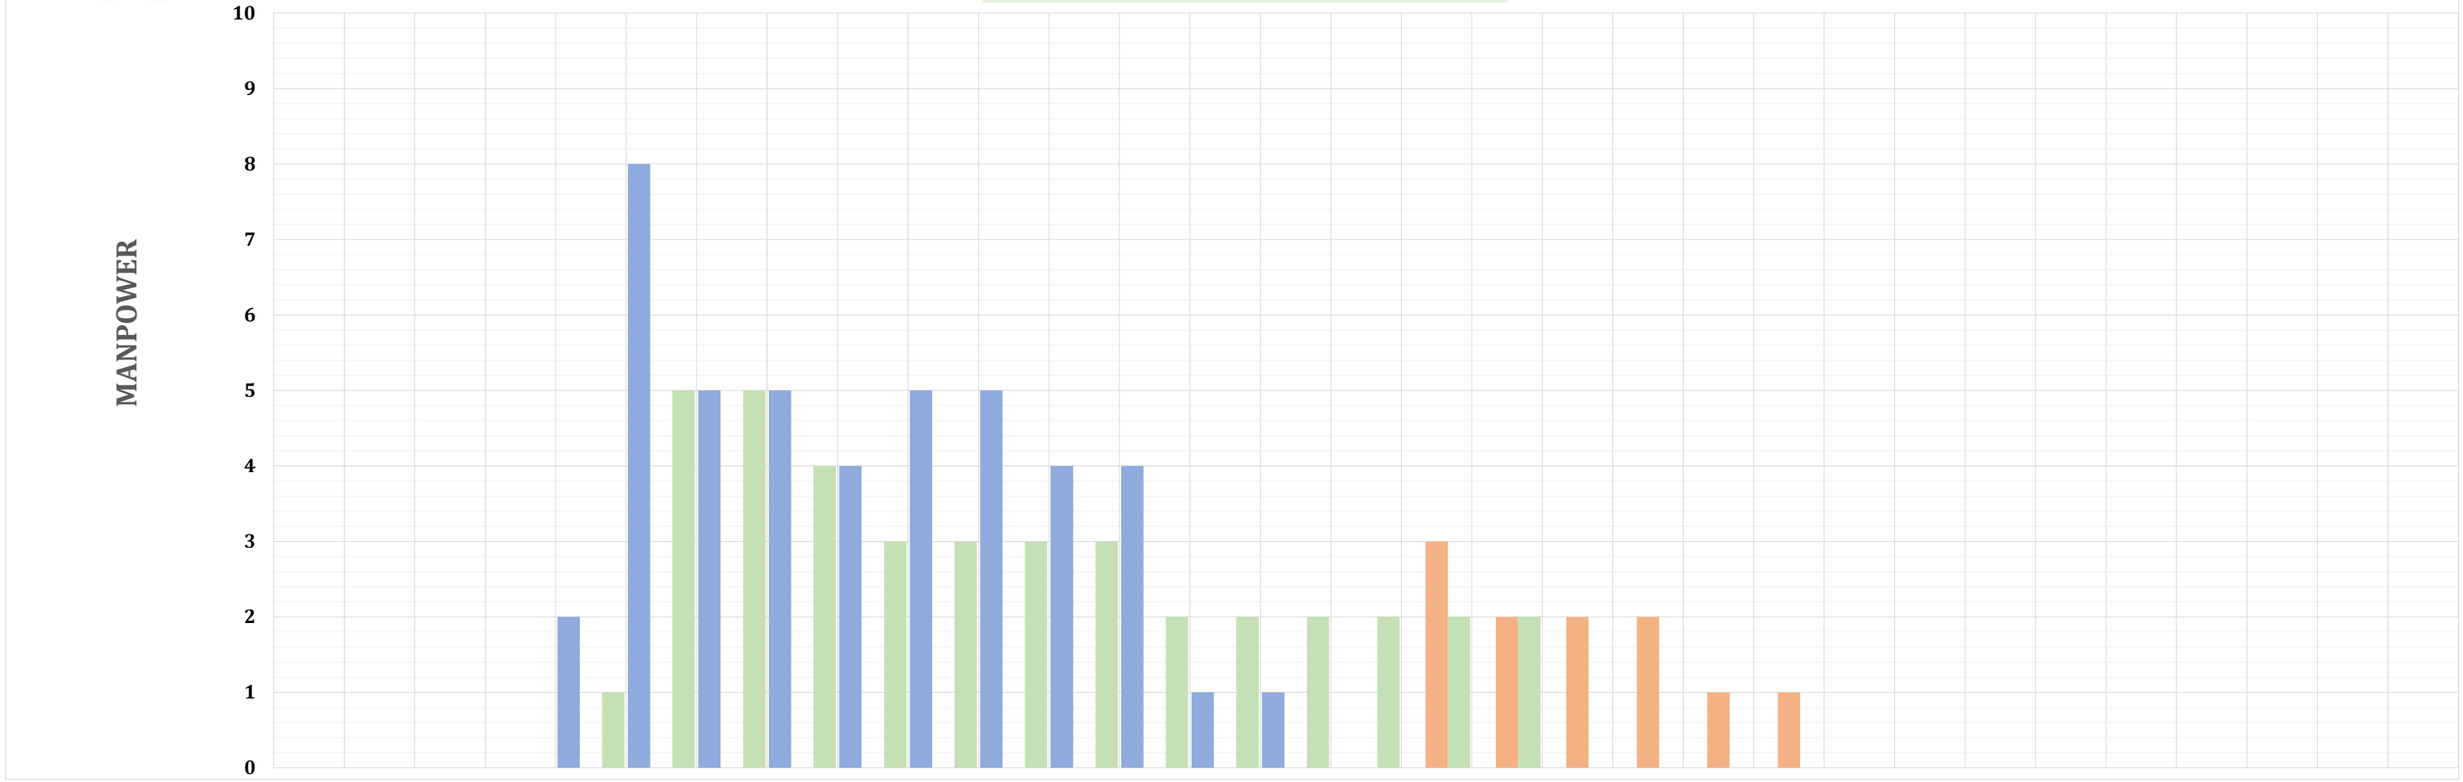

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	2	8	5	5	4	5	5	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	1	5	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
CONSTRUCTION Overall


ROSETTI MARINO

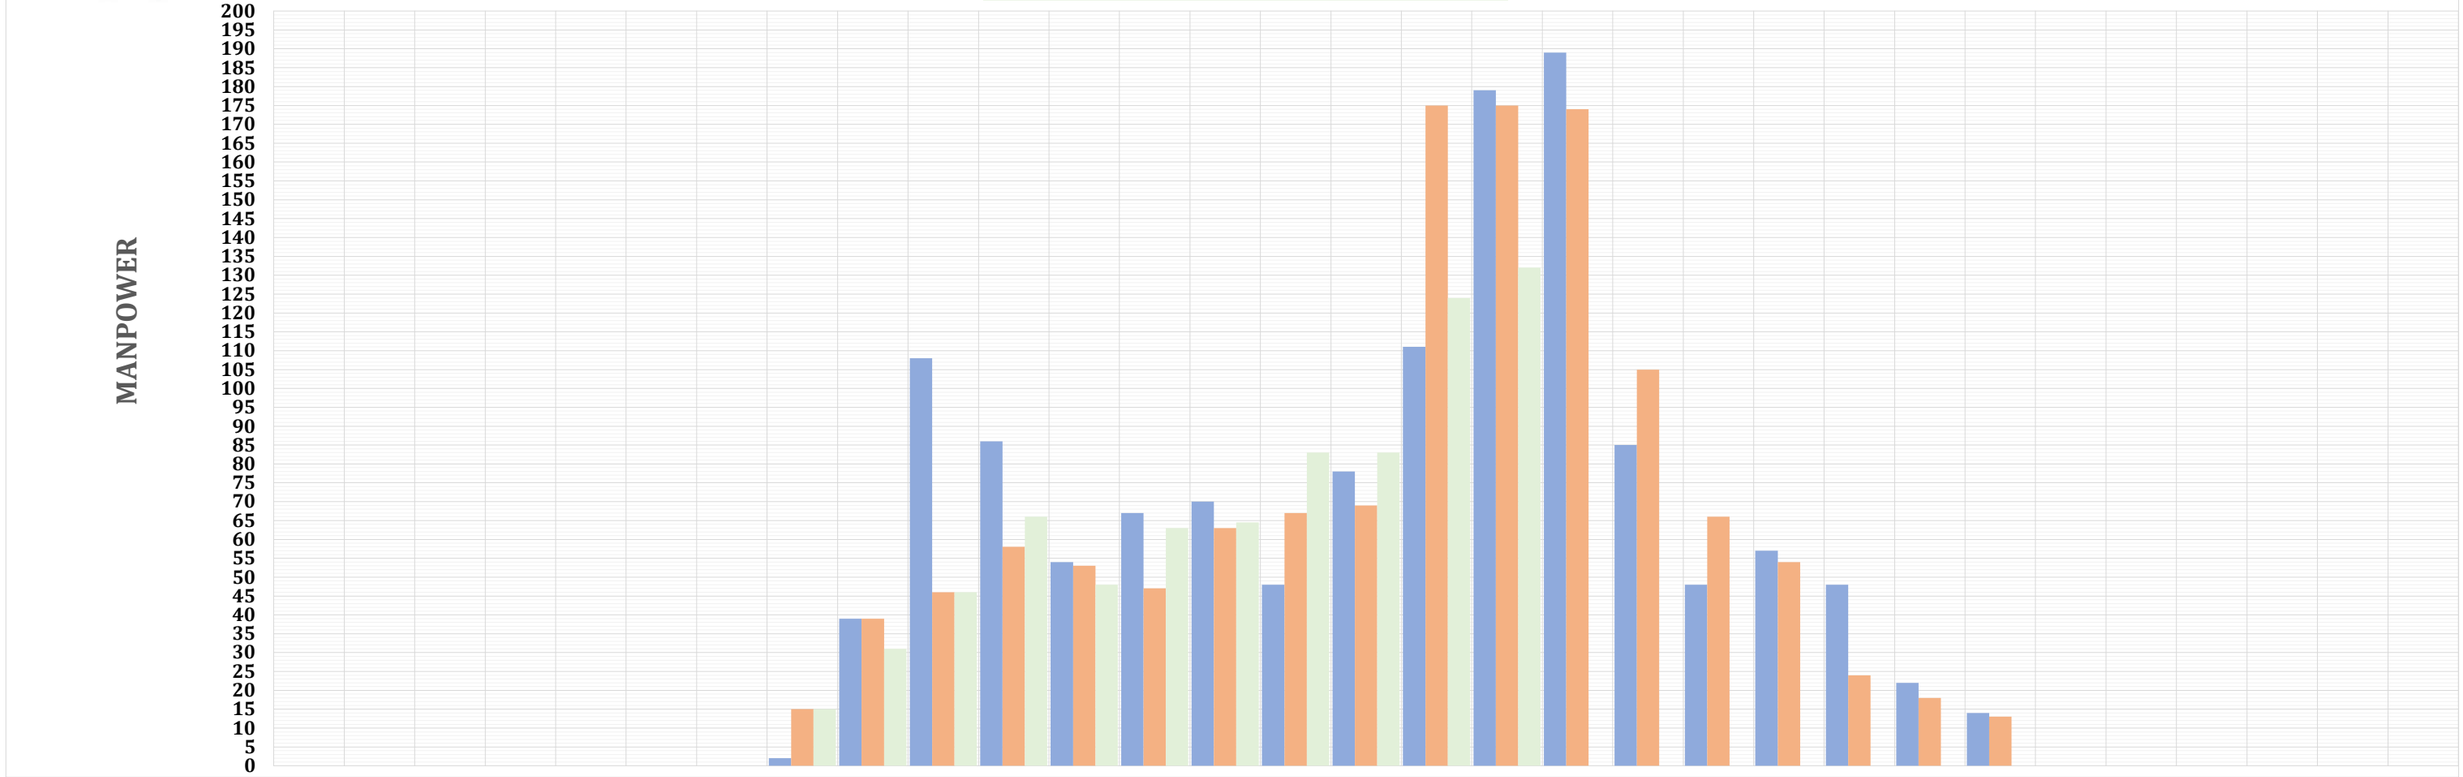

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	2	39	108	86	54	67	70	48	78	111	179	189	85	48	57	48	22	14	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	15	39	46	58	53	47	63	67	69	175	175	174	105	66	54	24	18	13	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	15	31	46	66	48	63	65	83	83	124	132													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
TOPSIDE (Pre-Fab, Asse, Erec) CONSTRUCTION


ROSETTI MARINO

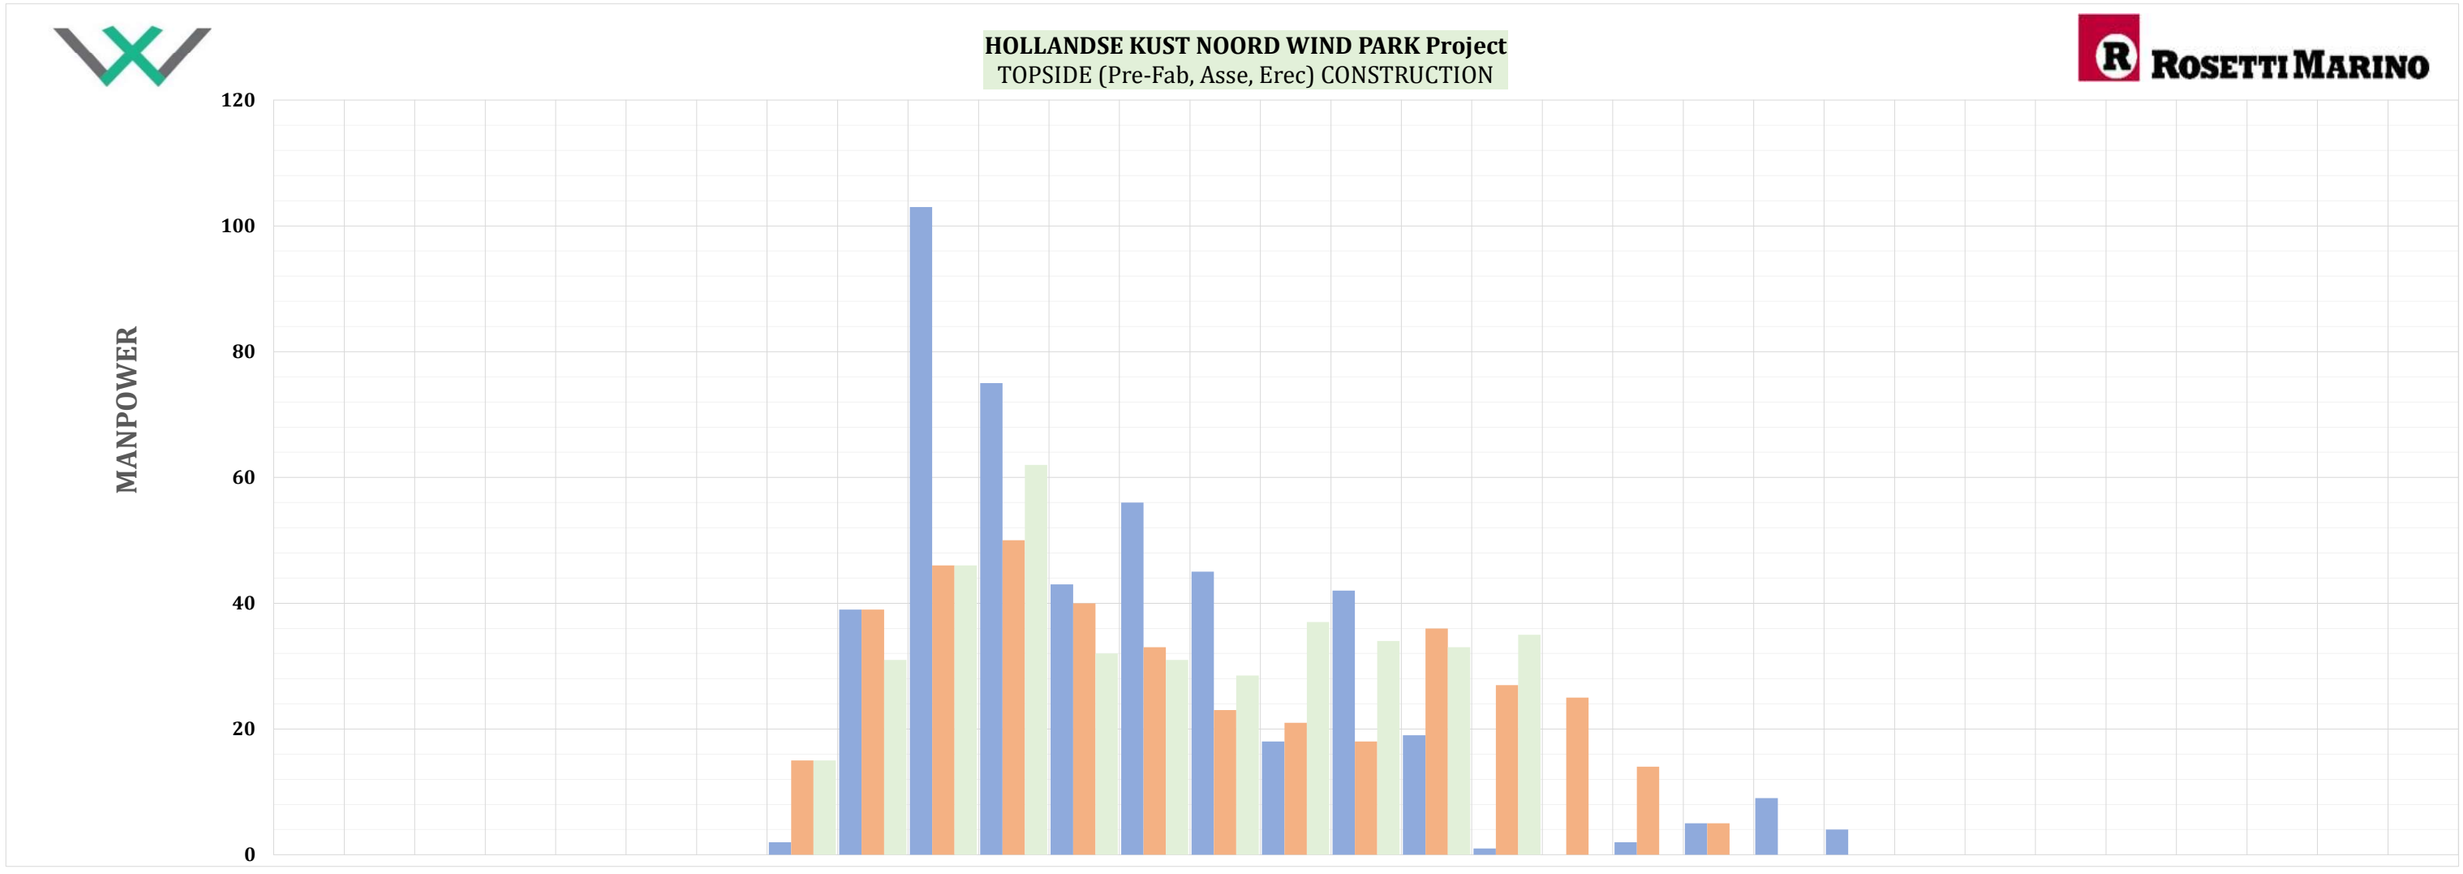

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	2	39	103	75	43	56	45	18	42	19	1	0	2	5	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	15	39	46	50	40	33	23	21	18	36	27	25	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	15	31	46	62	32	31	29	37	34	33	35													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
GRILLAGE (Pre-Fab, Asse, Erec) CONSTRUCTION


ROSETTI MARINO

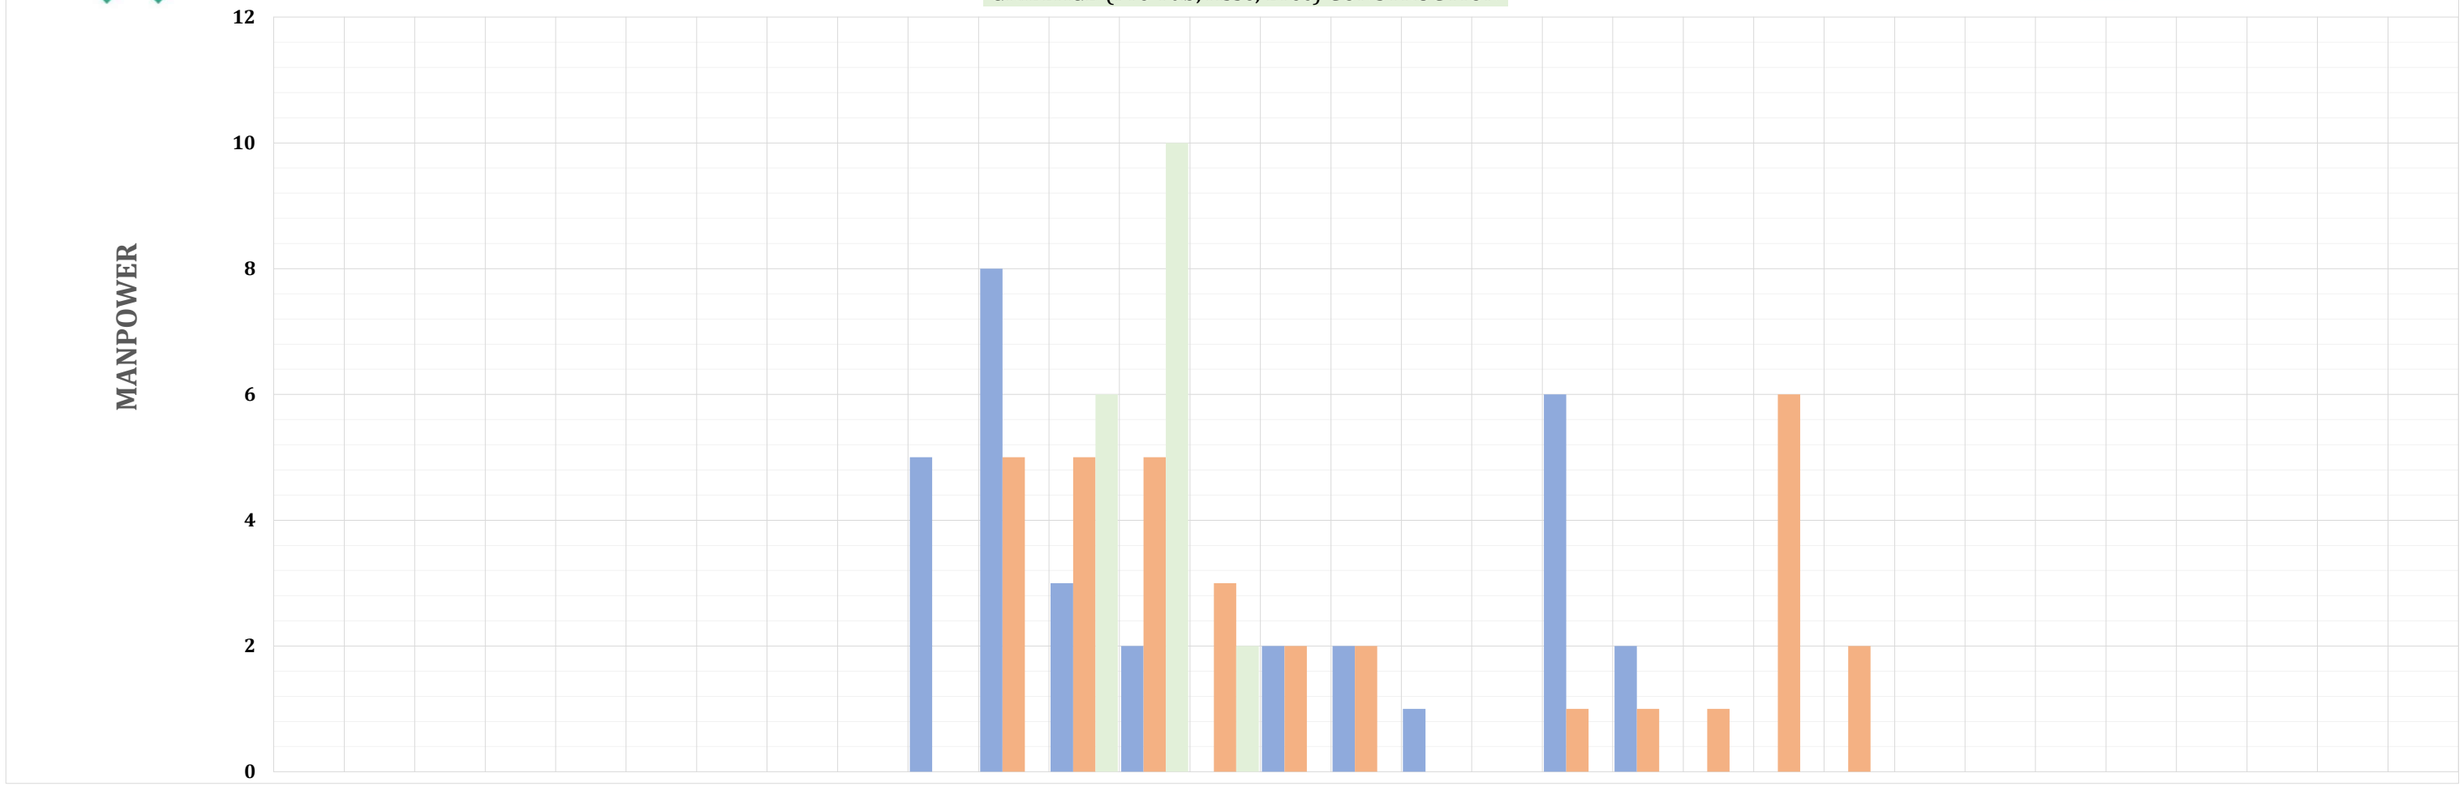

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	3	2	0	2	2	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	3	2	2	0	0	1	1	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	2	0	0	0	0													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
TRANSITION PIECE (Pre-Fab, Asse, Erec) CONSTRUCTION


ROSETTI MARINO

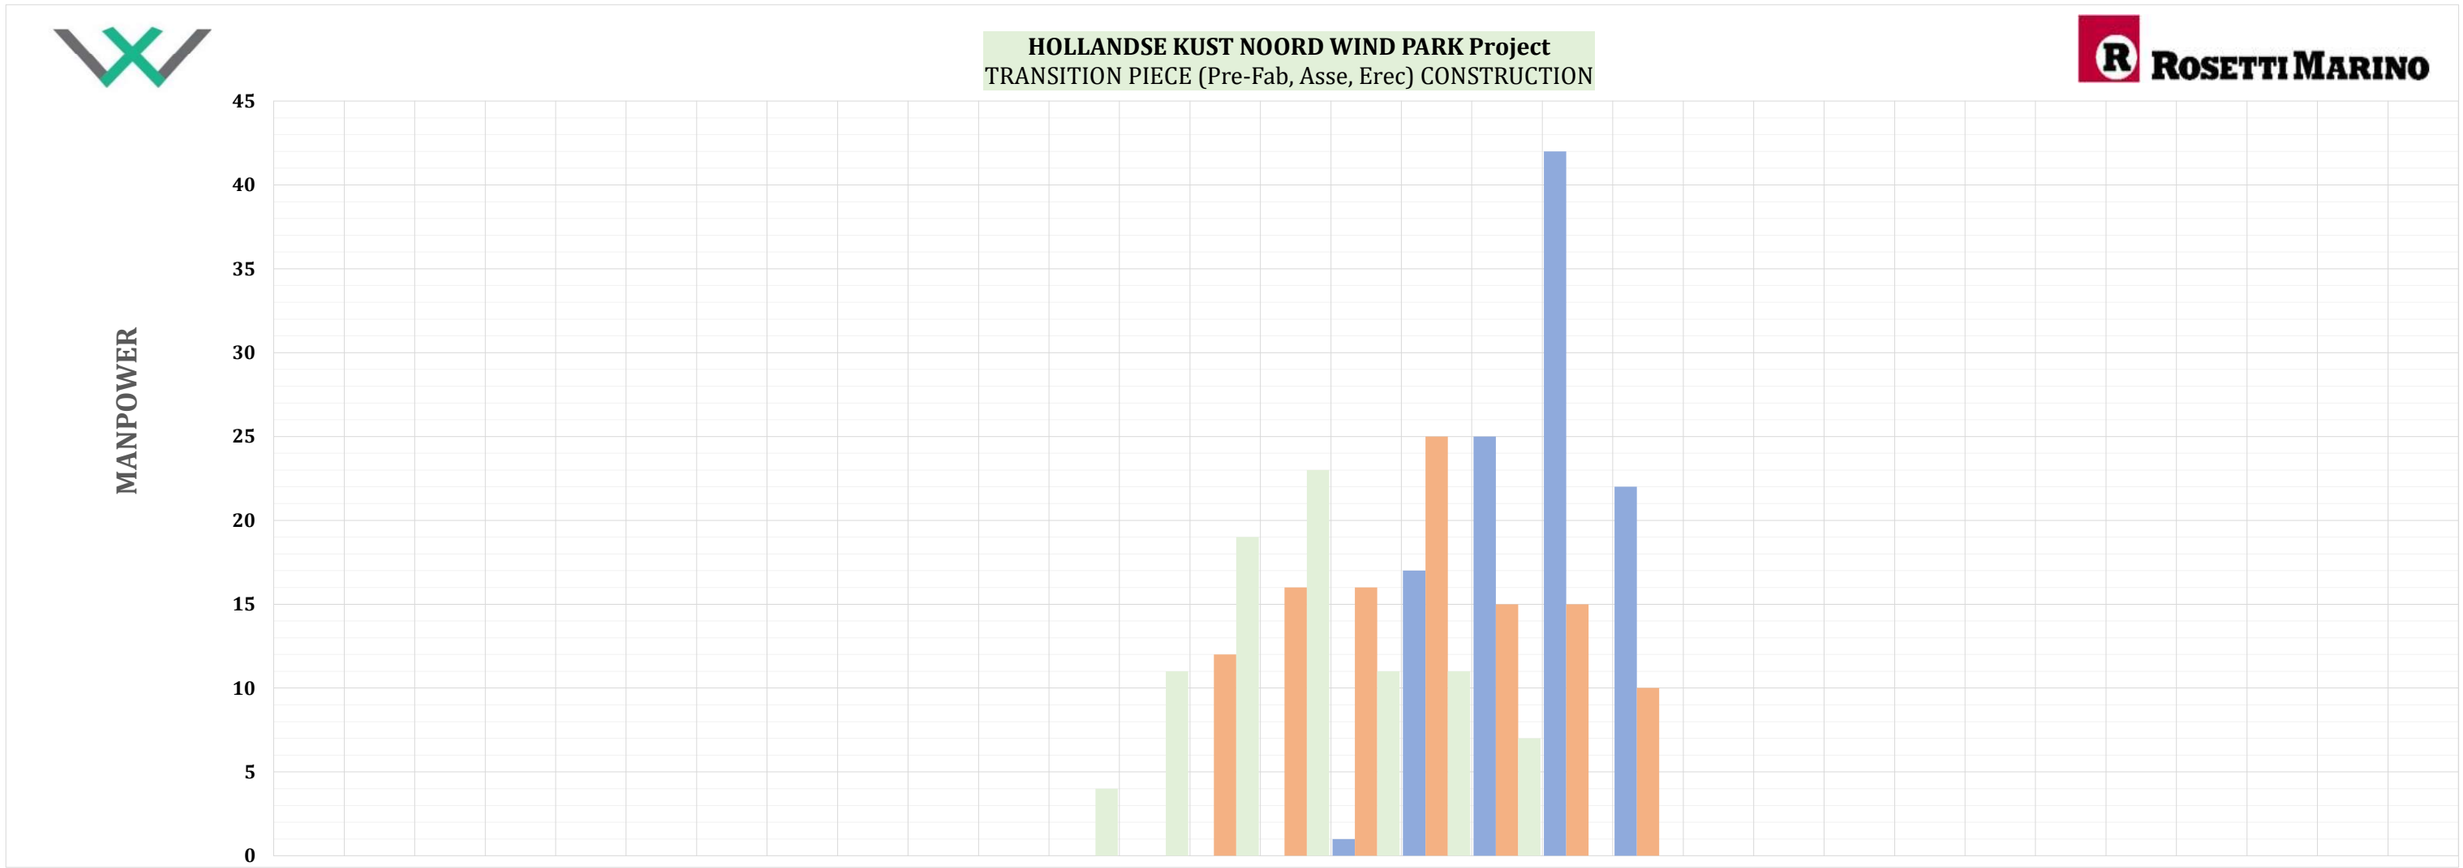

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	25	42	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16	16	25	15	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	19	23	11	11	7													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
PAINTING (Structure & Piping) CONSTRUCTION


ROSETTI MARINO

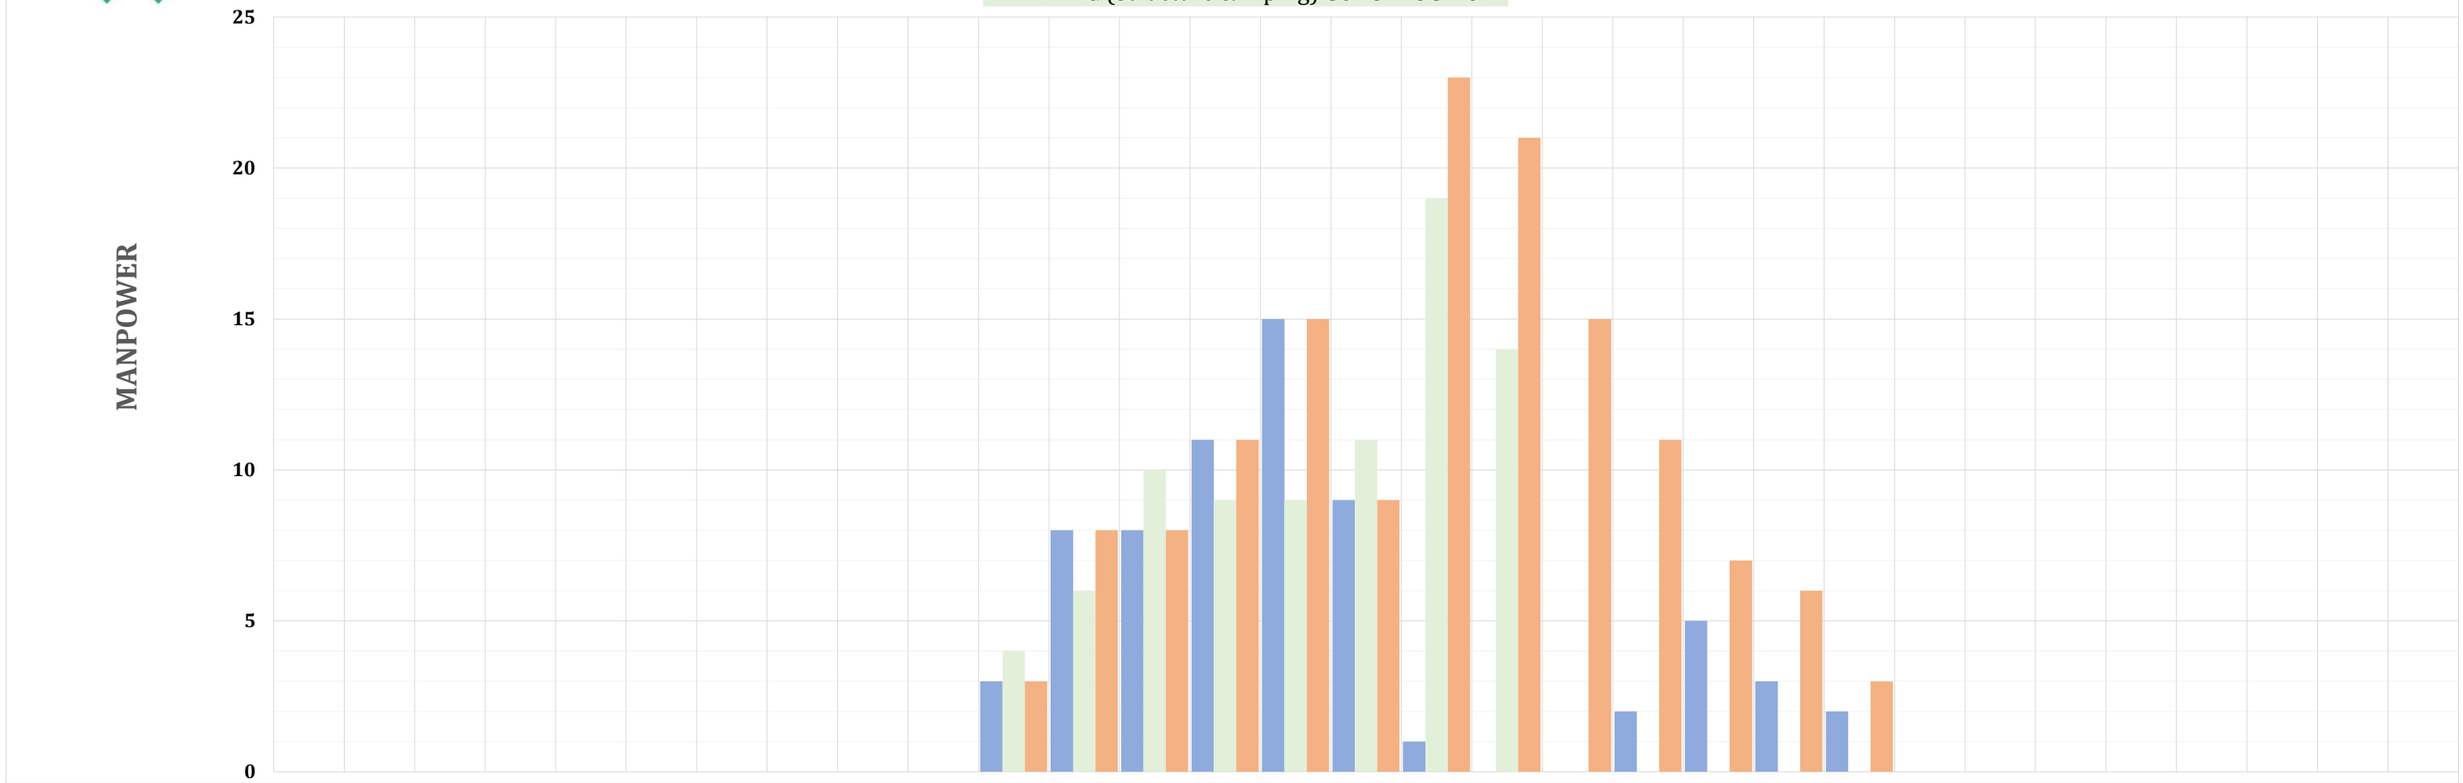

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	11	15	9	1	0	0	2	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	11	15	9	23	21	15	11	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	9	9	11	19	14													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
ELECTRICAL CONSTRUCTION


ROSETTI MARINO

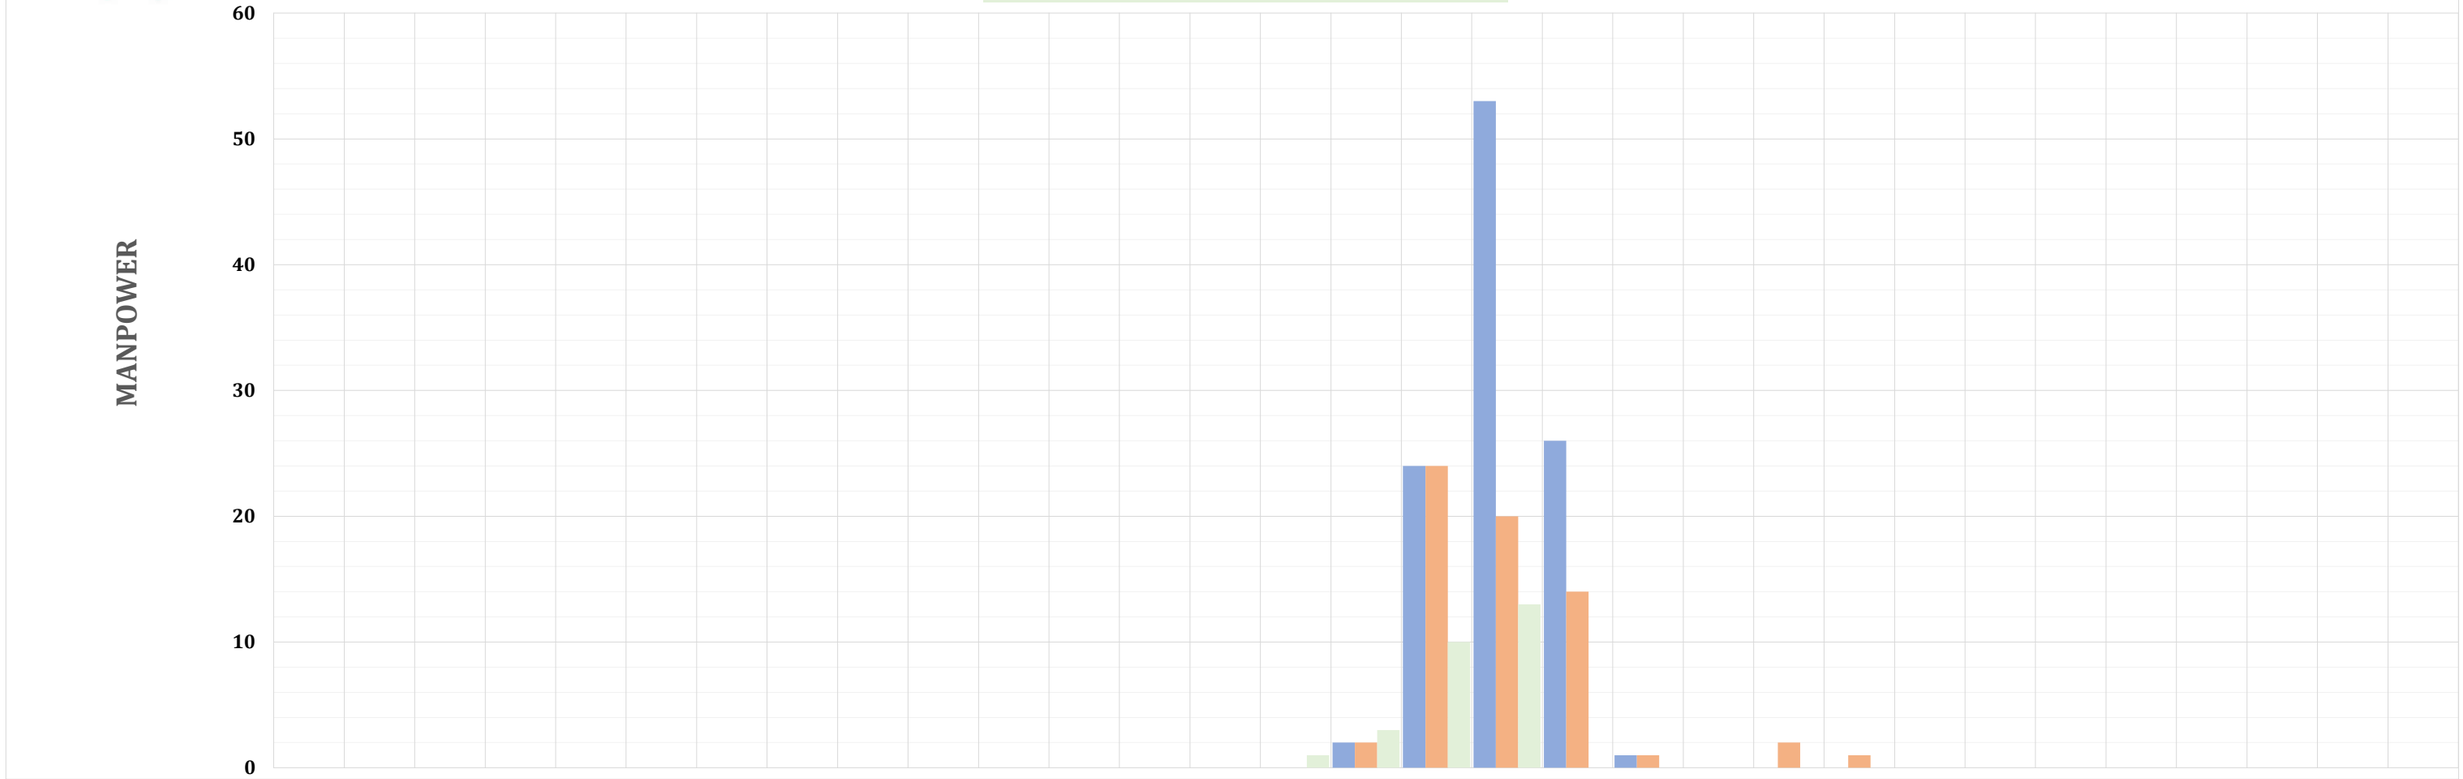

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	53	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	20	14	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	13													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
INSTRUMENTATION & CONTROL CONSTRUCTION


ROSETTI MARINO

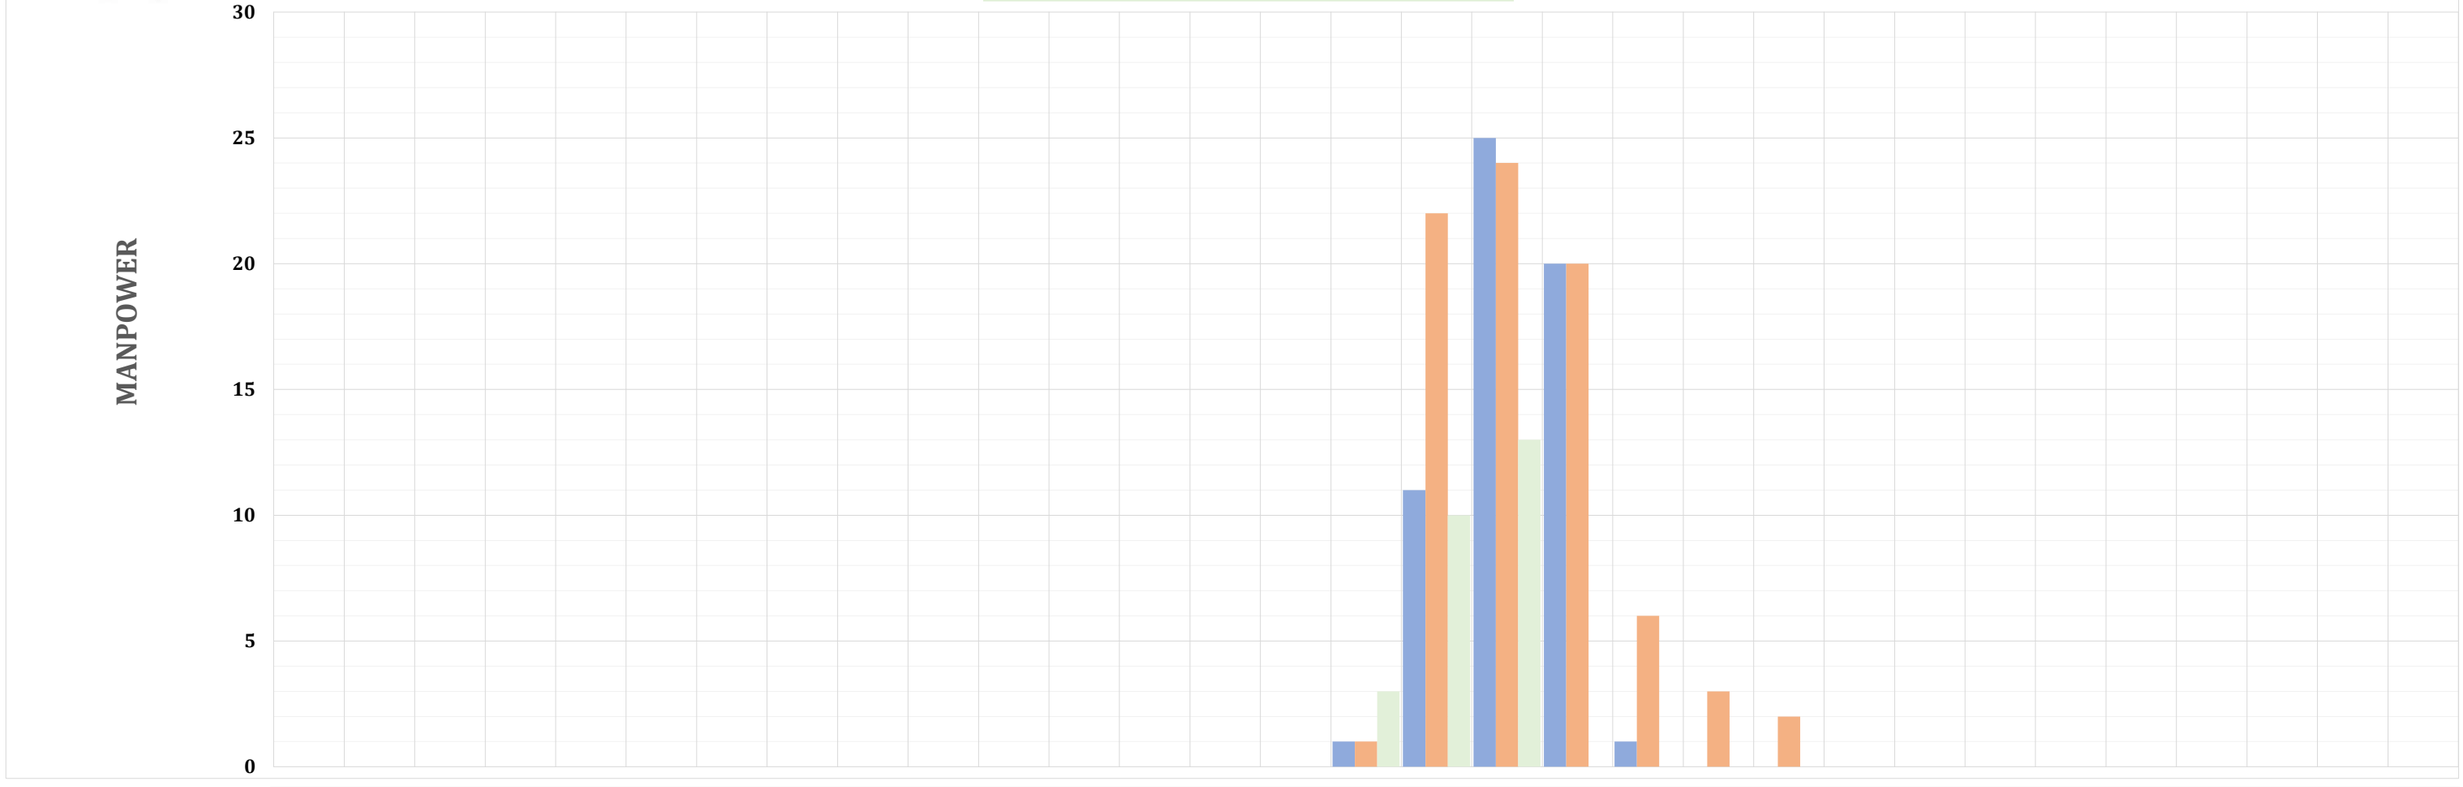

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	25	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	24	20	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	13													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
PIPING CONSTRUCTION


ROSETTI MARINO

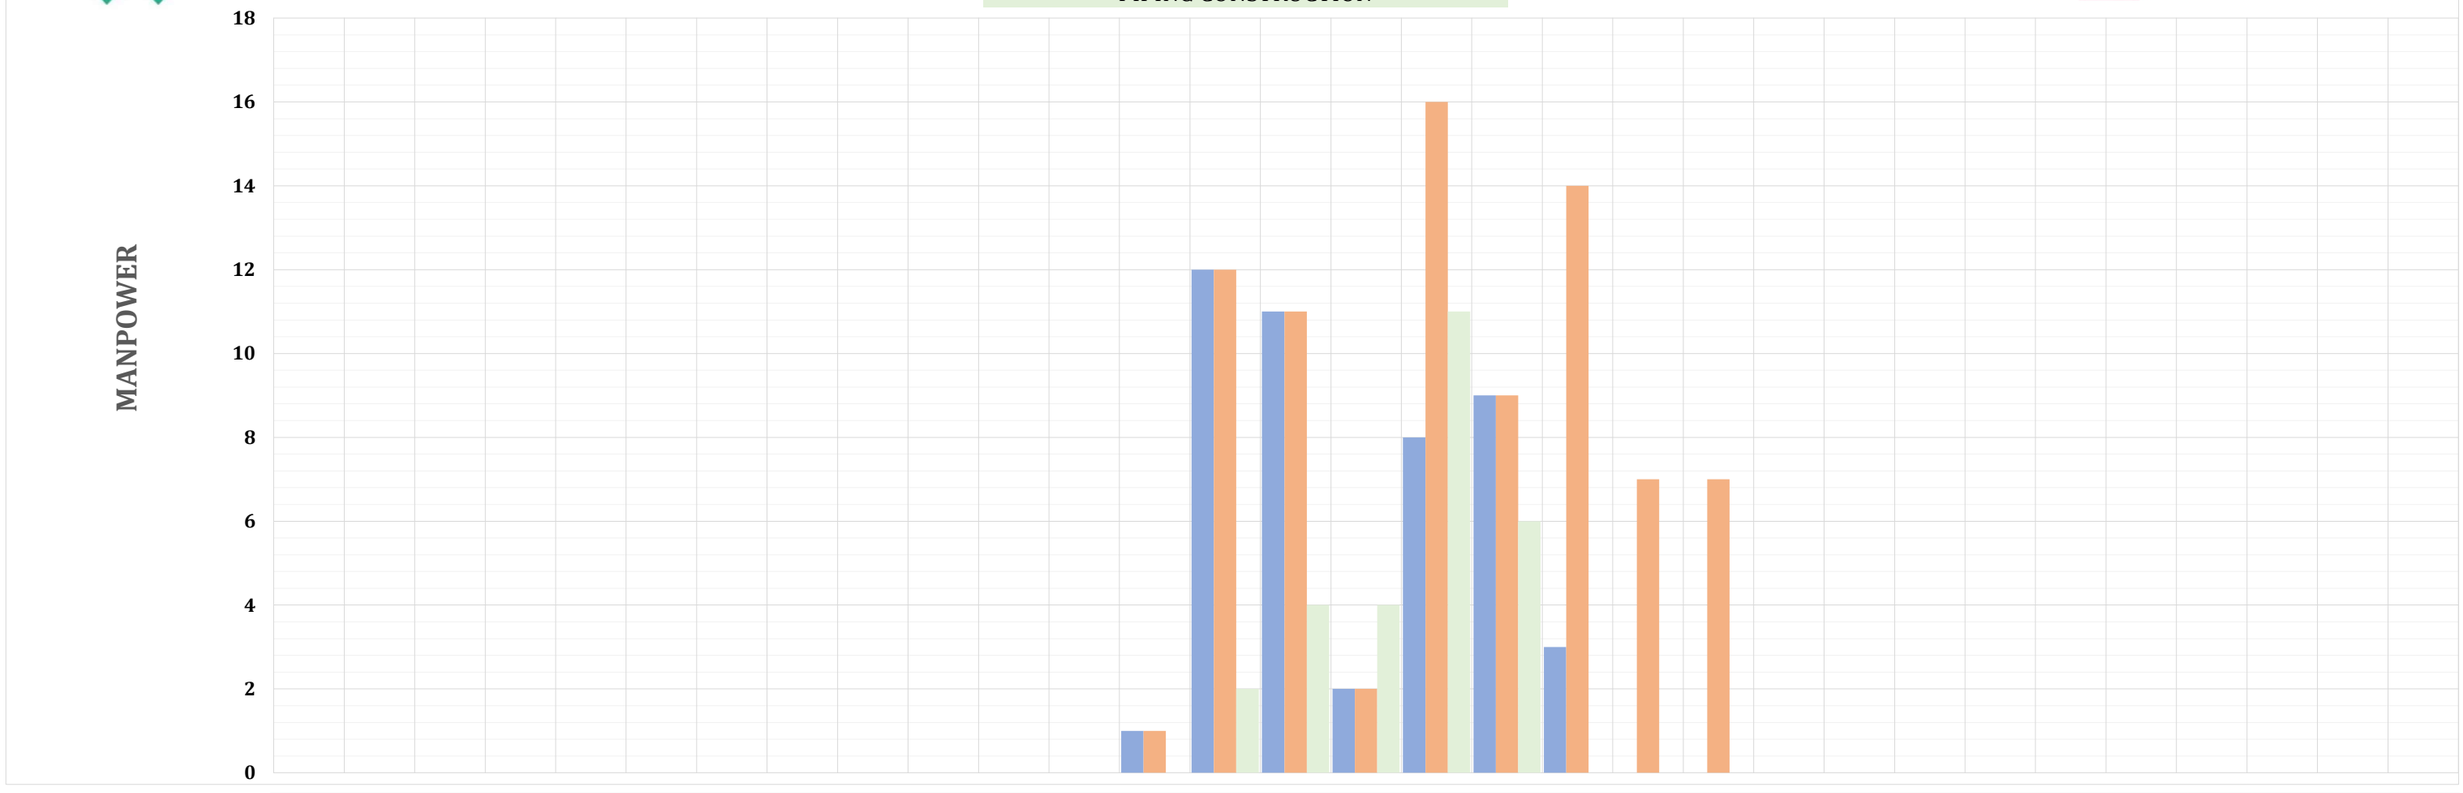

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	11	2	8	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	11	2	16	9	14	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	11	6													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
MECHANICAL ERECTION CONSTRUCTION

ROSETTI MARINO

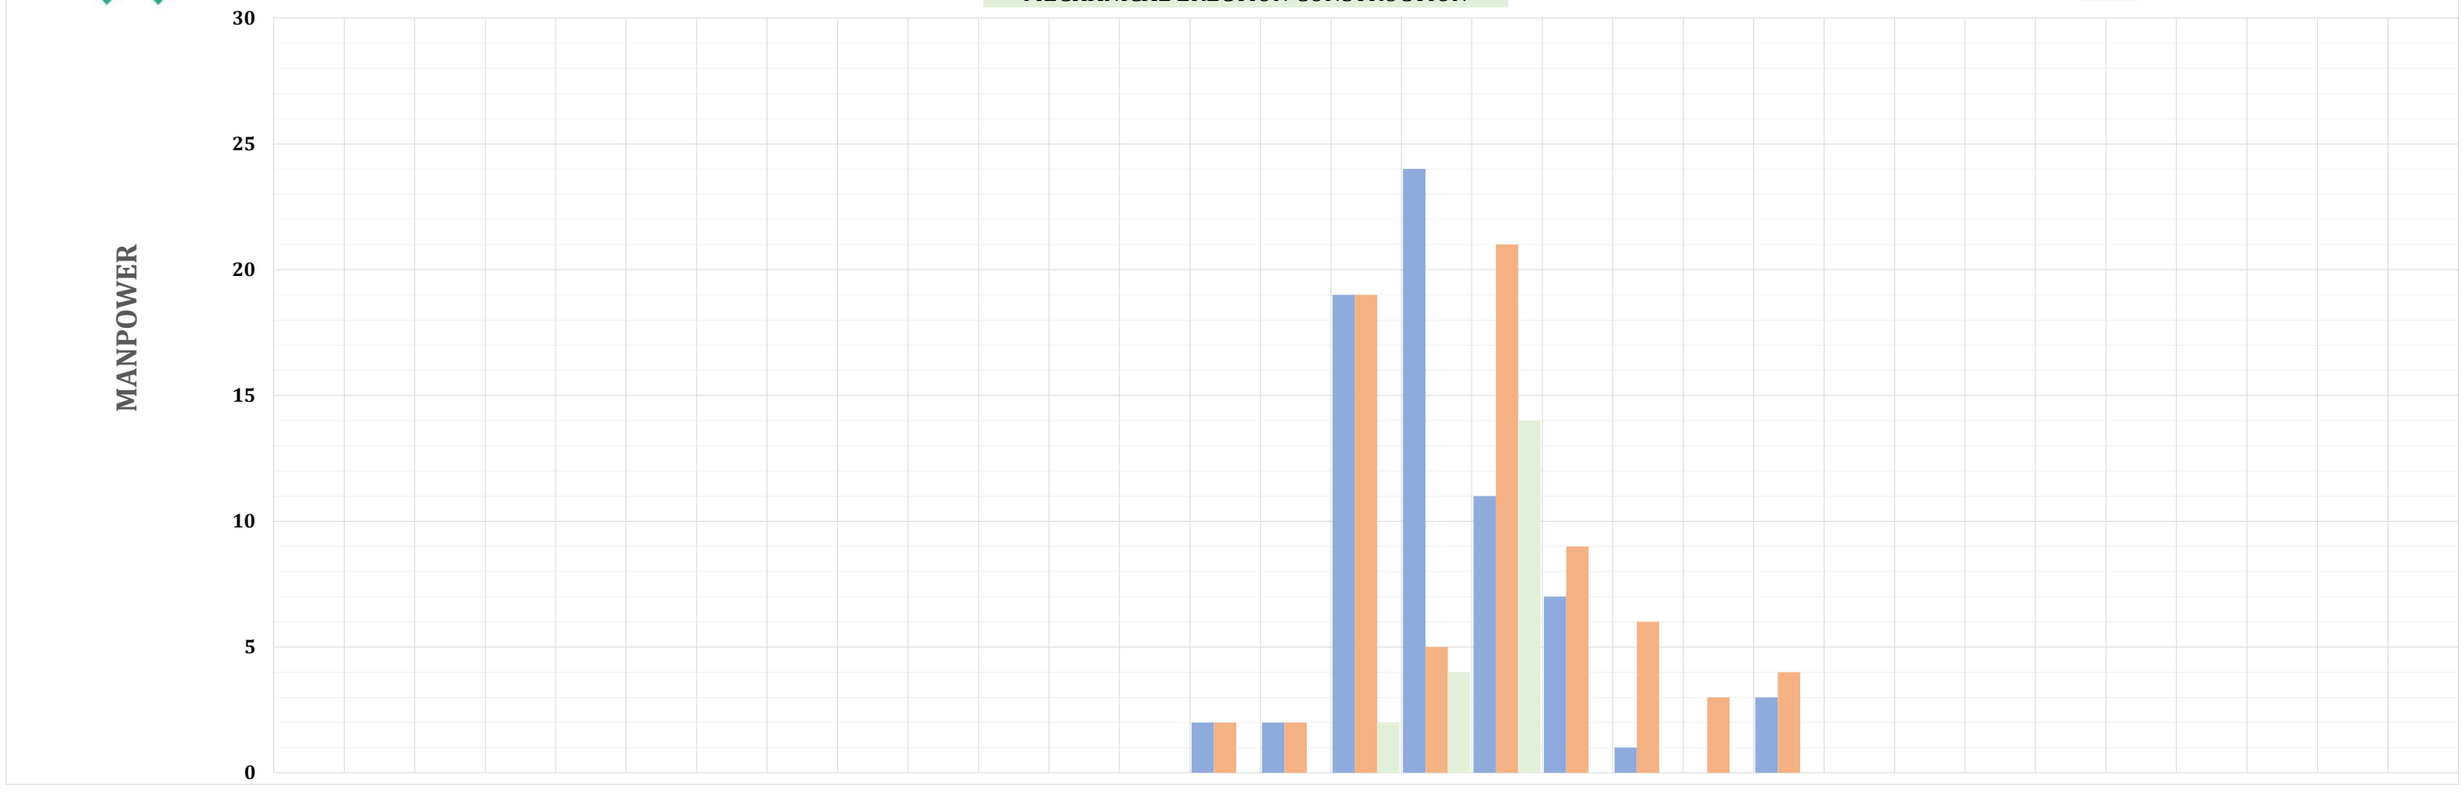

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	24	11	7	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	5	21	9	6	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
FINALIZATION & LOAD-OUT CONSTRUCTION


ROSETTI MARINO



	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
MECH. COMPLETION CONSTRUCTION


ROSETTI MARINO

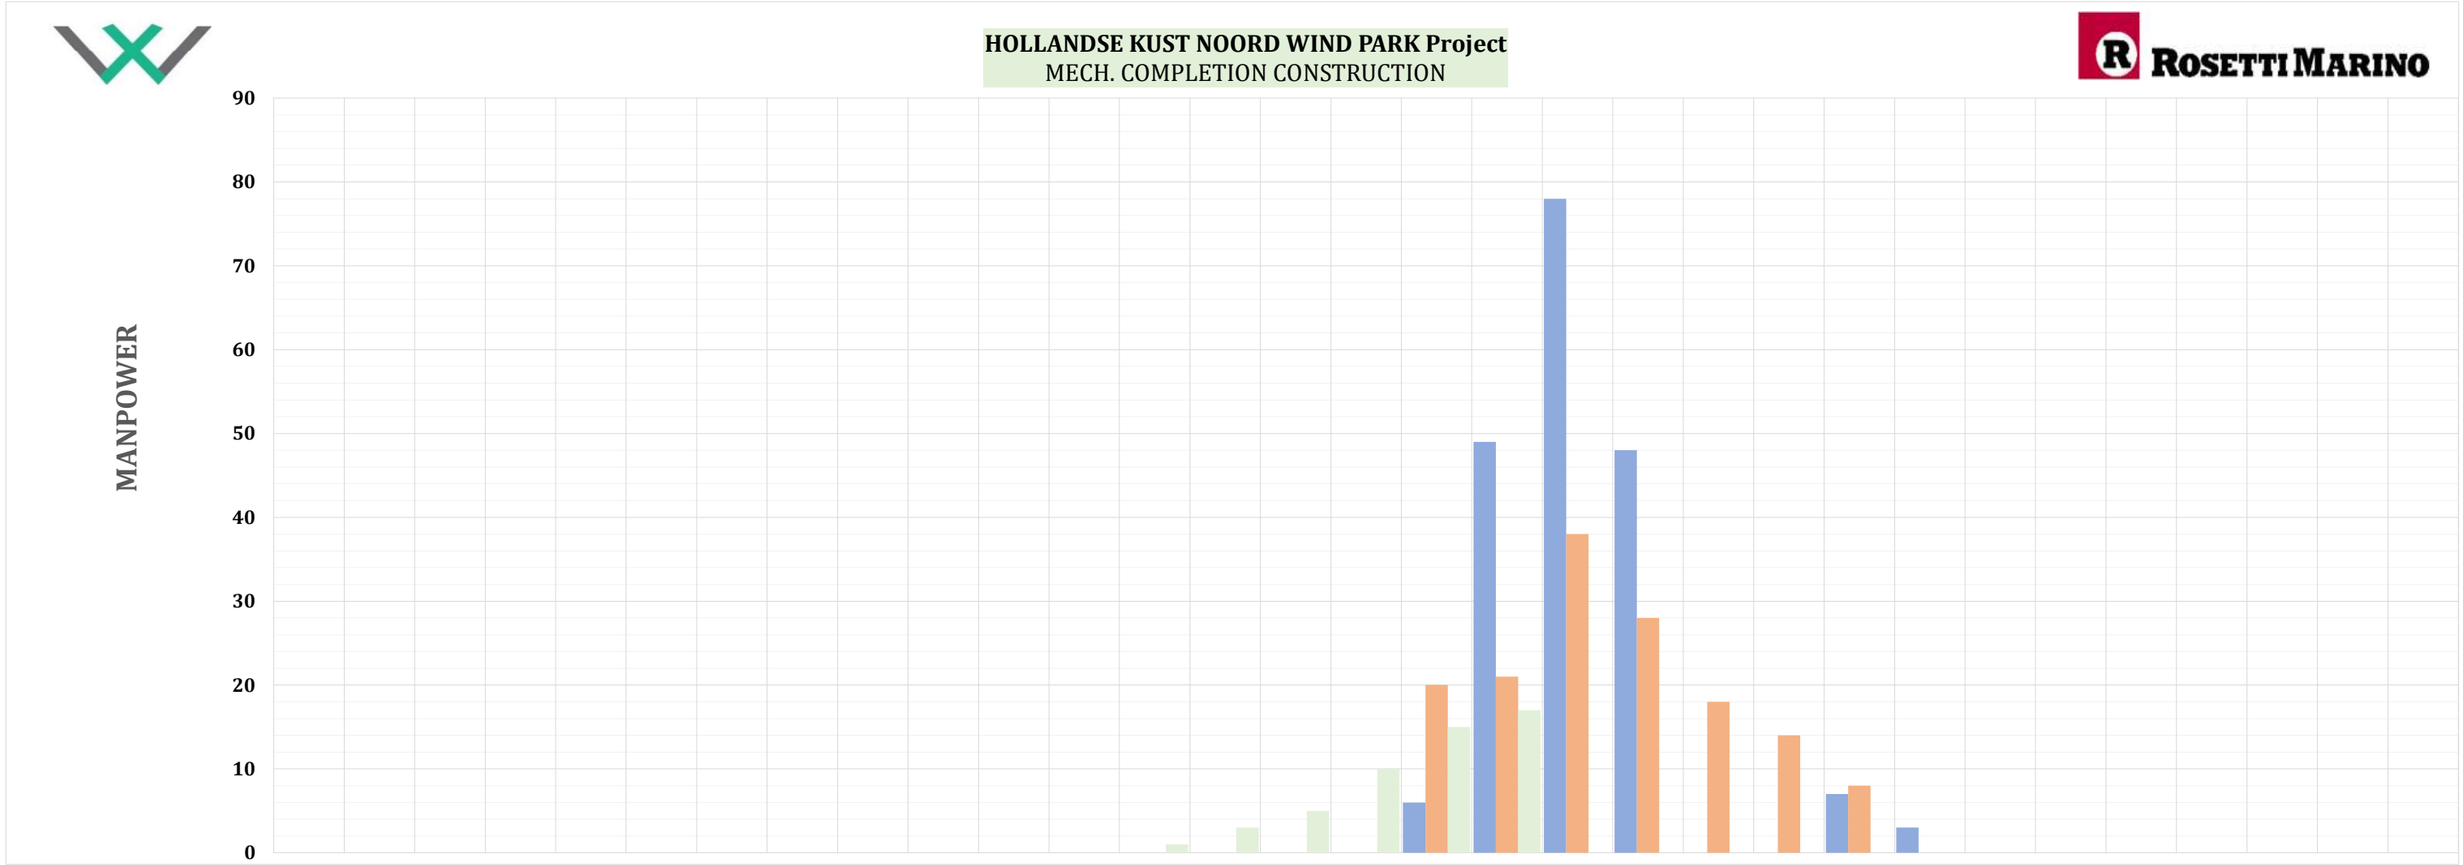

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	49	78	48	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	21	38	28	18	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10	15	17													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
PRE-COMM & COMM CONSTRUCTION

ROSETTI MARINO

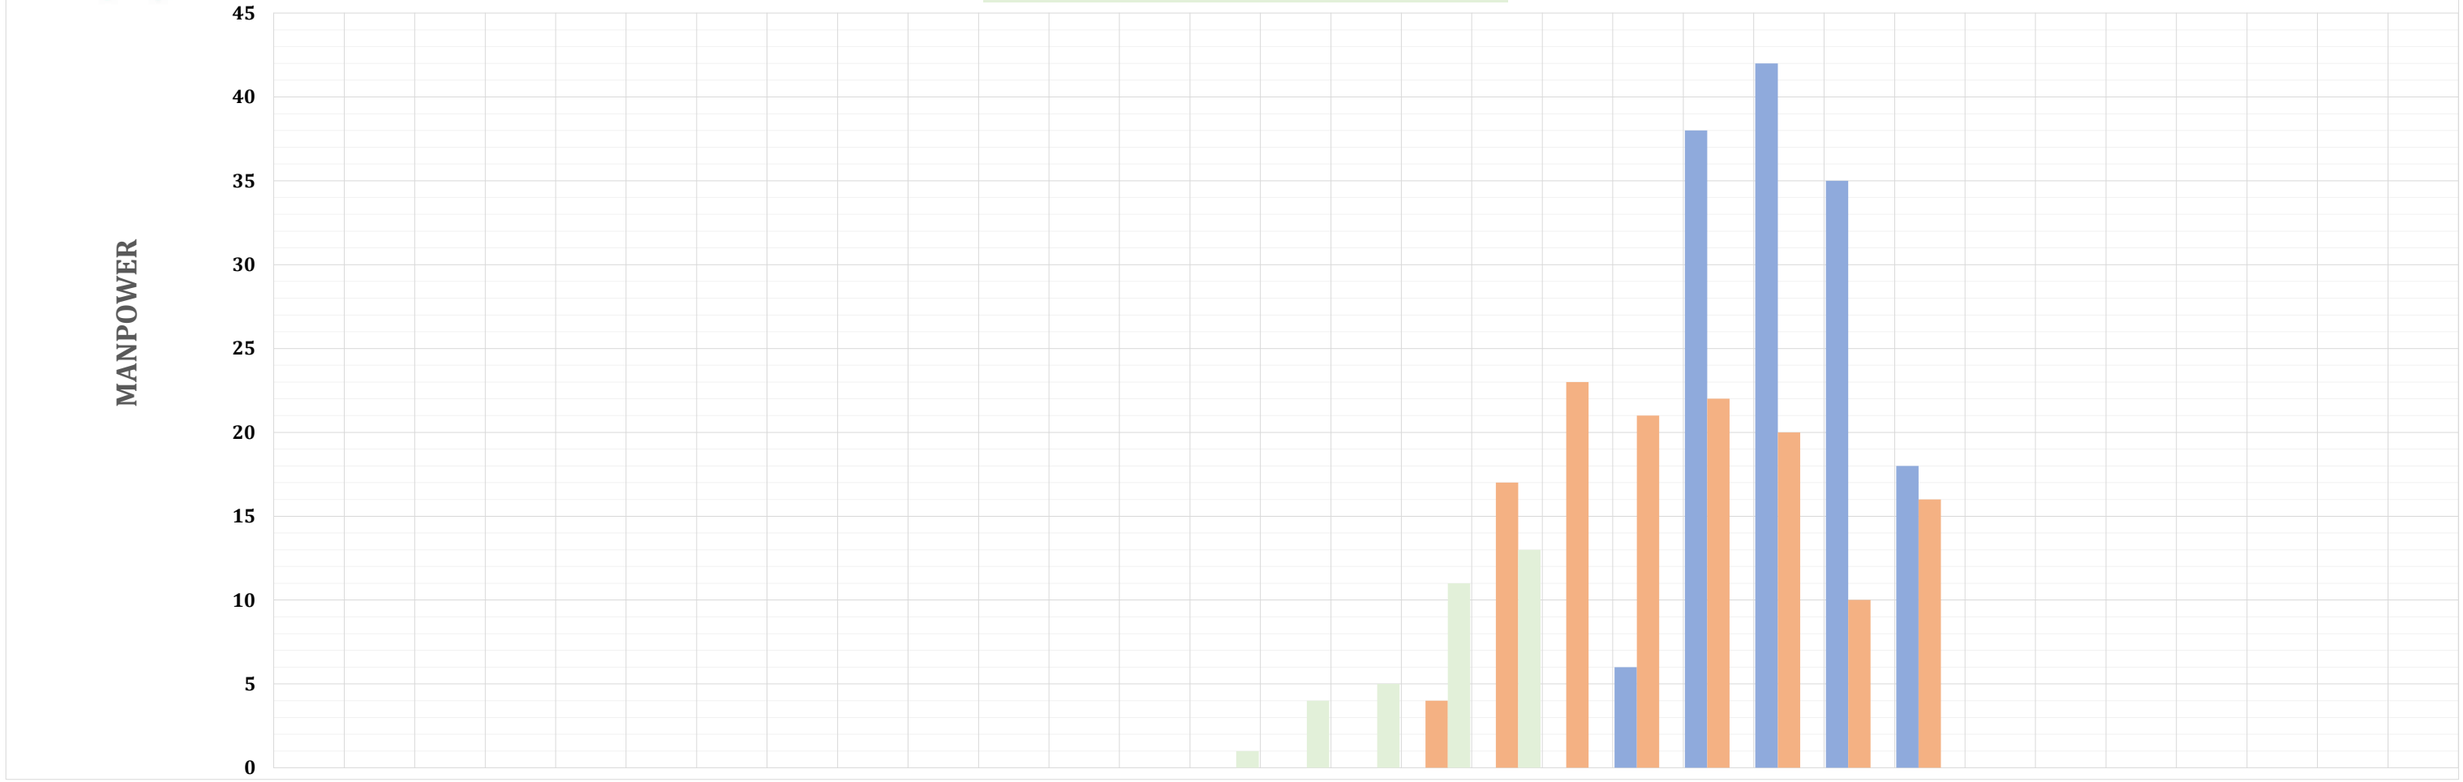

	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
PLANNED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	38	42	35	18	0	0	0	0	0	0	0
REVISED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	23	21	22	20	10	16	0	0	0	0	0	0	0
ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	11	13													
