
HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

ENGINEERING OVERALL

ROSETTI MARINO

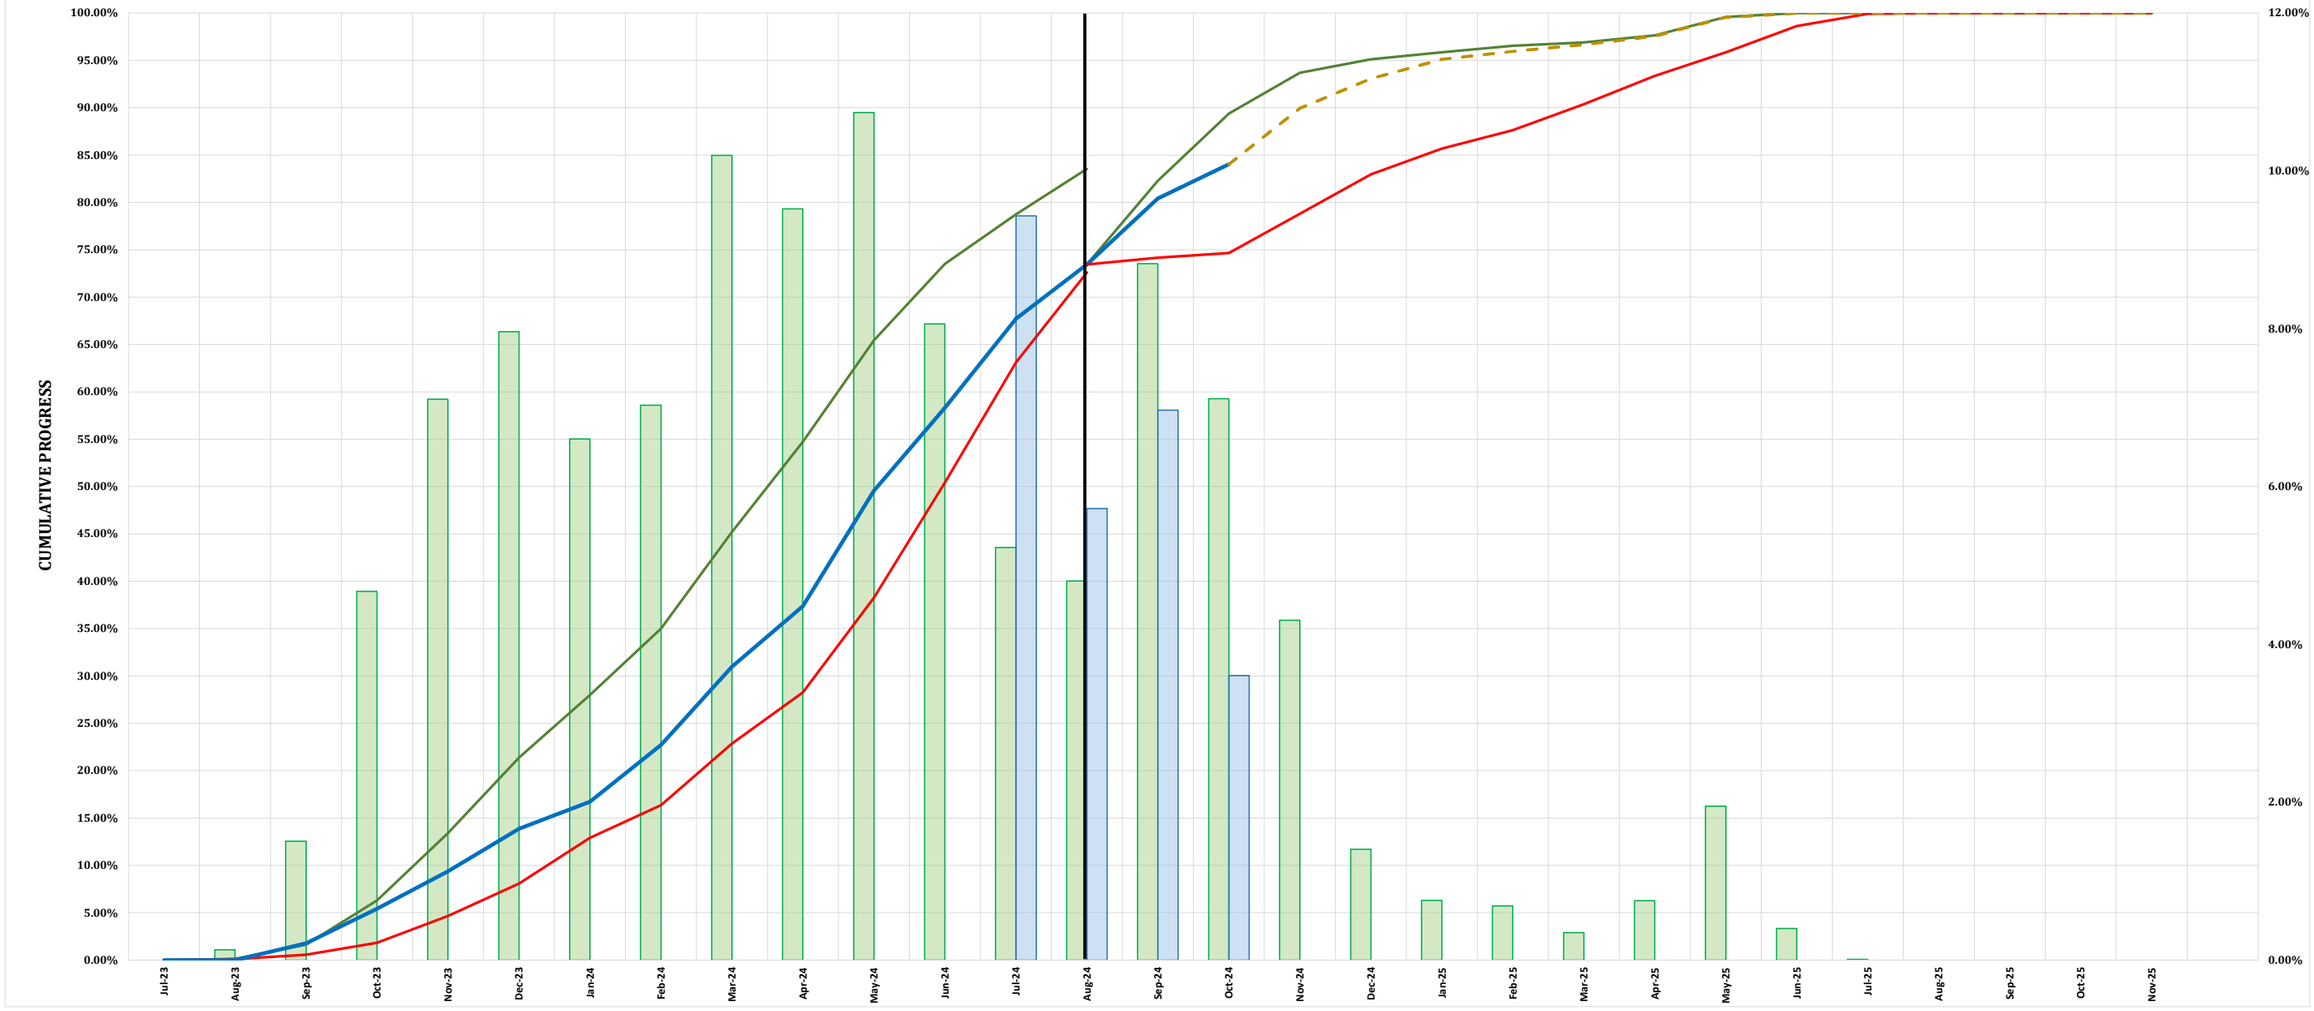


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														73.46%	82.28%	89.39%	93.70%	95.10%	95.86%	96.55%	96.89%	97.64%	99.59%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														73.46%	74.16%	74.66%	78.79%	82.97%	85.69%	87.64%	90.36%	93.36%	95.86%	98.62%	99.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													67.73%	73.45%	80.42%	84.03%													
PERIOD PLANNED		0.13%	1.50%	4.67%	7.11%	7.96%	6.60%	7.03%	10.20%	9.52%	10.74%	8.06%	5.23%	4.80%	8.82%	7.11%	4.31%	1.40%	0.76%	0.69%	0.35%	0.75%	1.95%	0.40%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.43%	5.72%	6.97%	3.60%													
FORECAST																84.03%	89.93%	93.06%	95.11%	95.95%	96.66%	97.55%	99.54%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

PROCESS ENGINEERING

ROSETTI MARINO

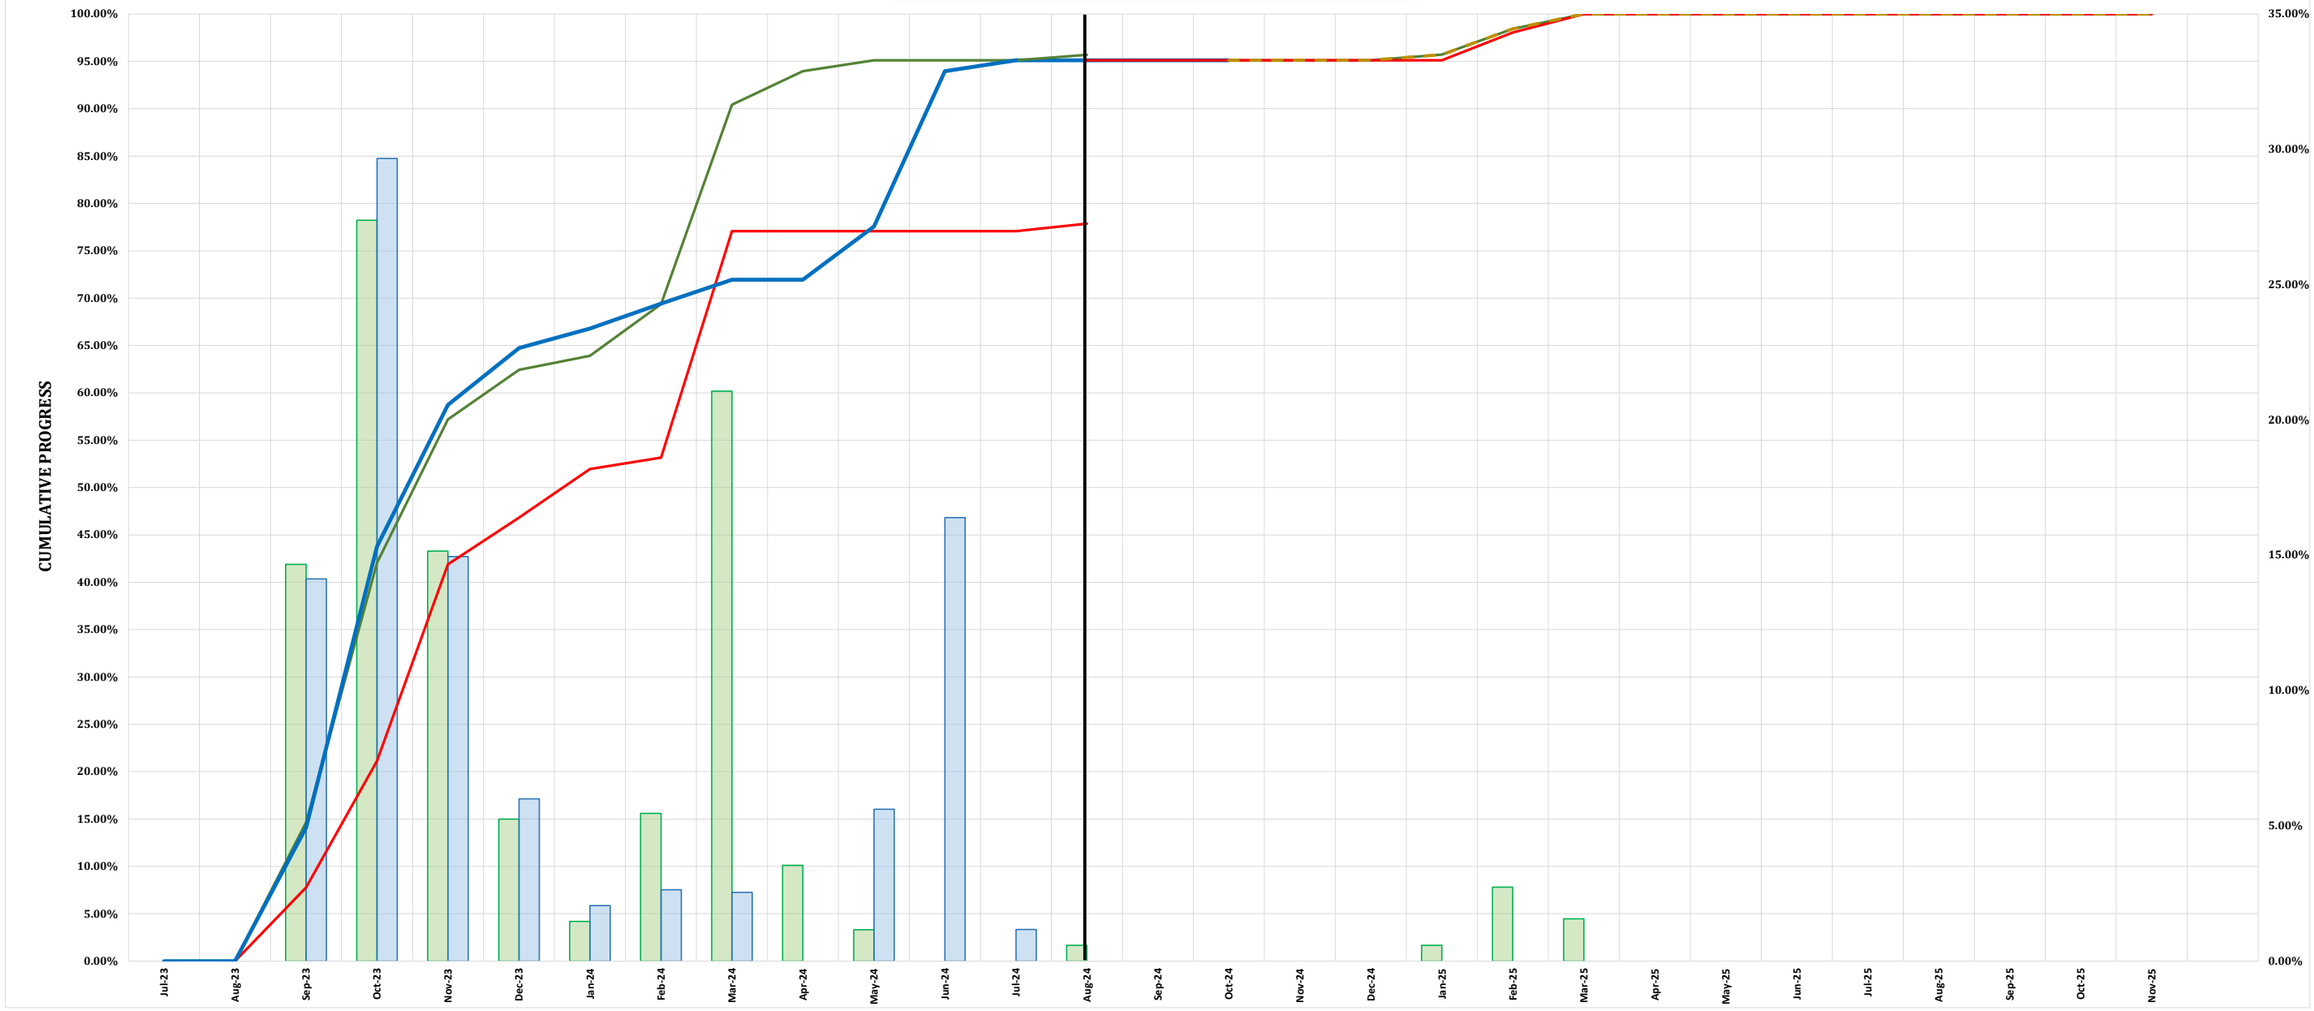


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														95.12%	95.12%	95.12%	95.12%	95.12%	95.71%	98.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														95.12%	95.12%	95.12%	95.12%	95.12%	95.12%	98.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													95.12%	95.12%	95.12%	95.12%													
PERIOD PLANNED		0.00%	14.66%	27.38%	15.15%	5.24%	1.46%	5.46%	21.07%	3.54%	1.16%	0.00%	0.00%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	2.73%	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	14.12%	29.66%	14.95%	6.00%	2.05%	2.63%	2.54%	0.00%	5.61%	16.39%	1.17%	0.00%	0.00%	0.00%													
FORECAST																95.12%	95.12%	95.12%	95.71%	98.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

STRUCTURAL ENGINEERING

ROSETTI MARINO

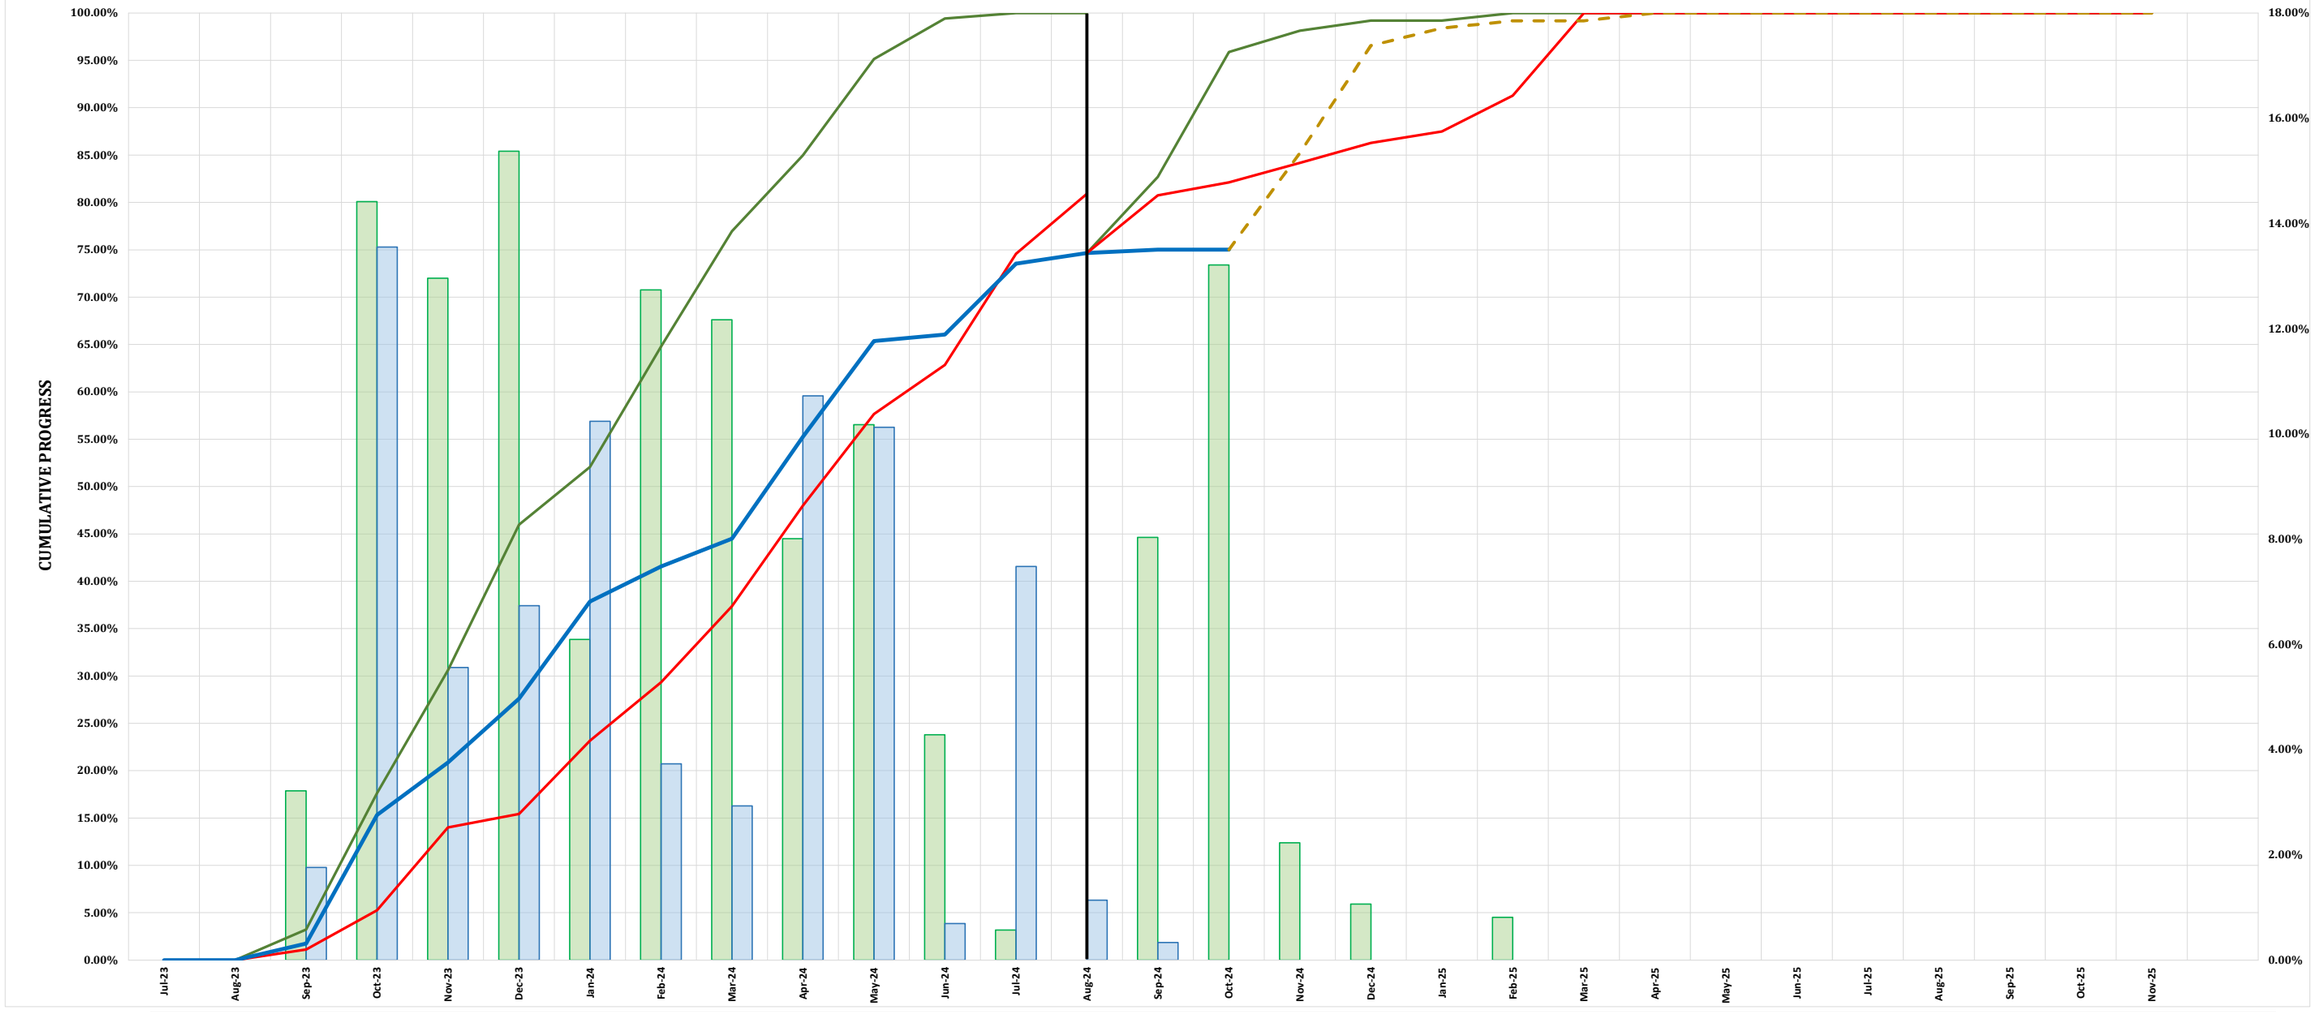


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														74.65%	82.69%	95.89%	98.12%	99.19%	99.19%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														74.65%	80.75%	82.12%	84.17%	86.29%	87.50%	91.28%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													73.53%	74.67%	75.00%	75.00%													
PERIOD PLANNED		0.00%	3.22%	14.41%	12.96%	15.37%	6.09%	12.74%	12.17%	8.01%	10.18%	4.28%	0.57%	0.00%	8.04%	13.21%	2.23%	1.06%	0.00%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	1.76%	13.55%	5.56%	6.74%	10.24%	3.73%	2.93%	10.73%	10.12%	0.69%	7.48%	1.14%	0.34%	0.00%													
FORECAST																75.00%	85.21%	96.56%	98.40%	99.18%	99.18%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

PIPING ENGINEERING

ROSETTI MARINO

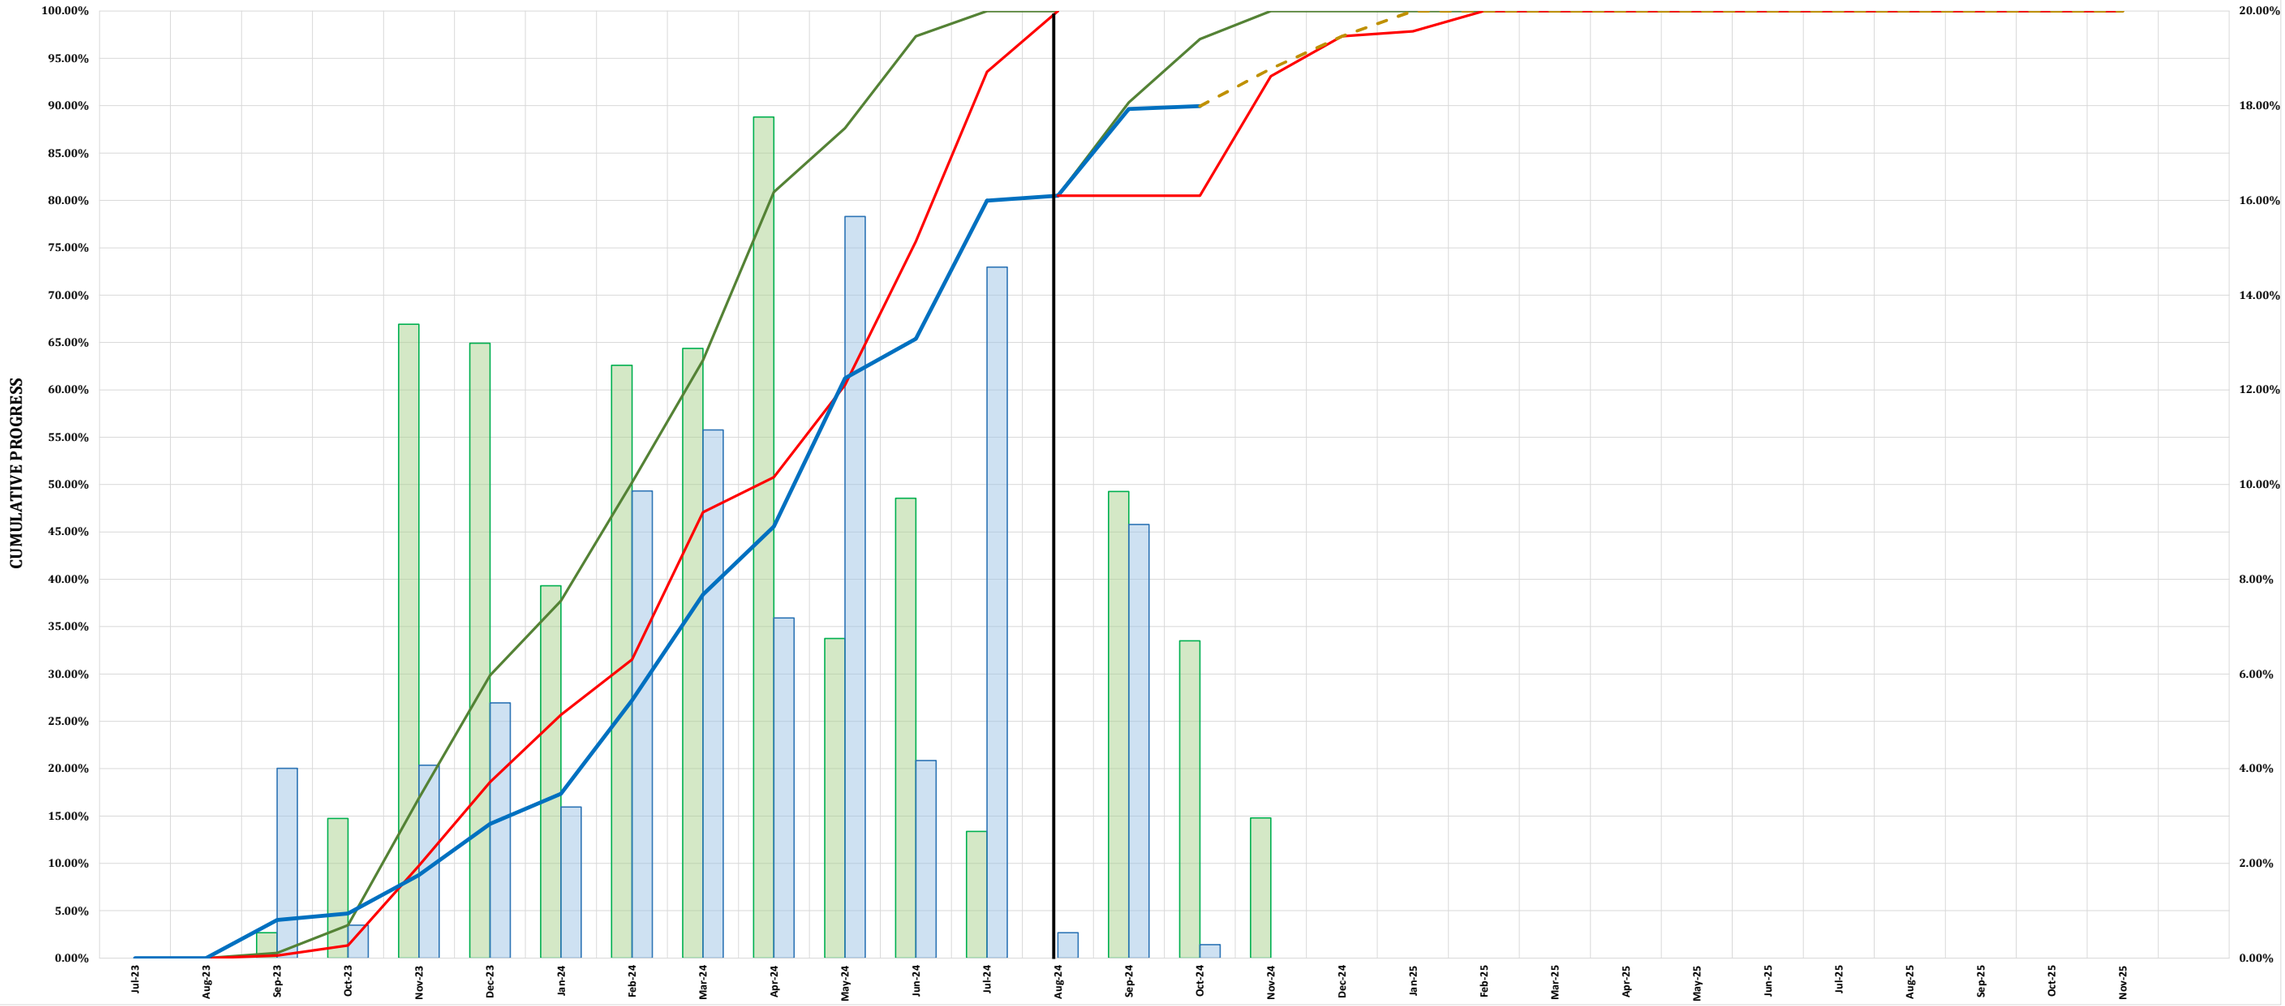


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														80.49%	90.34%	97.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														80.49%	80.49%	80.49%	93.12%	97.33%	97.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													79.97%	80.51%	89.67%	89.95%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.53%	2.95%	13.39%	12.98%	7.86%	12.52%	12.87%	17.76%	6.75%	9.71%	2.67%	0.00%	9.85%	6.70%	2.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	4.01%	0.69%	4.07%	5.39%	3.19%	9.86%	11.15%	7.18%	15.66%	4.17%	14.59%	0.53%	9.16%	0.29%													
FORECAST																89.95%	93.90%	97.32%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

MECHANICAL ENGINEERING

ROSETTI MARINO

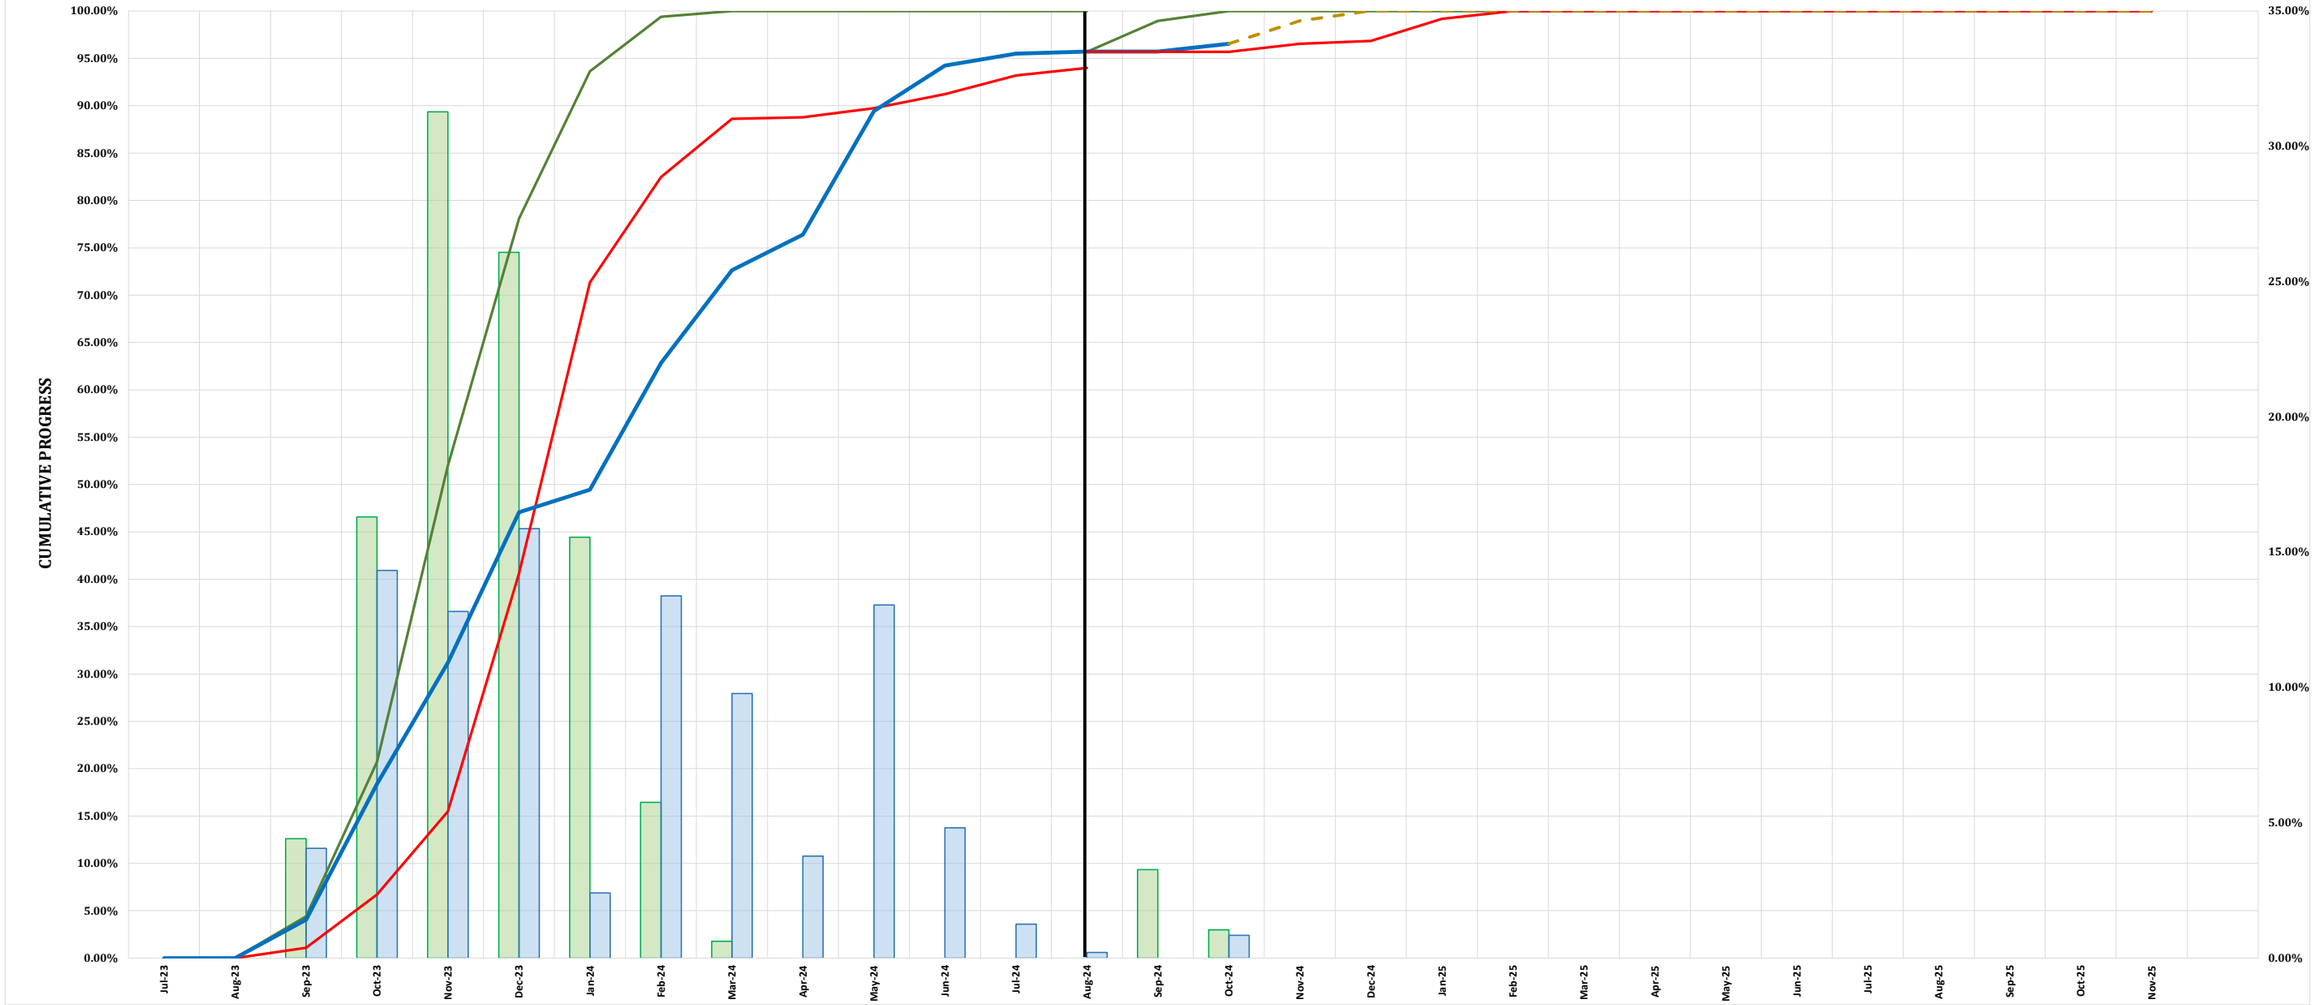


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														95.69%	98.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														95.69%	95.69%	95.69%	96.54%	96.85%	99.16%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													95.50%	95.71%	95.71%	96.55%													
PERIOD PLANNED		0.00%	4.41%	16.31%	31.27%	26.08%	15.56%	5.75%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.27%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	4.05%	14.33%	12.81%	15.87%	2.41%	13.39%	9.78%	3.76%	13.05%	4.81%	1.25%	0.21%	0.00%	0.84%													
FORECAST																96.55%	98.97%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

ELECTRICAL ENGINEERING

ROSETTI MARINO

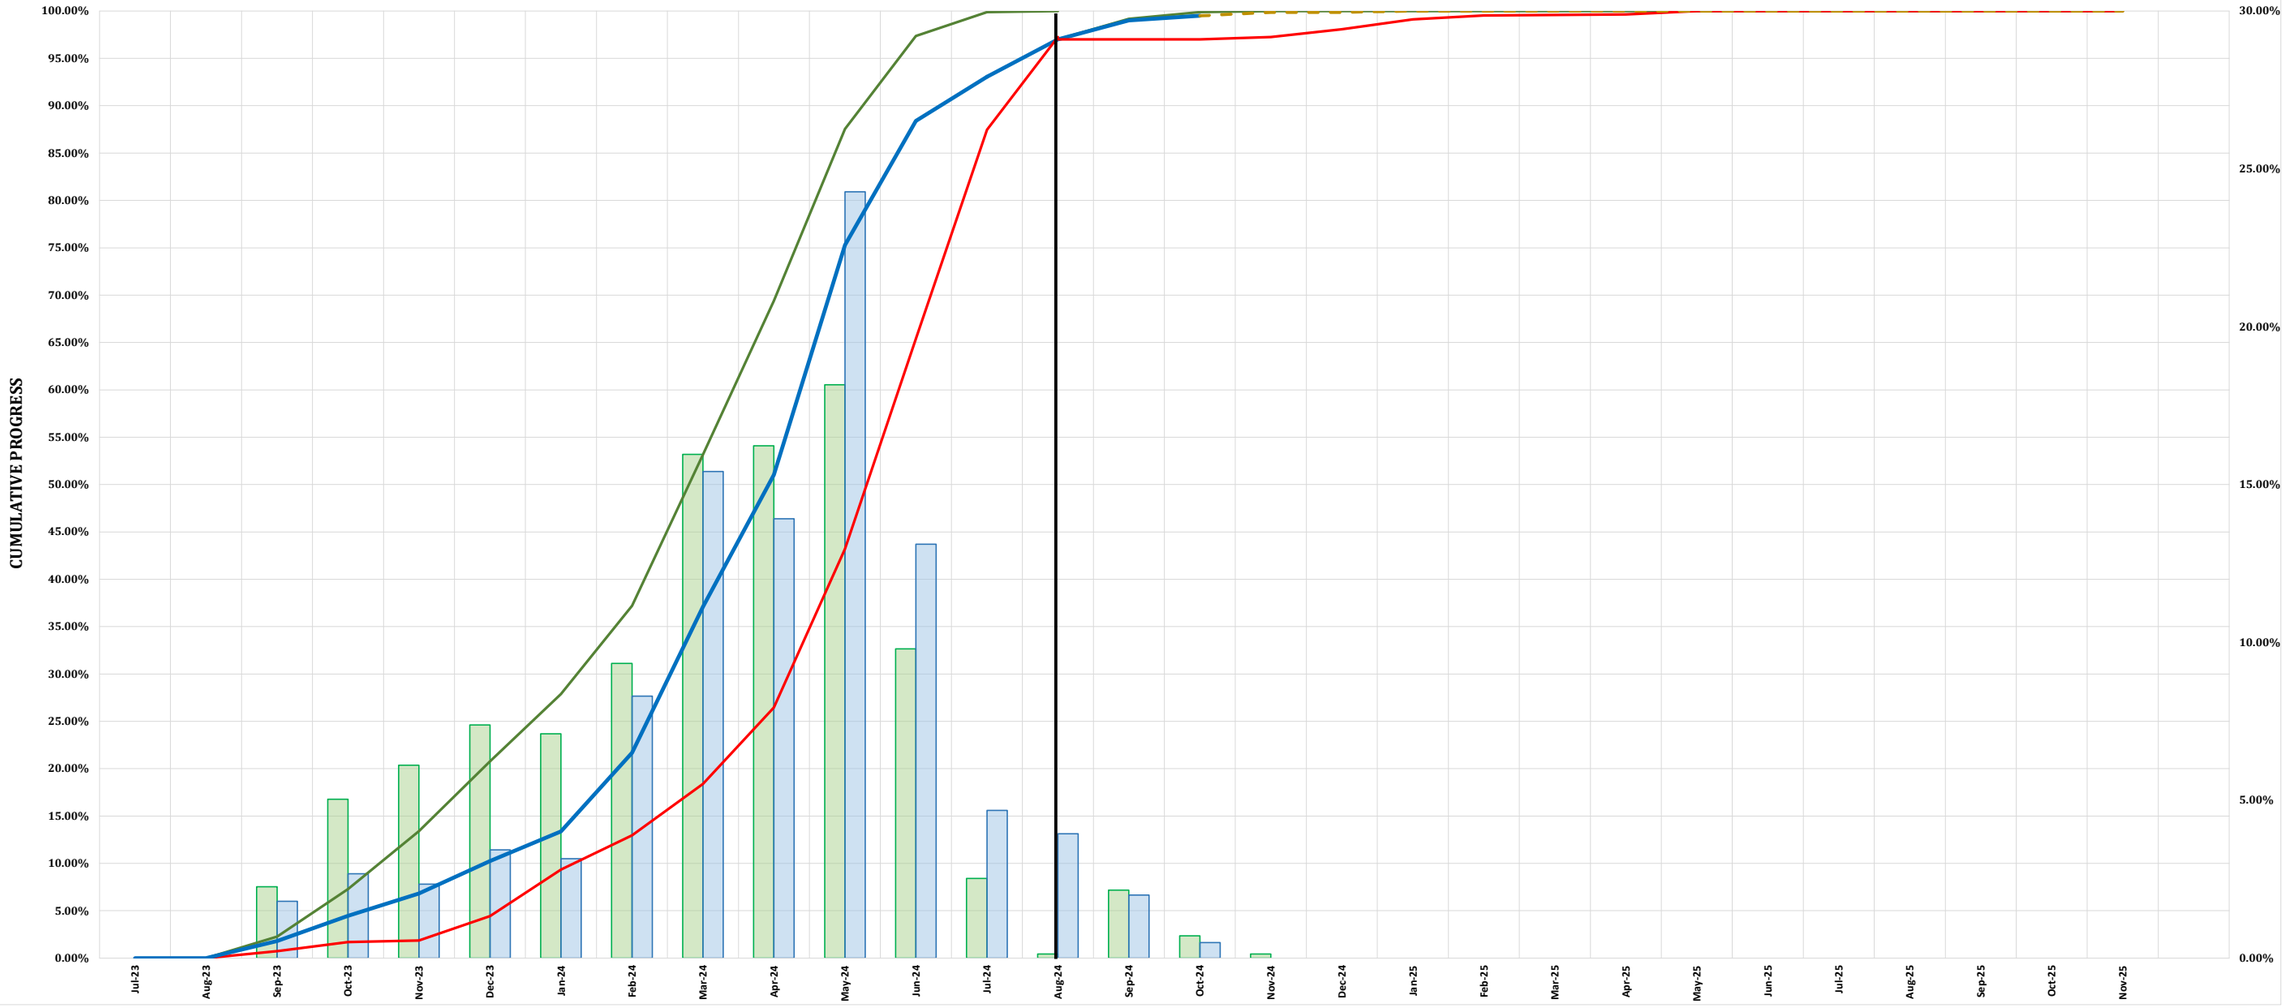


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														97.01%	99.17%	99.87%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														97.01%	97.01%	97.01%	97.26%	98.07%	99.11%	99.52%	99.58%	99.64%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													93.07%	97.00%	99.00%	99.49%													
PERIOD PLANNED		0.00%	2.26%	5.03%	6.11%	7.38%	7.10%	9.33%	15.95%	16.23%	18.16%	9.79%	2.52%	0.13%	2.16%	0.71%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	1.80%	2.67%	2.34%	3.43%	3.15%	8.29%	15.41%	13.92%	24.27%	13.11%	4.68%	3.94%	1.99%	0.49%													
FORECAST																99.49%	99.87%	99.87%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

INSTRUMENTATION ENGINEERING

ROSETTI MARINO

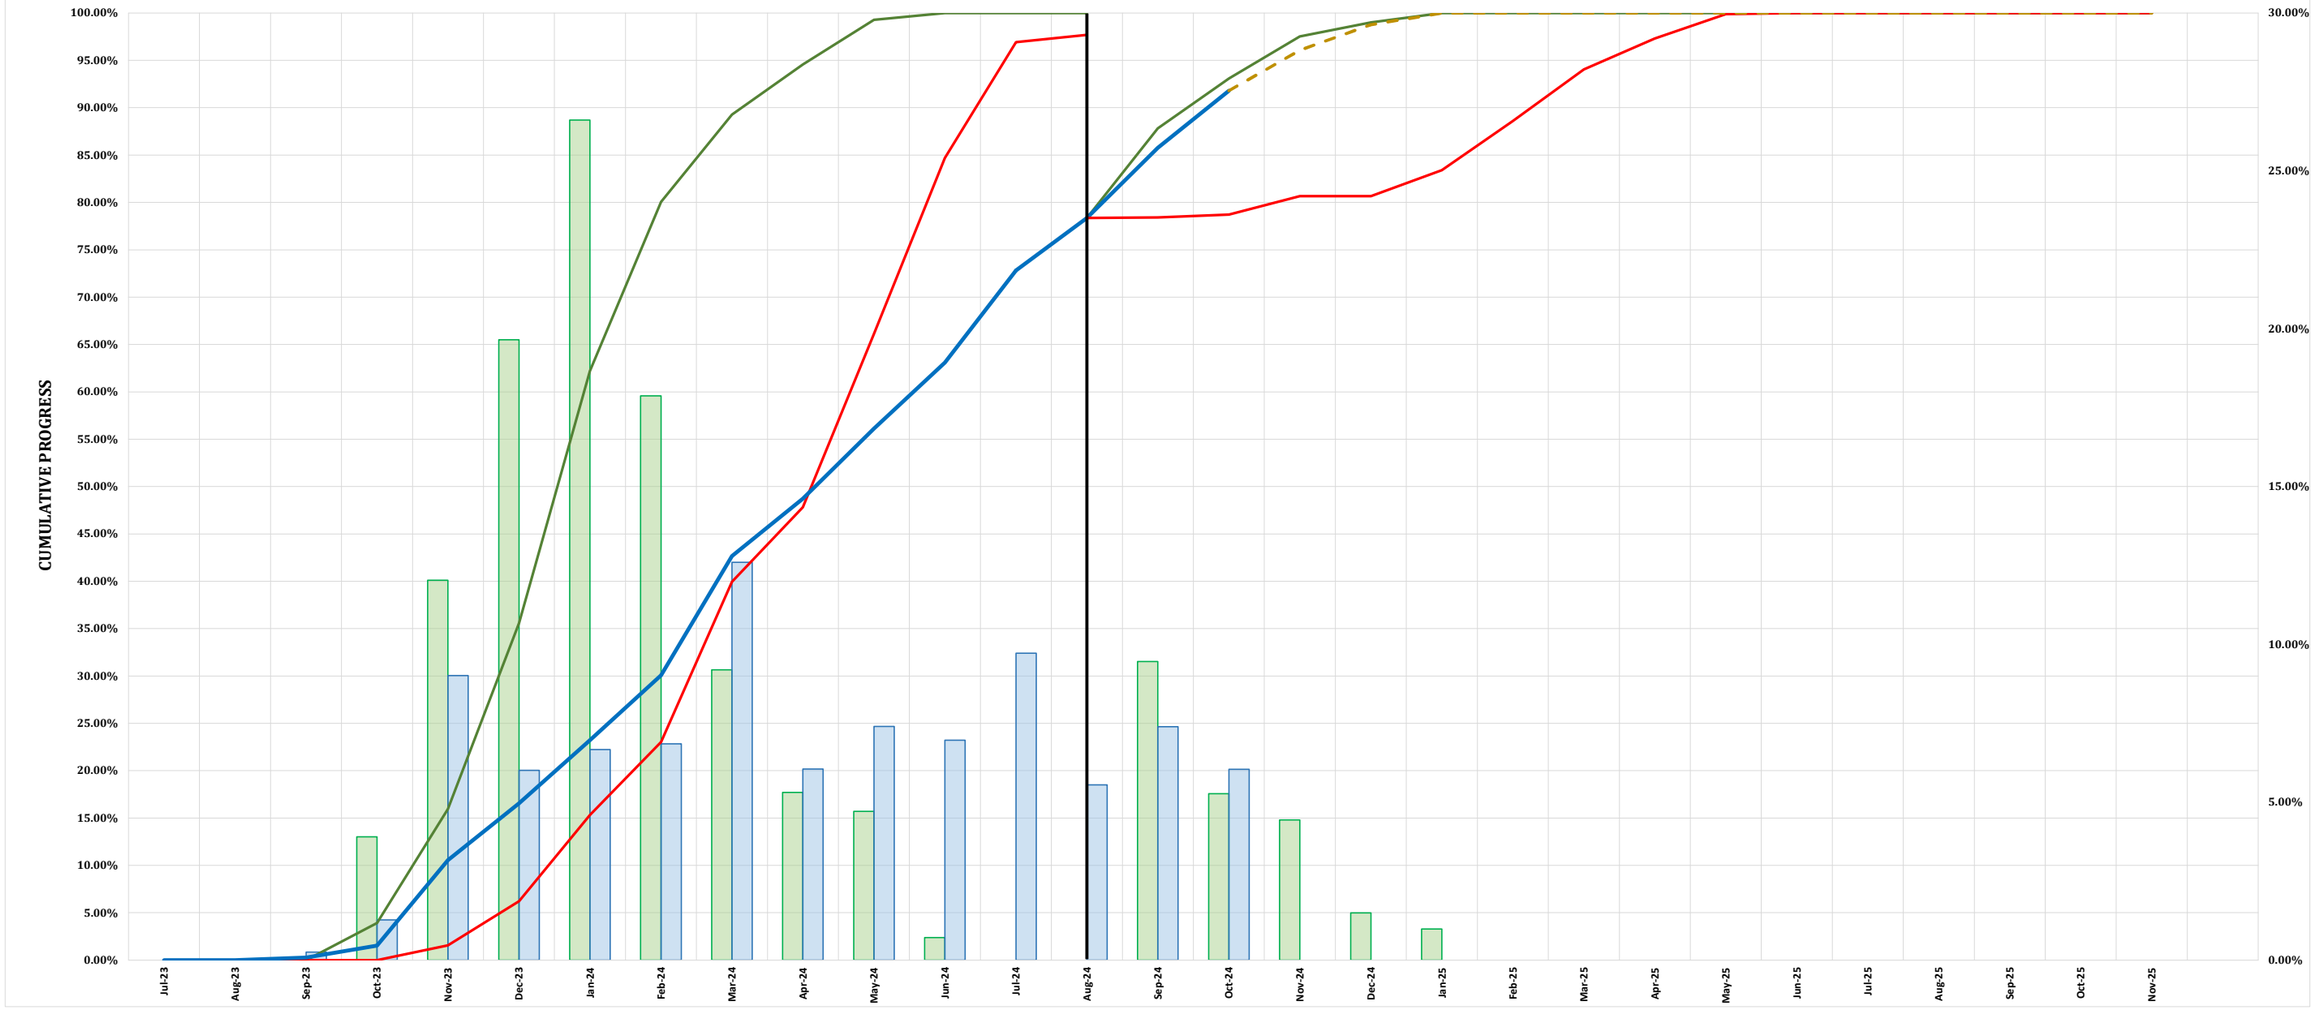


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														78.35%	87.81%	93.08%	97.52%	99.01%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														78.35%	78.42%	78.71%	80.65%	80.65%	83.41%	88.58%	94.05%	97.31%	99.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													72.81%	78.36%	85.75%	91.79%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	3.90%	12.03%	19.65%	26.61%	17.87%	9.20%	5.31%	4.71%	0.72%	0.00%	0.00%	9.46%	5.27%	4.44%	1.50%	0.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.26%	1.28%	9.02%	6.01%	6.67%	6.85%	12.60%	6.06%	7.40%	6.96%	9.72%	5.55%	7.39%	6.04%													
FORECAST																91.79%	96.07%	98.76%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

TELECOMM ENGINEERING


ROSETTI MARINO

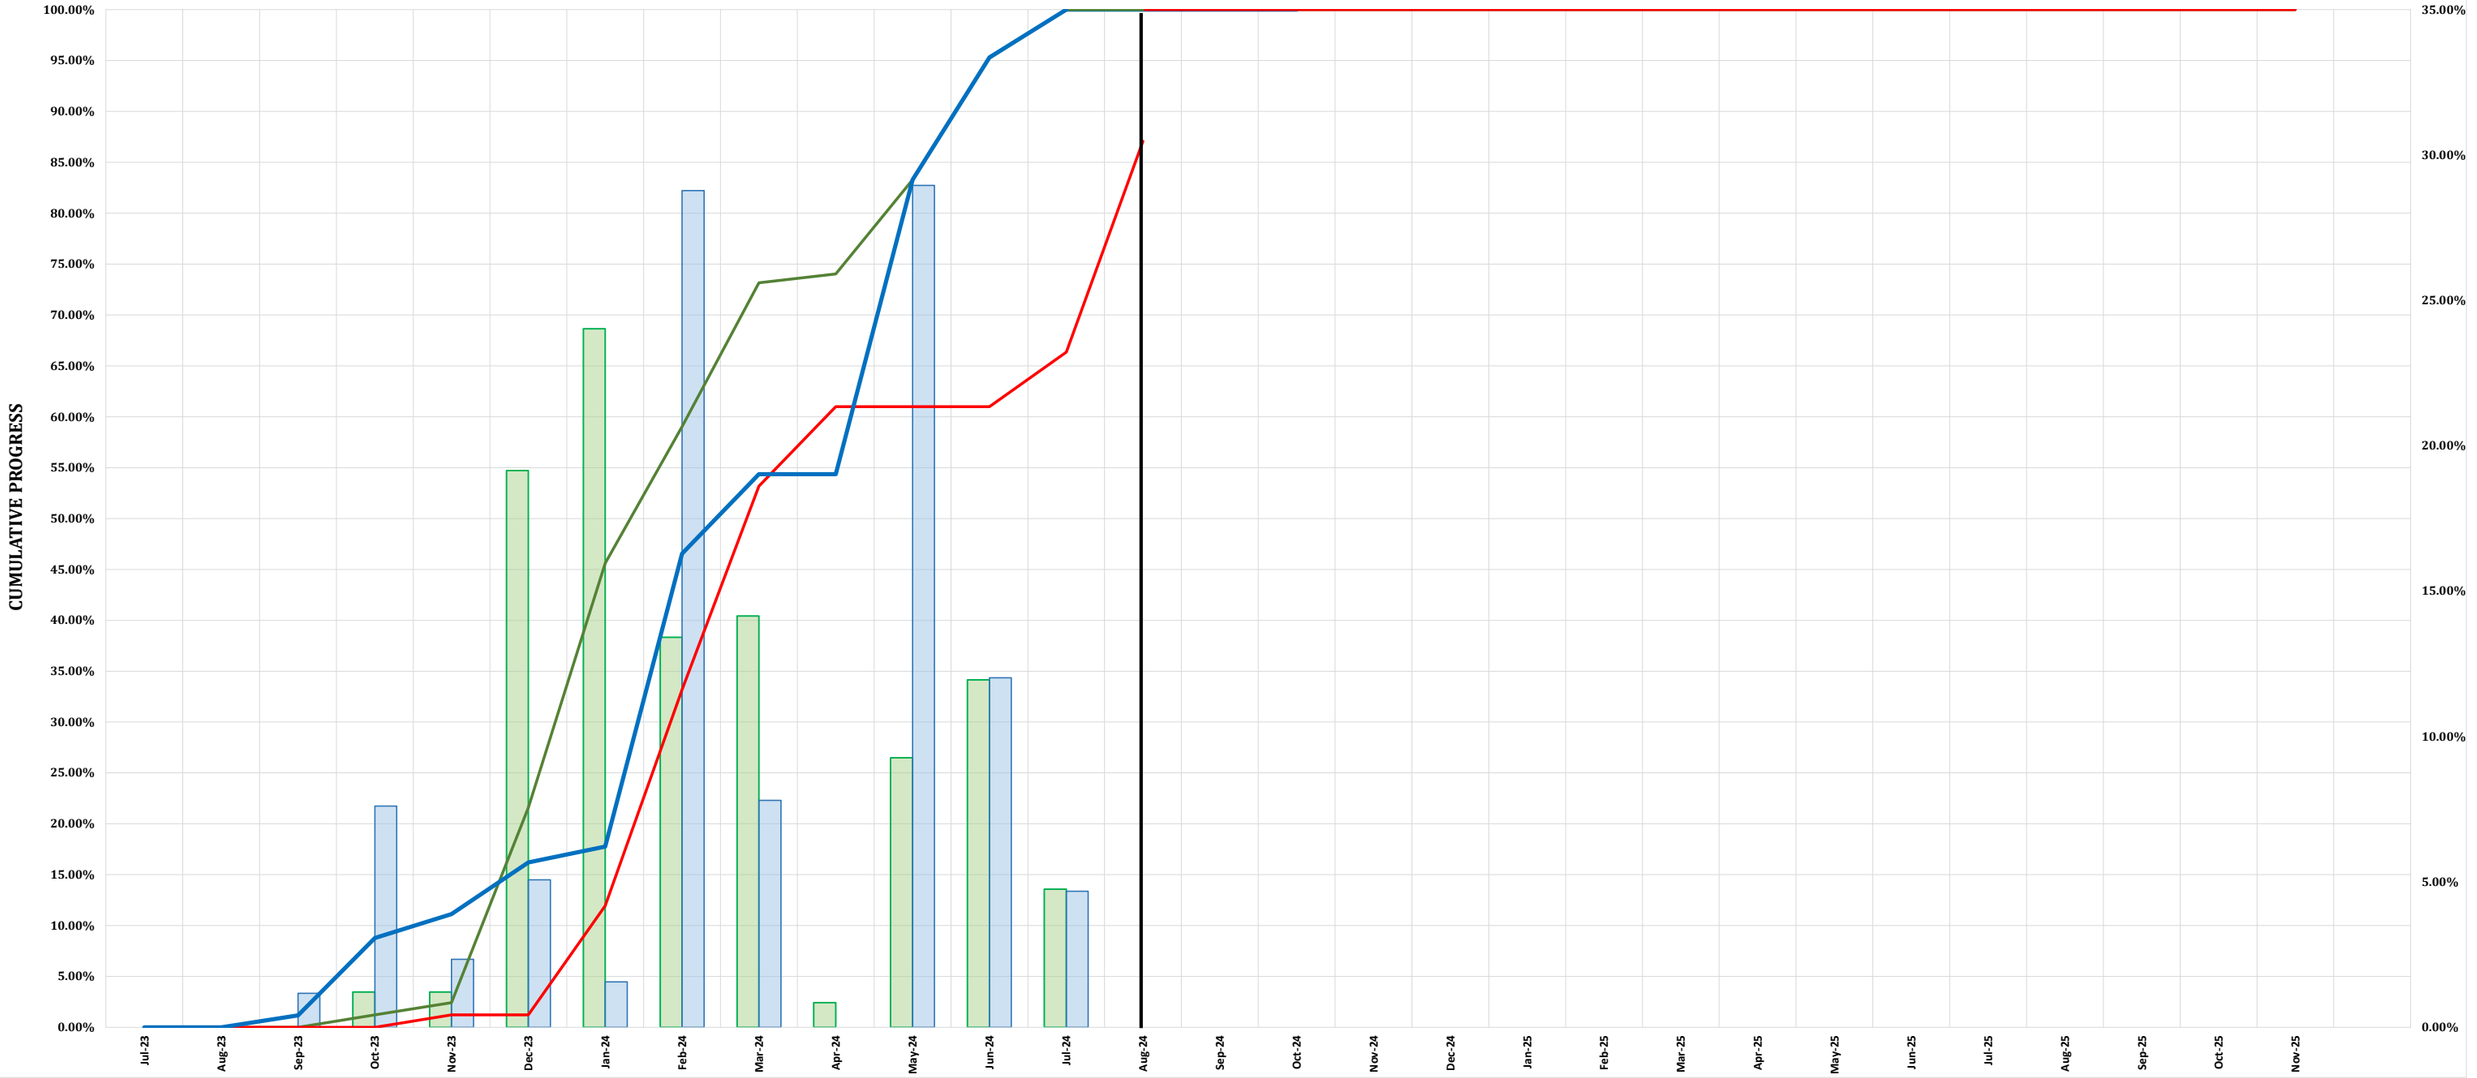

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													100.00%	100.00%	100.00%	100.00%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	1.22%	1.22%	19.15%	24.02%	13.41%	14.15%	0.85%	9.27%	11.95%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	1.17%	7.61%	2.34%	5.07%	1.56%	28.78%	7.80%	0.00%	28.95%	12.02%	4.68%	0.00%	0.00%	0.00%													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
ARCHITECTURAL ENGINEERING

ROSETTI MARINO

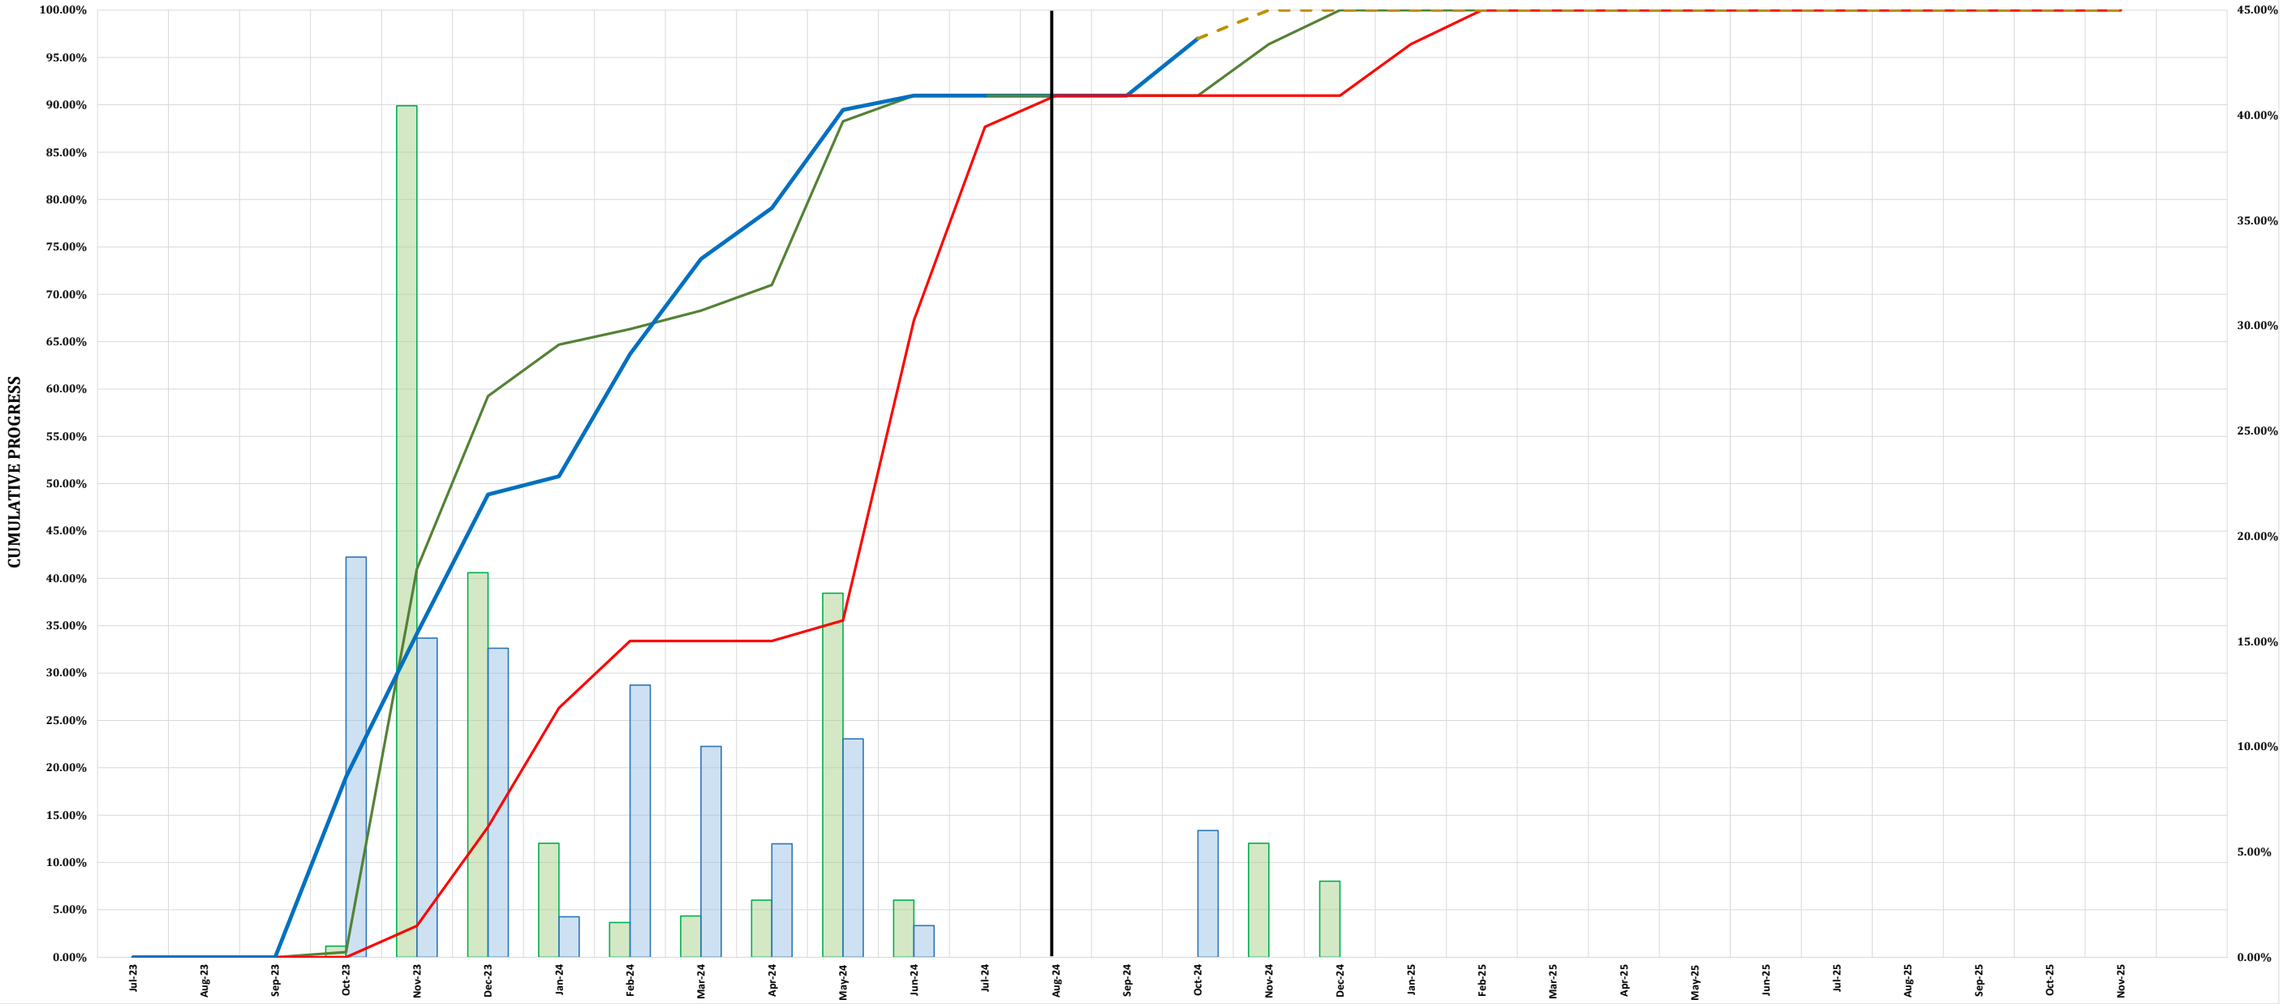


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														90.98%	90.98%	90.98%	96.39%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														90.98%	90.98%	90.98%	90.98%	90.98%	96.39%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													90.98%	90.98%	90.98%	96.99%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.53%	40.45%	18.27%	5.41%	1.65%	1.95%	2.71%	17.29%	2.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.41%	3.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	19.01%	15.16%	14.68%	1.92%	12.93%	10.02%	5.38%	10.38%	1.50%	0.00%	0.00%	0.00%	6.02%													
FORECAST																96.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

SAFETY ENGINEERING

ROSETTI MARINO

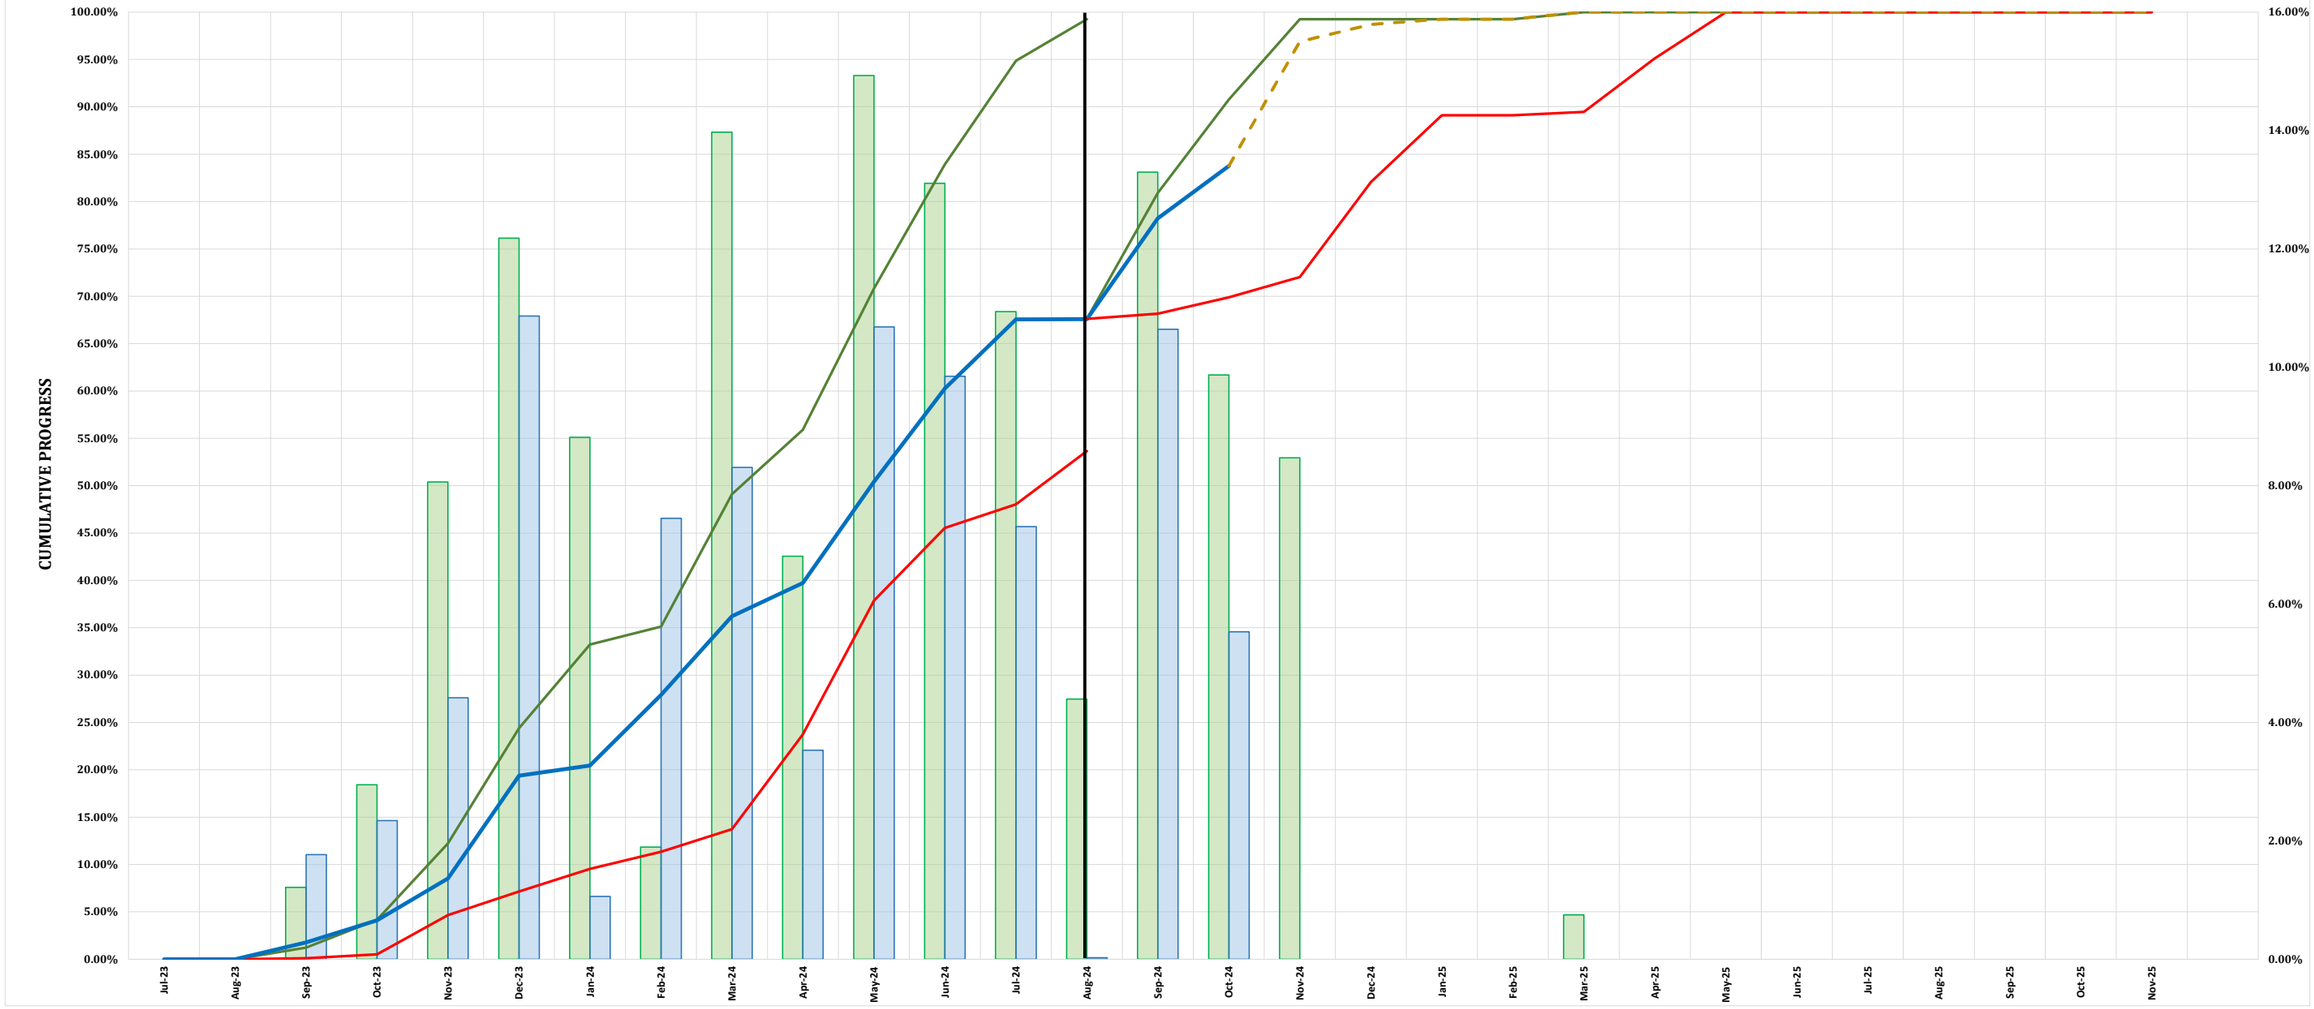


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														67.62%	80.91%	90.78%	99.25%	99.25%	99.25%	99.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														67.62%	68.17%	69.88%	72.02%	82.05%	89.11%	89.11%	89.47%	95.10%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													67.56%	67.59%	78.23%	83.76%													
PERIOD PLANNED		0.00%	1.21%	2.95%	8.06%	12.18%	8.82%	1.89%	13.97%	6.81%	14.93%	13.11%	10.94%	4.39%	13.29%	9.87%	8.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	1.76%	2.34%	4.42%	10.86%	1.06%	7.45%	8.31%	3.53%	10.68%	9.85%	7.31%	0.02%	10.64%	5.53%													
FORECAST																83.76%	96.89%	98.70%	99.27%	99.27%	100.02%	100.02%	100.02%	100.02%	100.02%	100.02%	100.02%	100.02%	100.02%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

ENGINEERING LOAD-OUT, TRANSPORT & INSTALLATION

ROSETTI MARINO

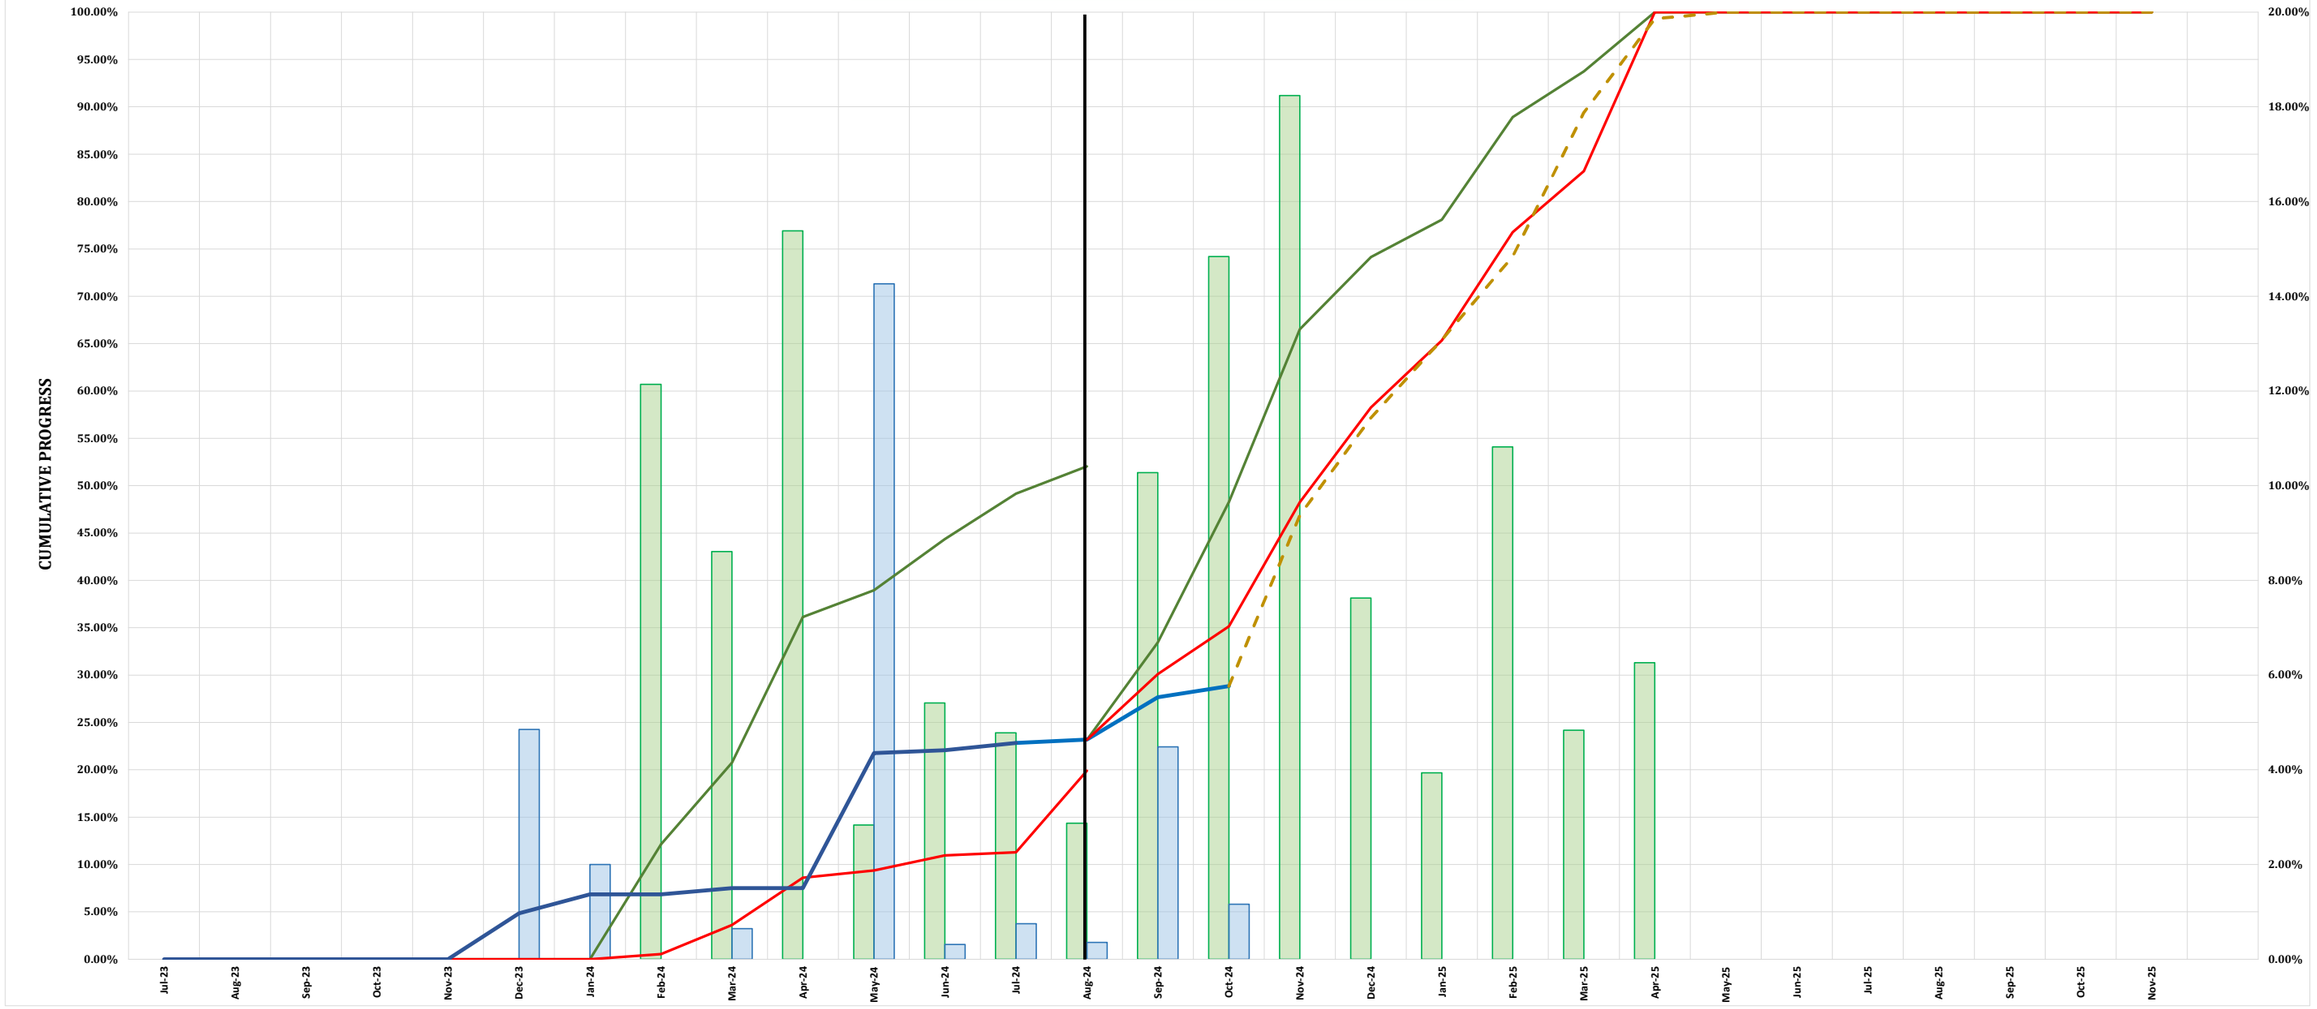

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														23.16%	33.44%	48.28%	66.52%	74.15%	78.08%	88.90%	93.74%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														23.16%	30.10%	35.13%	48.24%	58.26%	65.33%	76.78%	83.22%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													22.82%	23.18%	27.66%	28.82%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.14%	8.61%	15.38%	2.83%	5.41%	4.78%	2.87%	10.27%	14.84%	18.24%	7.63%	3.94%	10.82%	4.83%	6.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.85%	2.00%	0.00%	0.65%	0.00%	14.26%	0.31%	0.75%	0.35%	4.49%	1.16%													
FORECAST																28.82%	46.88%	57.15%	65.40%	74.22%	89.39%	99.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
