
HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

FABRICATION OVERALL

ROSETTI MARINO

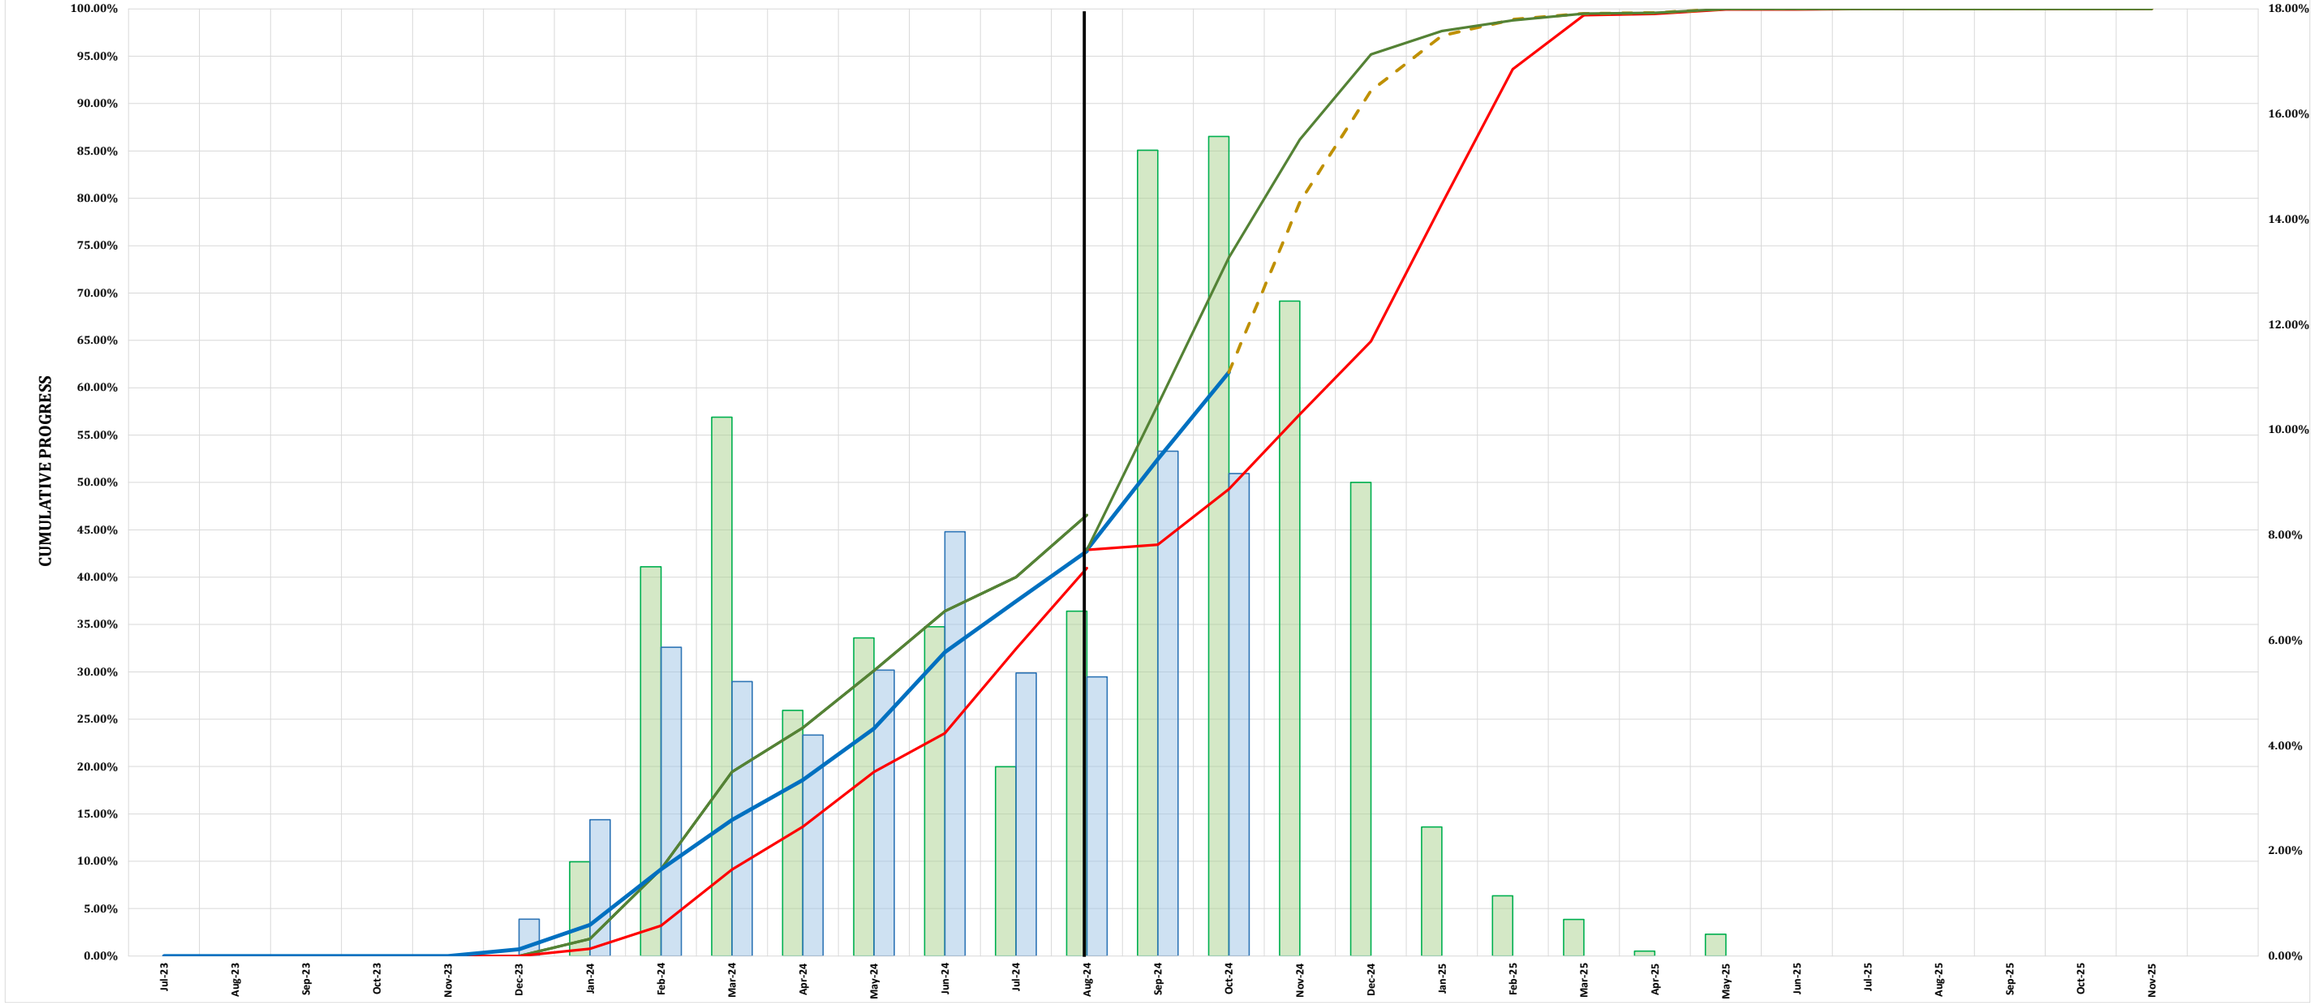


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														42.87%	58.18%	73.75%	86.20%	95.20%	97.65%	98.80%	99.49%	99.59%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														42.87%	43.43%	49.28%	57.20%	64.90%	79.39%	93.62%	99.34%	99.49%	99.95%	99.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														42.87%	52.46%	61.63%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.79%	7.40%	10.24%	4.67%	6.04%	6.26%	3.59%	6.55%	15.31%	15.57%	12.45%	9.00%	2.45%	1.14%	0.69%	0.09%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	2.59%	5.87%	5.21%	4.20%	5.43%	8.06%	5.38%	5.30%	9.59%	9.17%													
FORECAST																61.63%	79.60%	91.33%	97.16%	98.88%	99.51%	99.58%	100.02%	100.02%	100.02%	100.02%	100.02%	100.02%	100.02%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

STRUCTURAL

ROSETTI MARINO

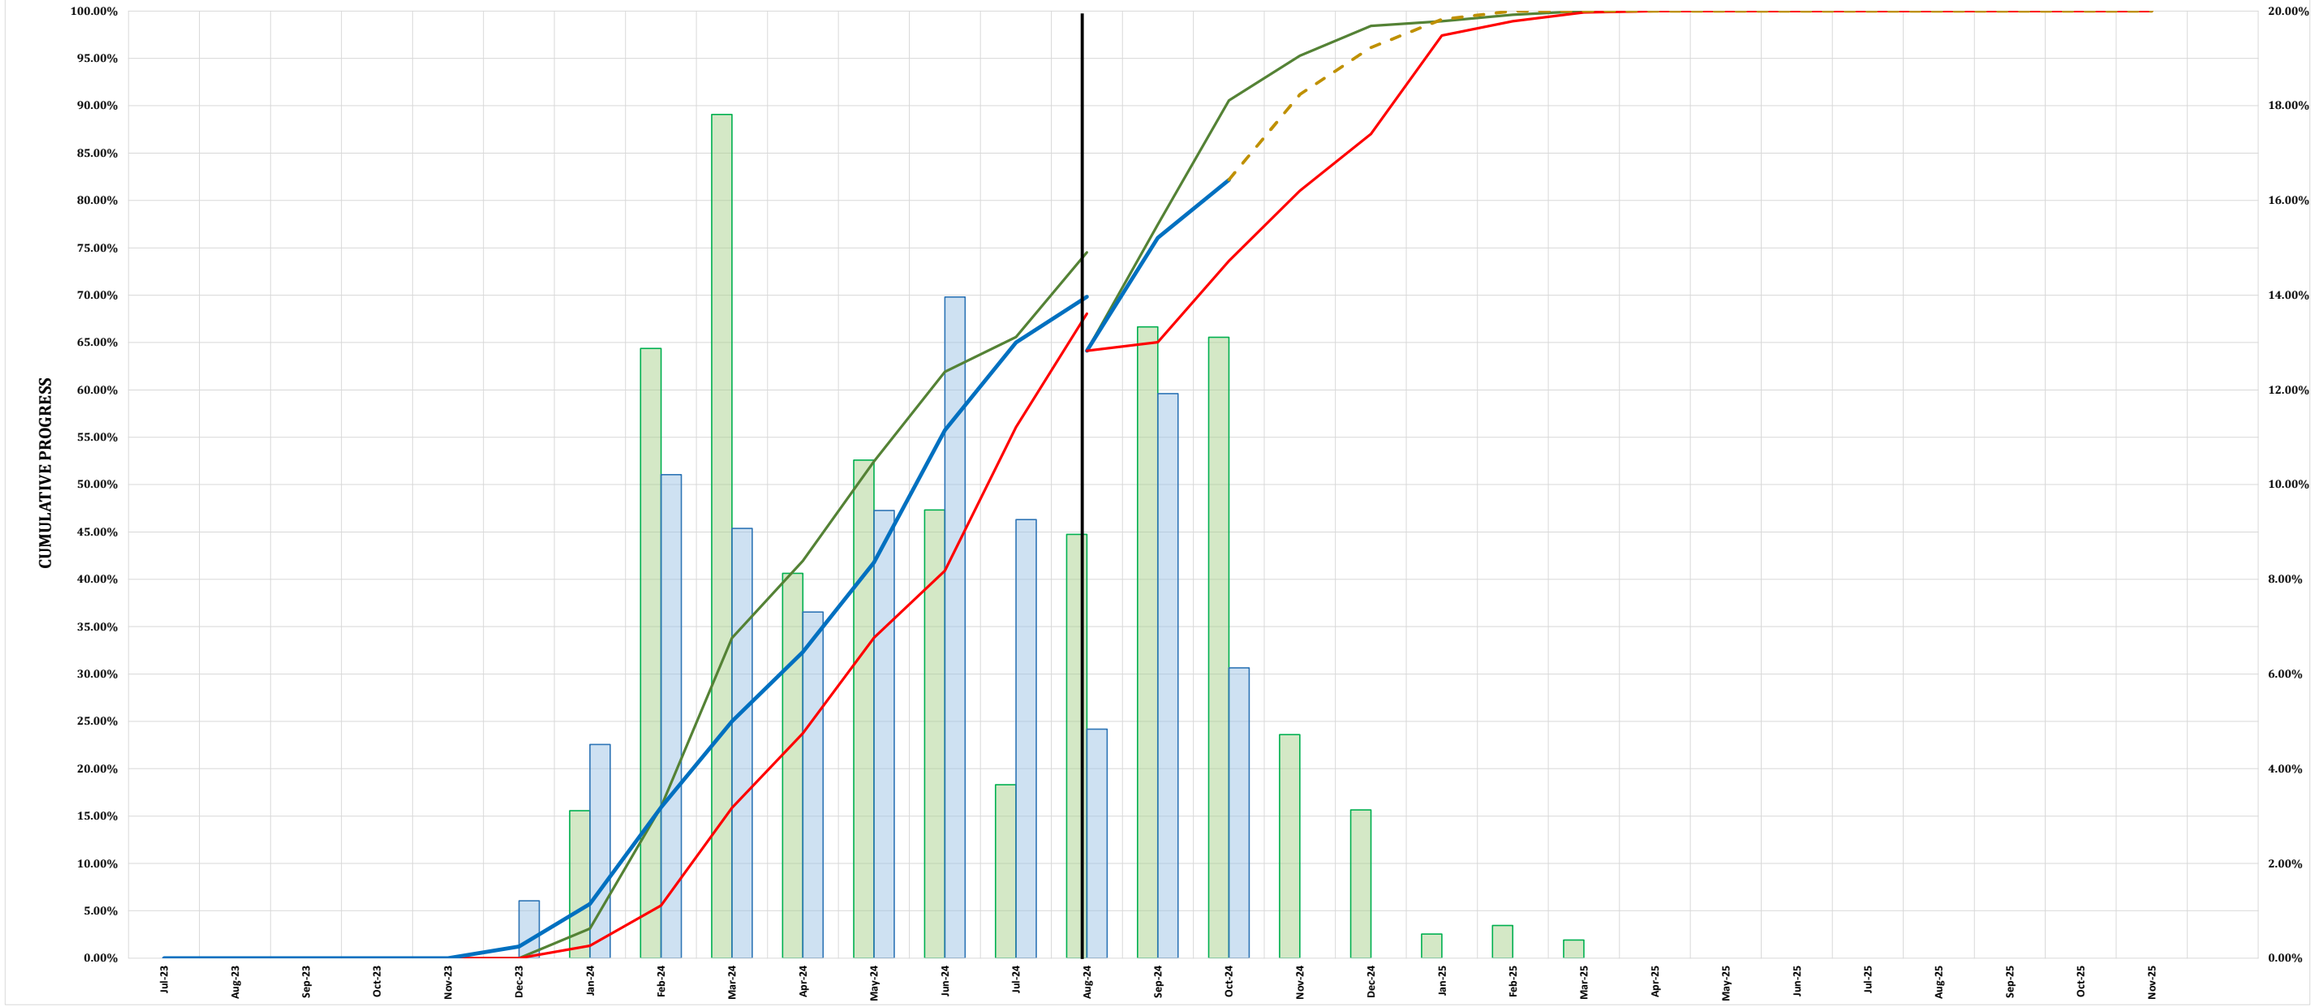


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														64.13%	77.46%	90.57%	95.29%	98.42%	98.93%	99.62%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														64.13%	65.02%	73.62%	81.02%	87.01%	97.41%	98.92%	99.84%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														64.13%	76.05%	82.18%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.12%	12.88%	17.82%	8.12%	10.52%	9.47%	3.66%	8.95%	13.33%	13.11%	4.72%	3.13%	0.51%	0.69%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.21%	4.51%	10.21%	9.07%	7.31%	9.45%	13.96%	9.26%	4.84%	11.92%	6.13%													
FORECAST																82.18%	91.19%	96.14%	99.12%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

PIPING

ROSETTI MARINO

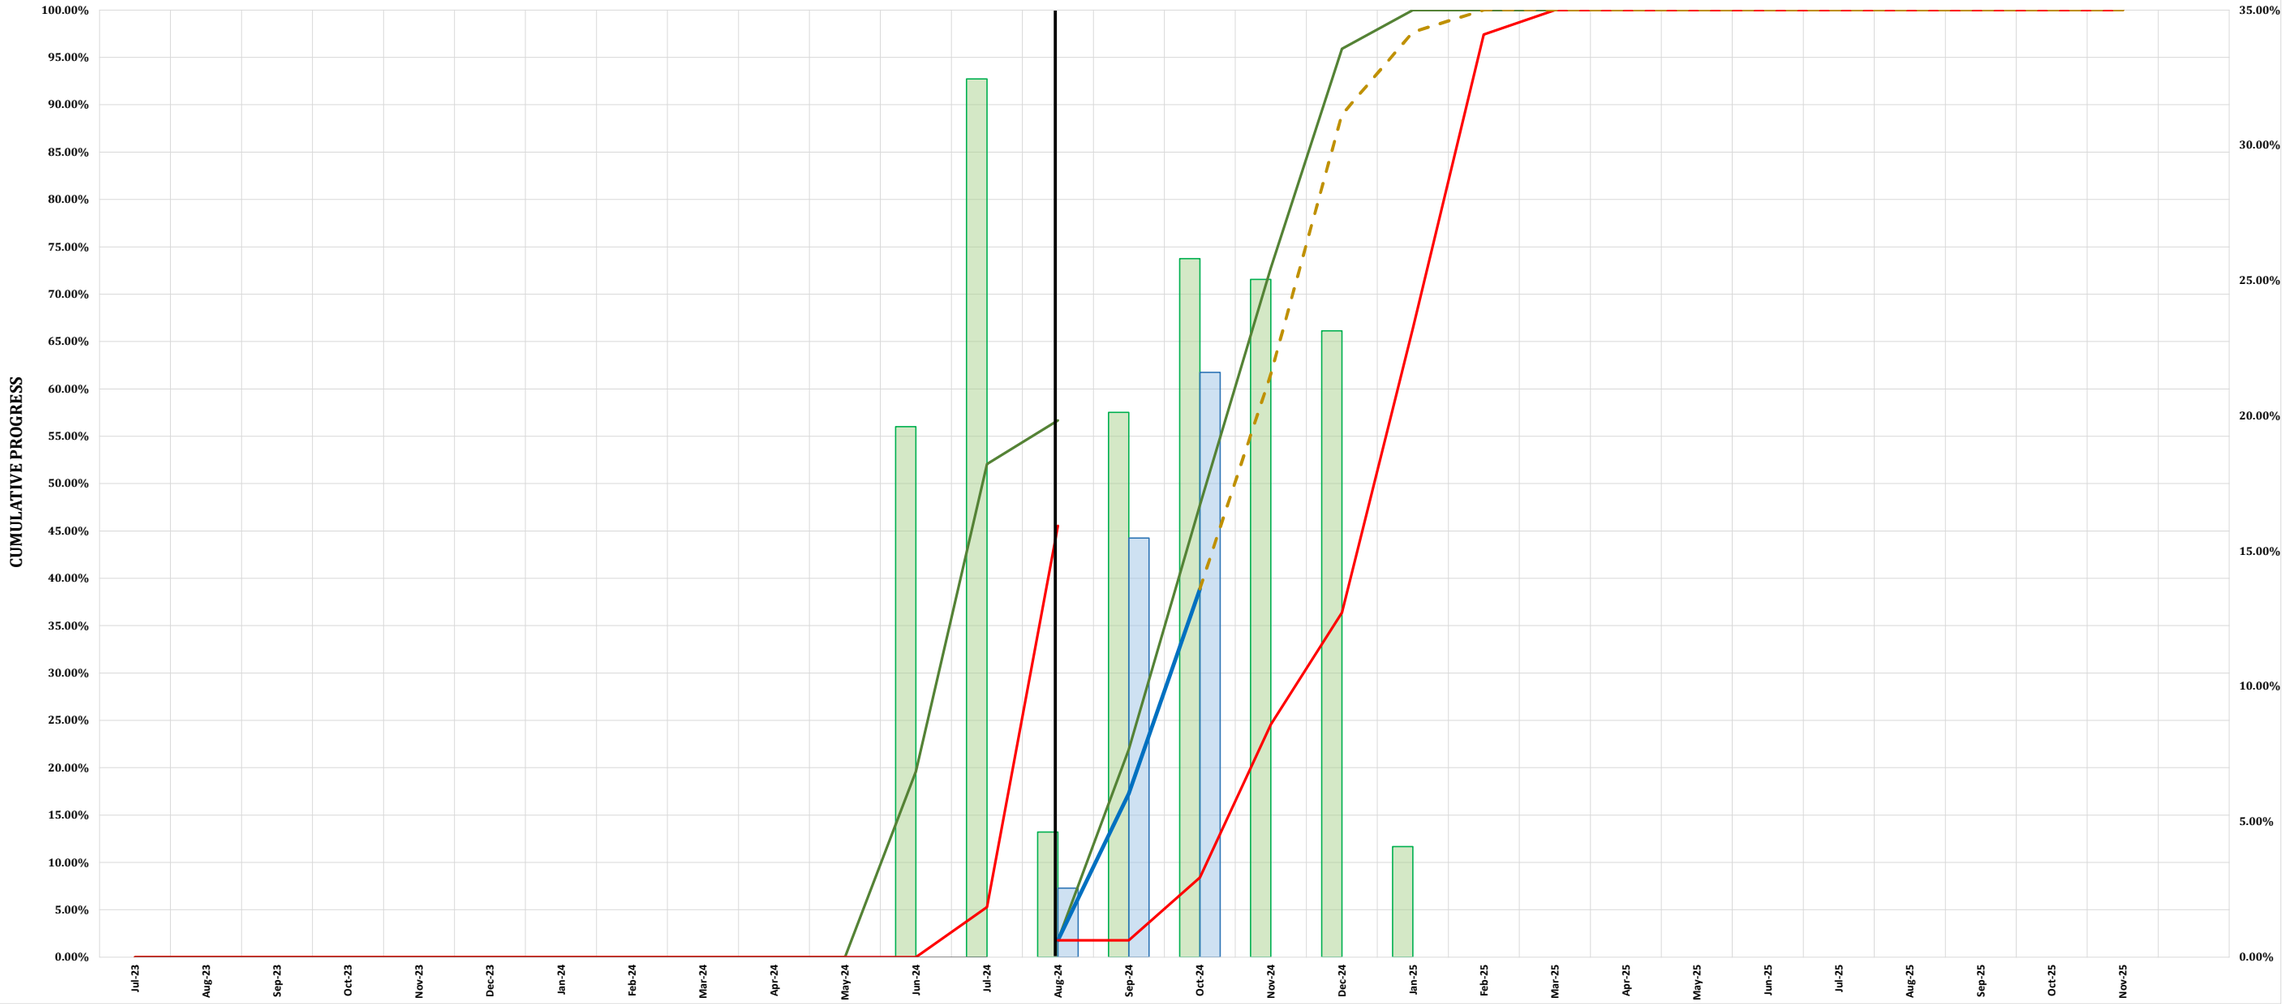


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														1.78%	21.91%	47.73%	72.78%	95.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														1.78%	1.78%	8.40%	24.55%	36.36%	66.39%	97.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														1.78%	17.27%	38.88%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.61%	32.45%	4.62%	20.13%	25.82%	25.04%	23.14%	4.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.55%	15.49%	21.61%													
FORECAST																38.88%	61.57%	88.94%	97.68%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%	100.01%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

MECHANICAL


ROSETTI MARINO

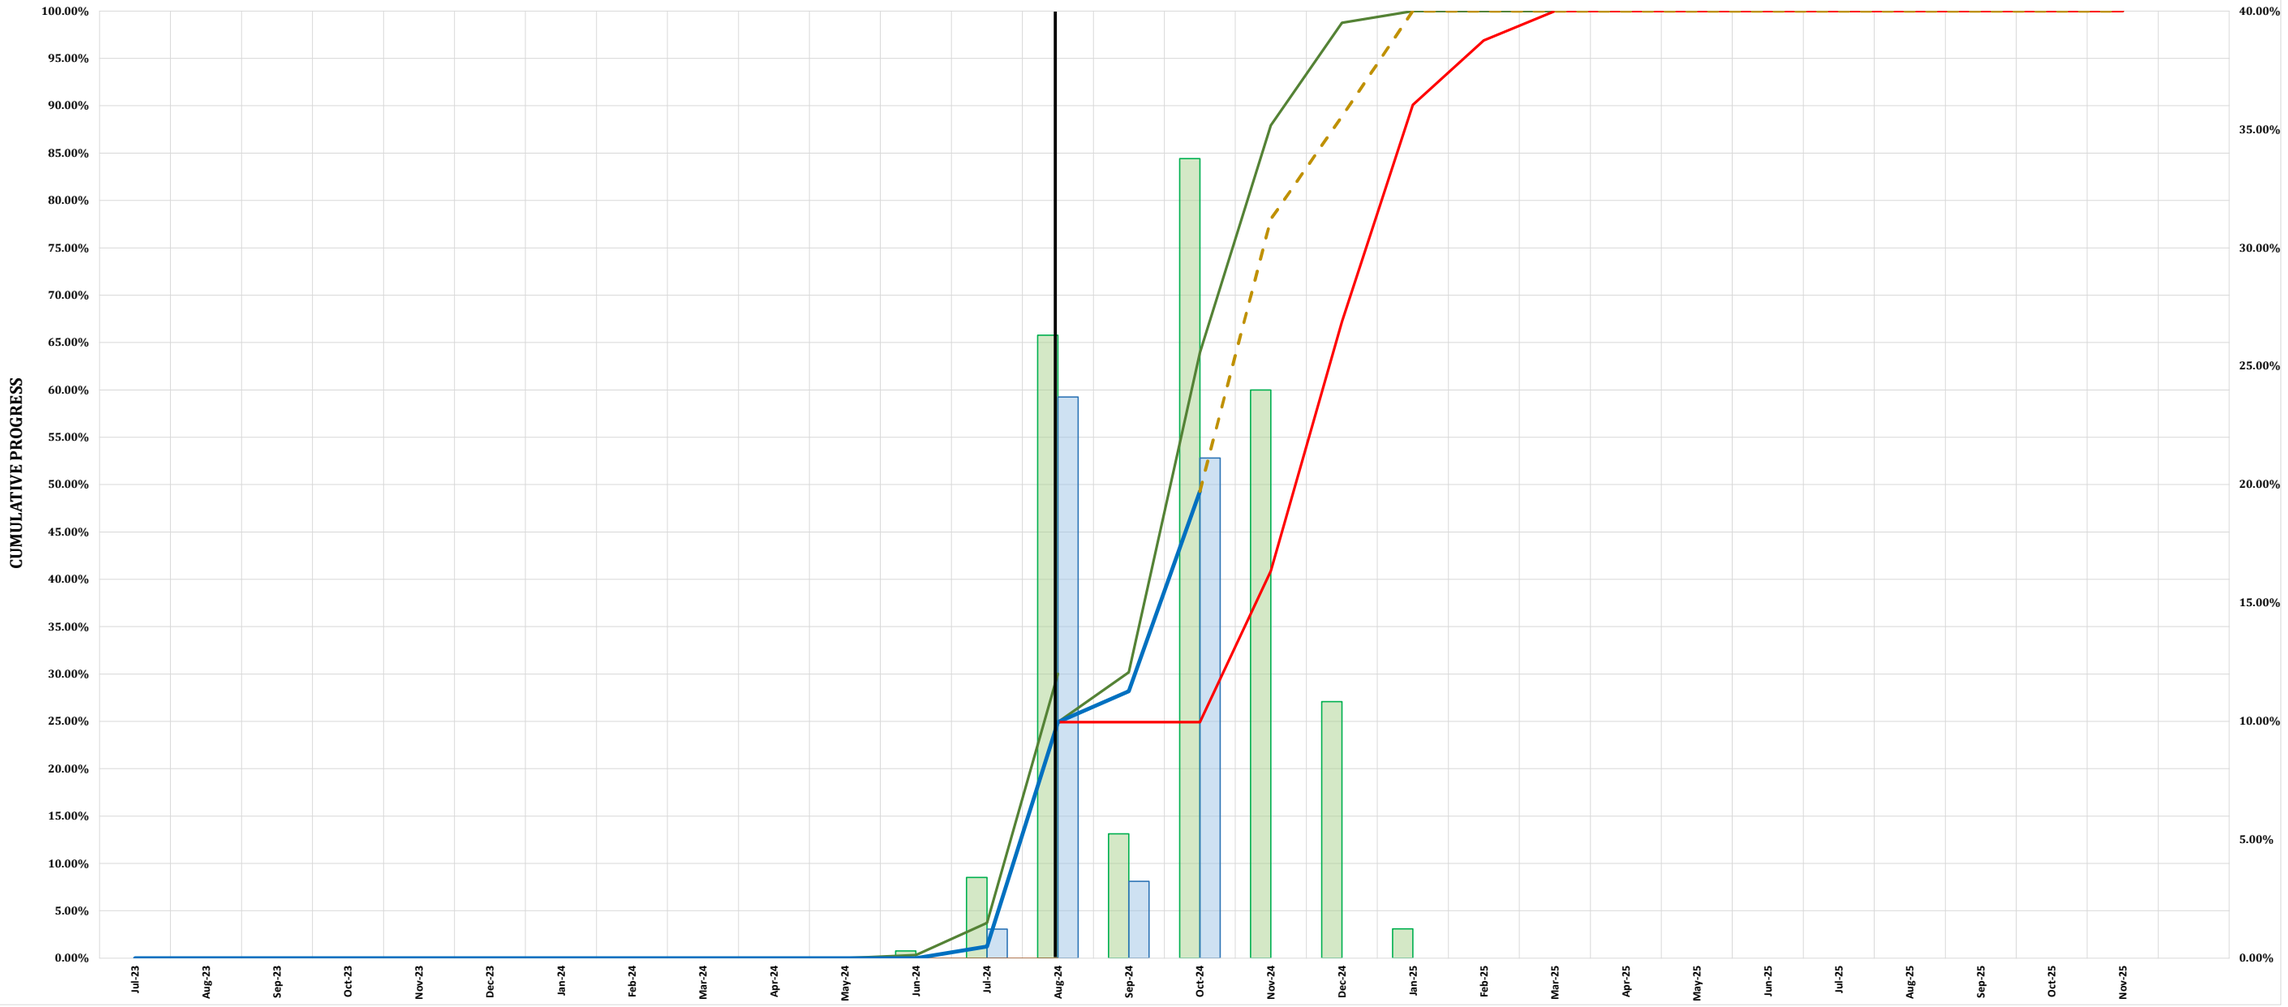

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														24.92%	30.17%	63.93%	87.93%	98.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														24.92%	24.92%	24.92%	40.88%	67.19%	90.09%	96.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														24.92%	28.17%	49.29%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	3.41%	26.31%	5.25%	33.77%	23.99%	10.84%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.23%	23.70%	3.25%	21.12%													
FORECAST																49.29%	78.02%	88.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
ELECTRICAL


ROSETTI MARINO

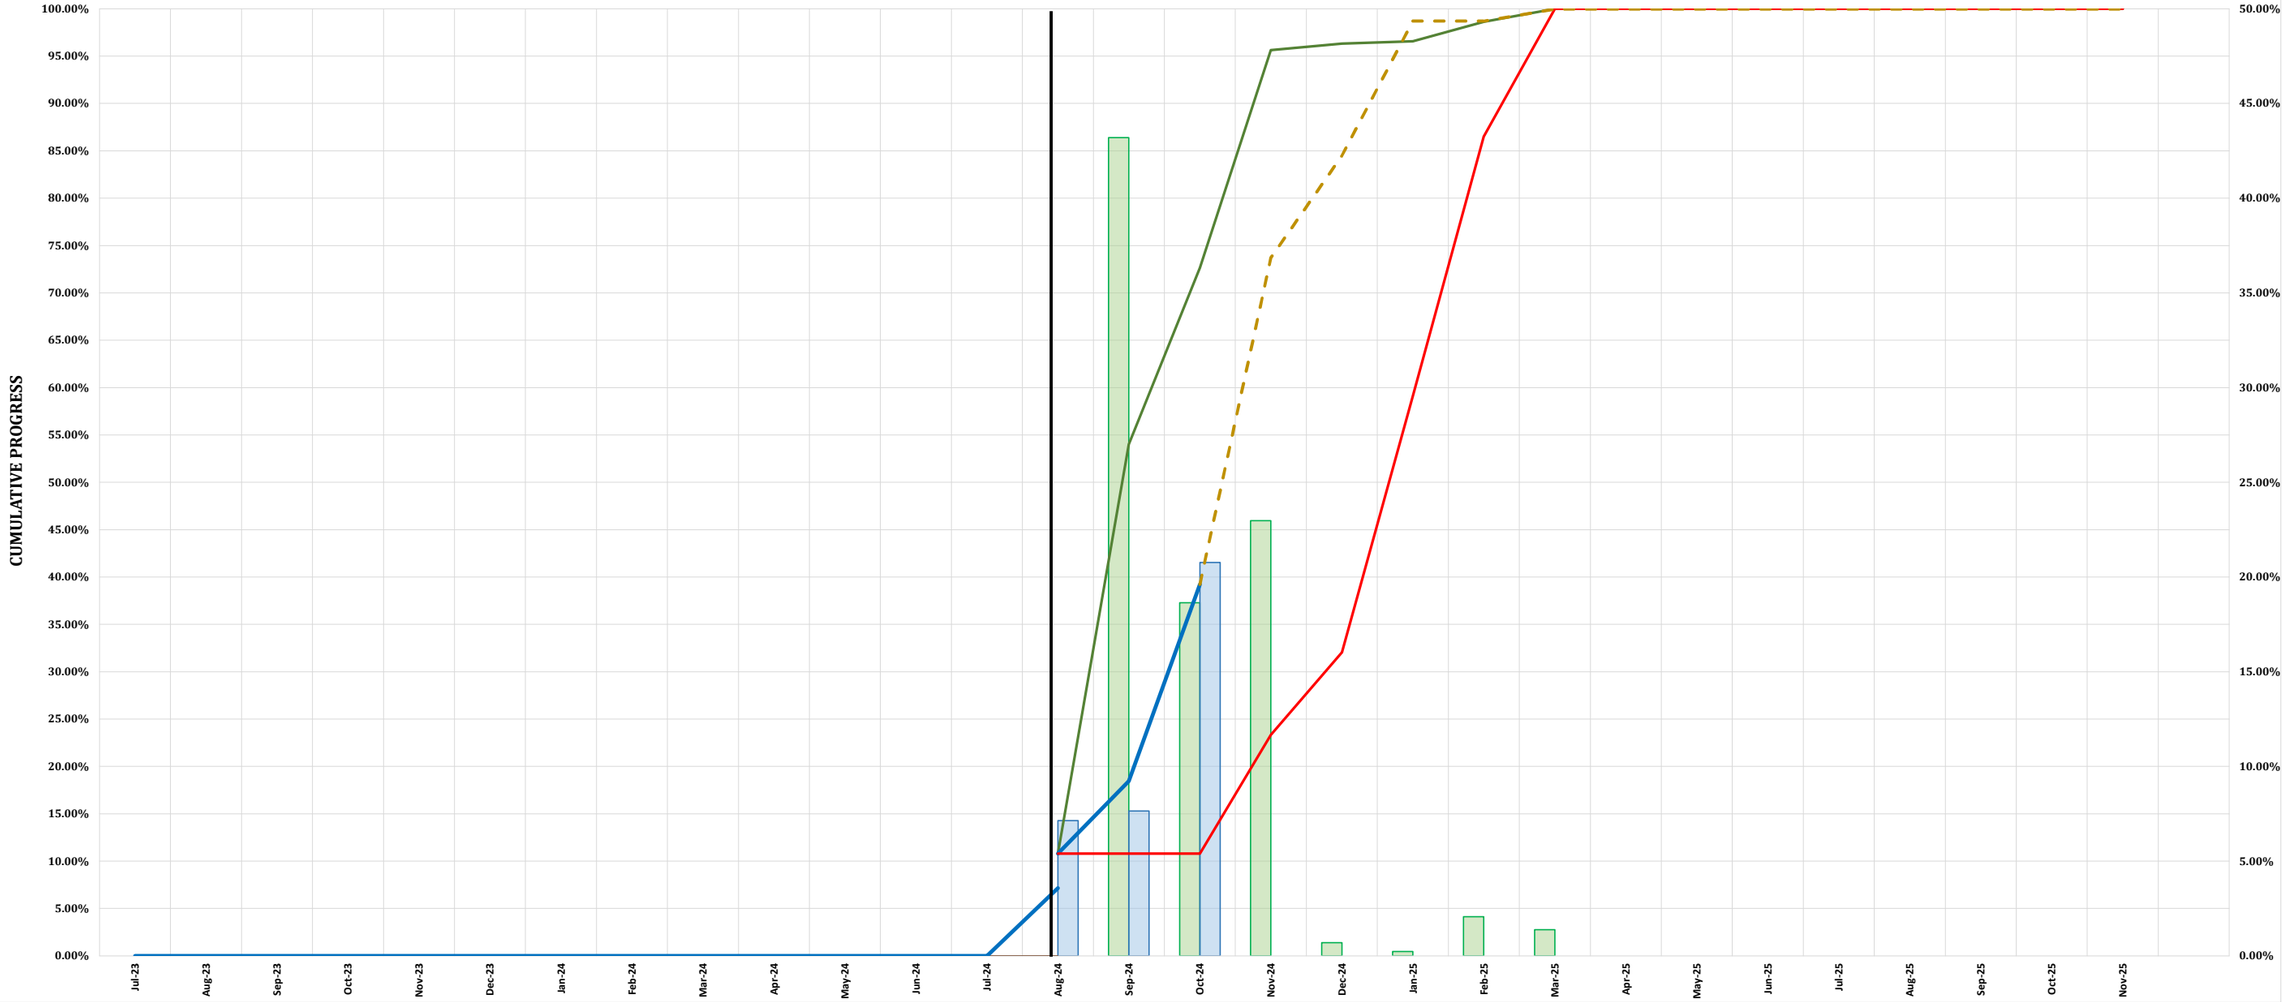

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														10.80%	54.00%	72.65%	95.63%	96.32%	96.55%	98.62%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														10.80%	10.80%	10.80%	23.33%	32.04%	59.11%	86.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														10.80%	18.45%	39.22%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43.20%	18.65%	22.98%	0.69%	0.23%	2.07%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%	7.65%	20.76%													
FORECAST																39.22%	73.70%	84.47%	98.69%	98.69%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
INSTRUMENTATION

ROSETTI MARINO

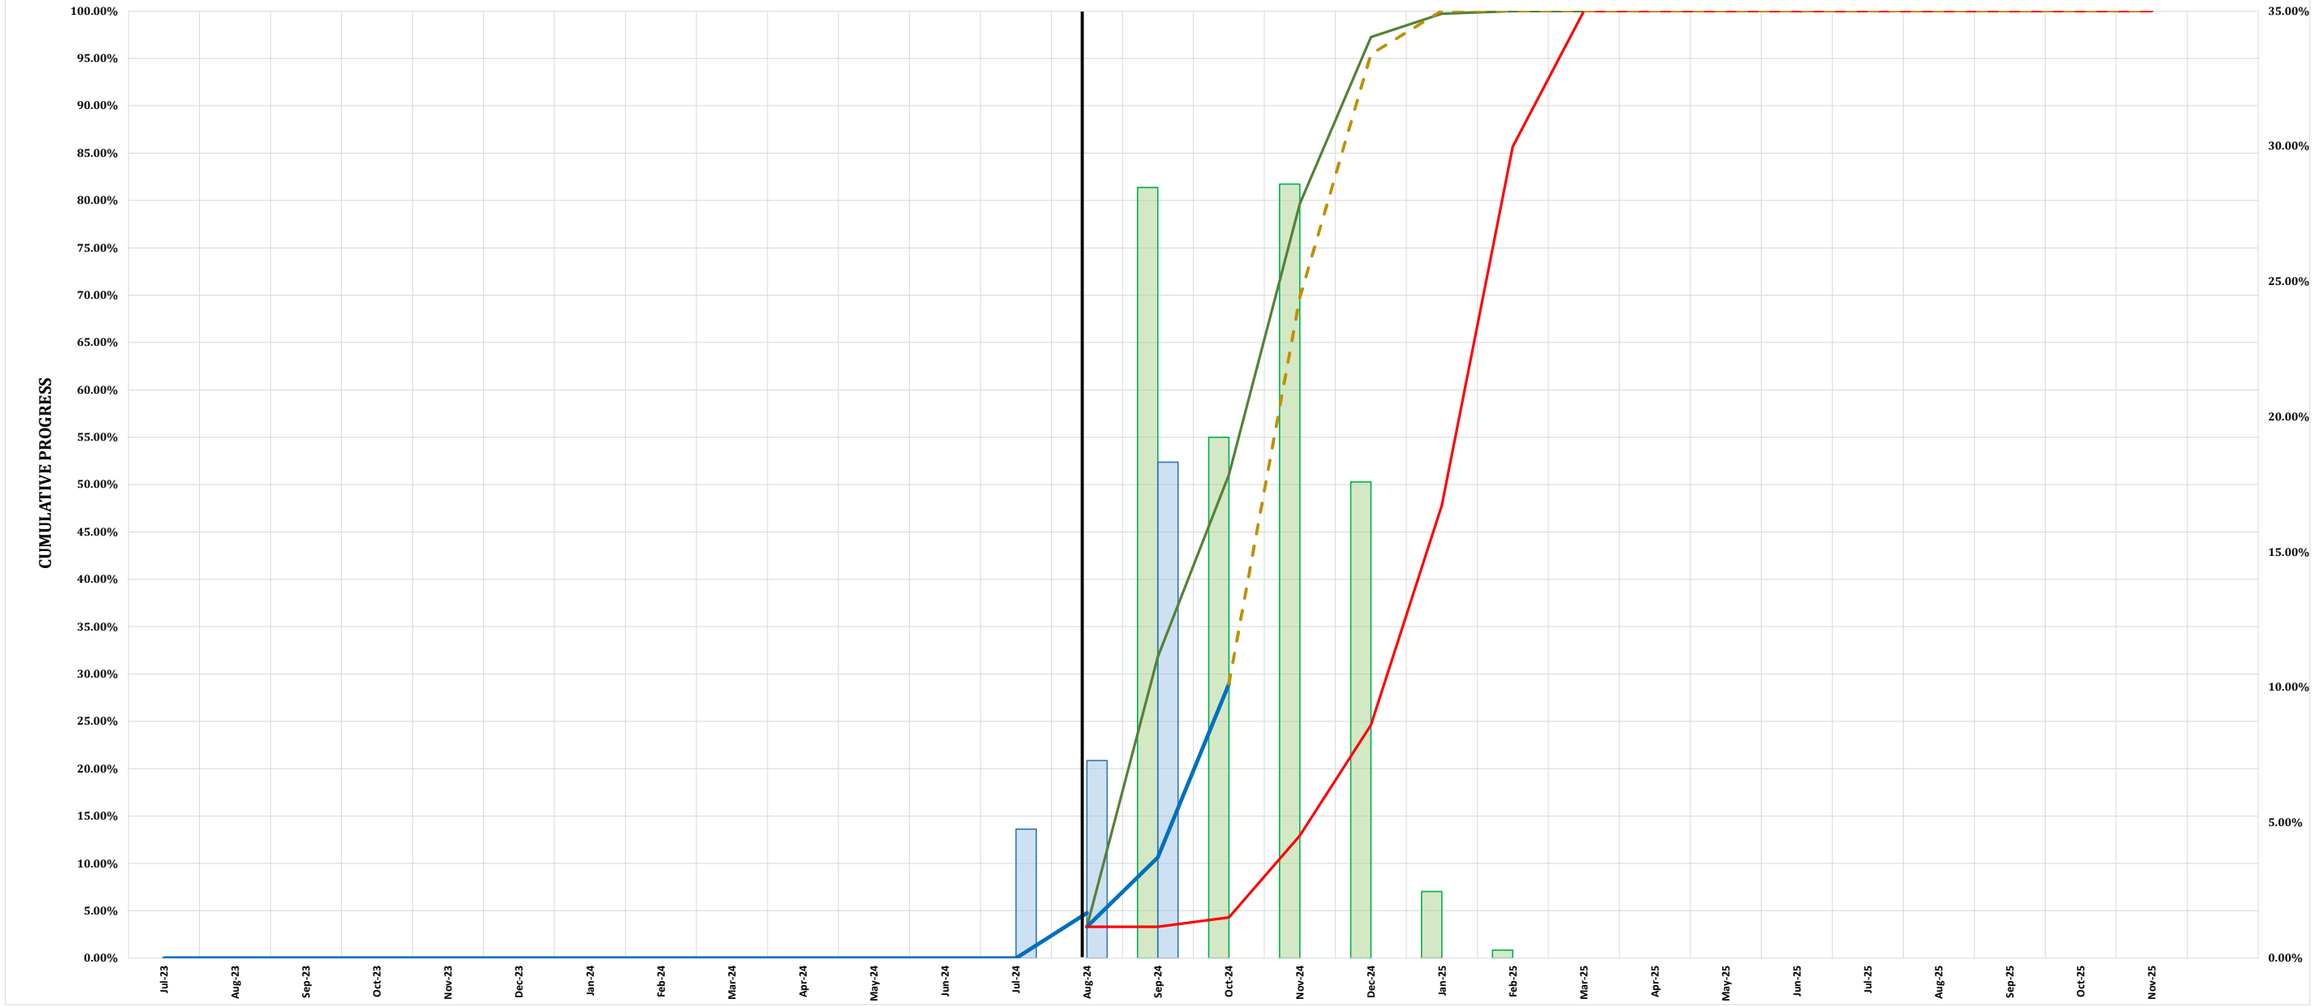


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														3.31%	31.80%	51.04%	79.65%	97.24%	99.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														3.31%	3.31%	4.29%	12.94%	24.62%	47.81%	85.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														3.31%	10.62%	28.94%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.48%	19.25%	28.60%	17.60%	2.47%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.77%	7.30%	18.32%													
FORECAST																28.94%	69.74%	95.43%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

SAFETY

ROSETTI MARINO

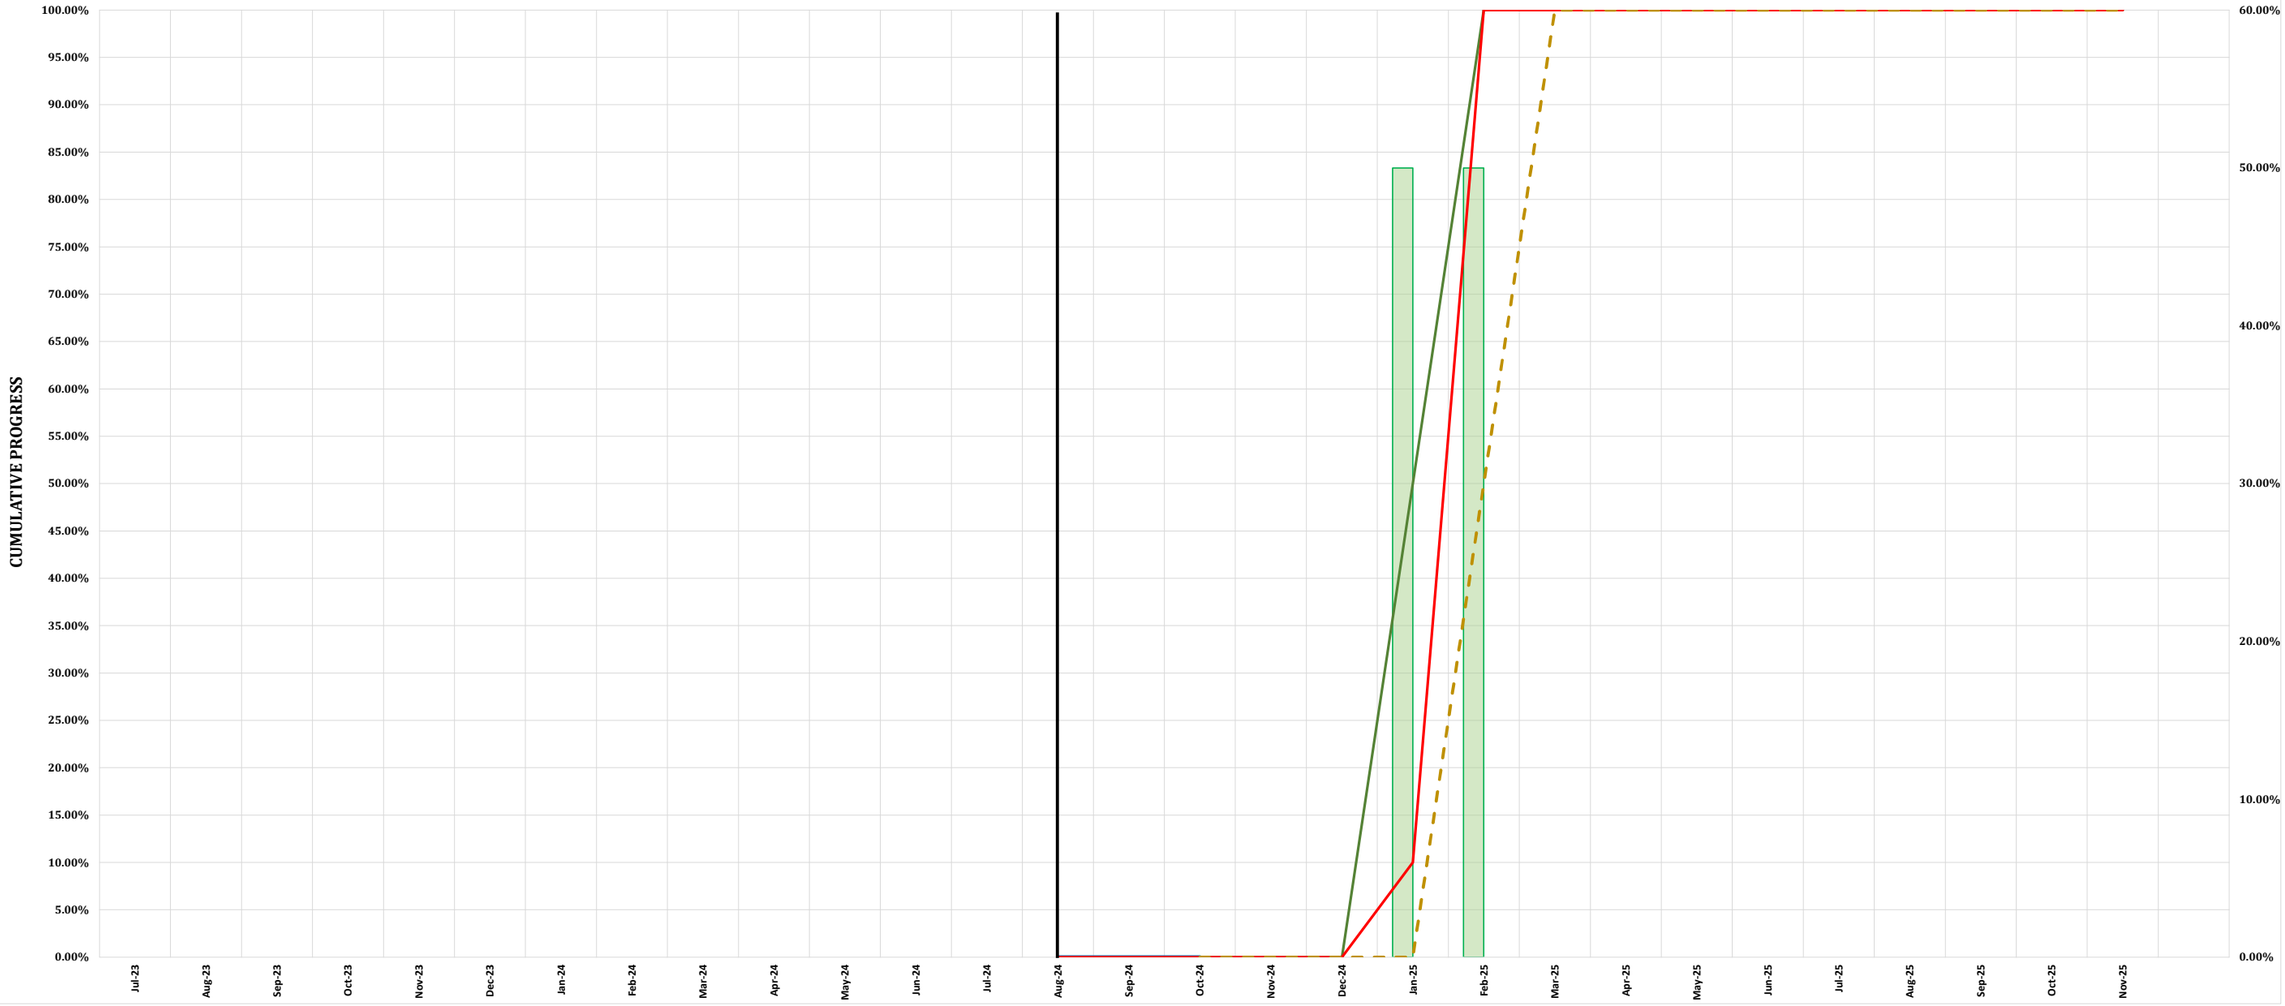


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														0.00%	0.00%	0.00%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													
FORECAST																0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

KEY PACKAGE INTEGRATION

ROSETTI MARINO

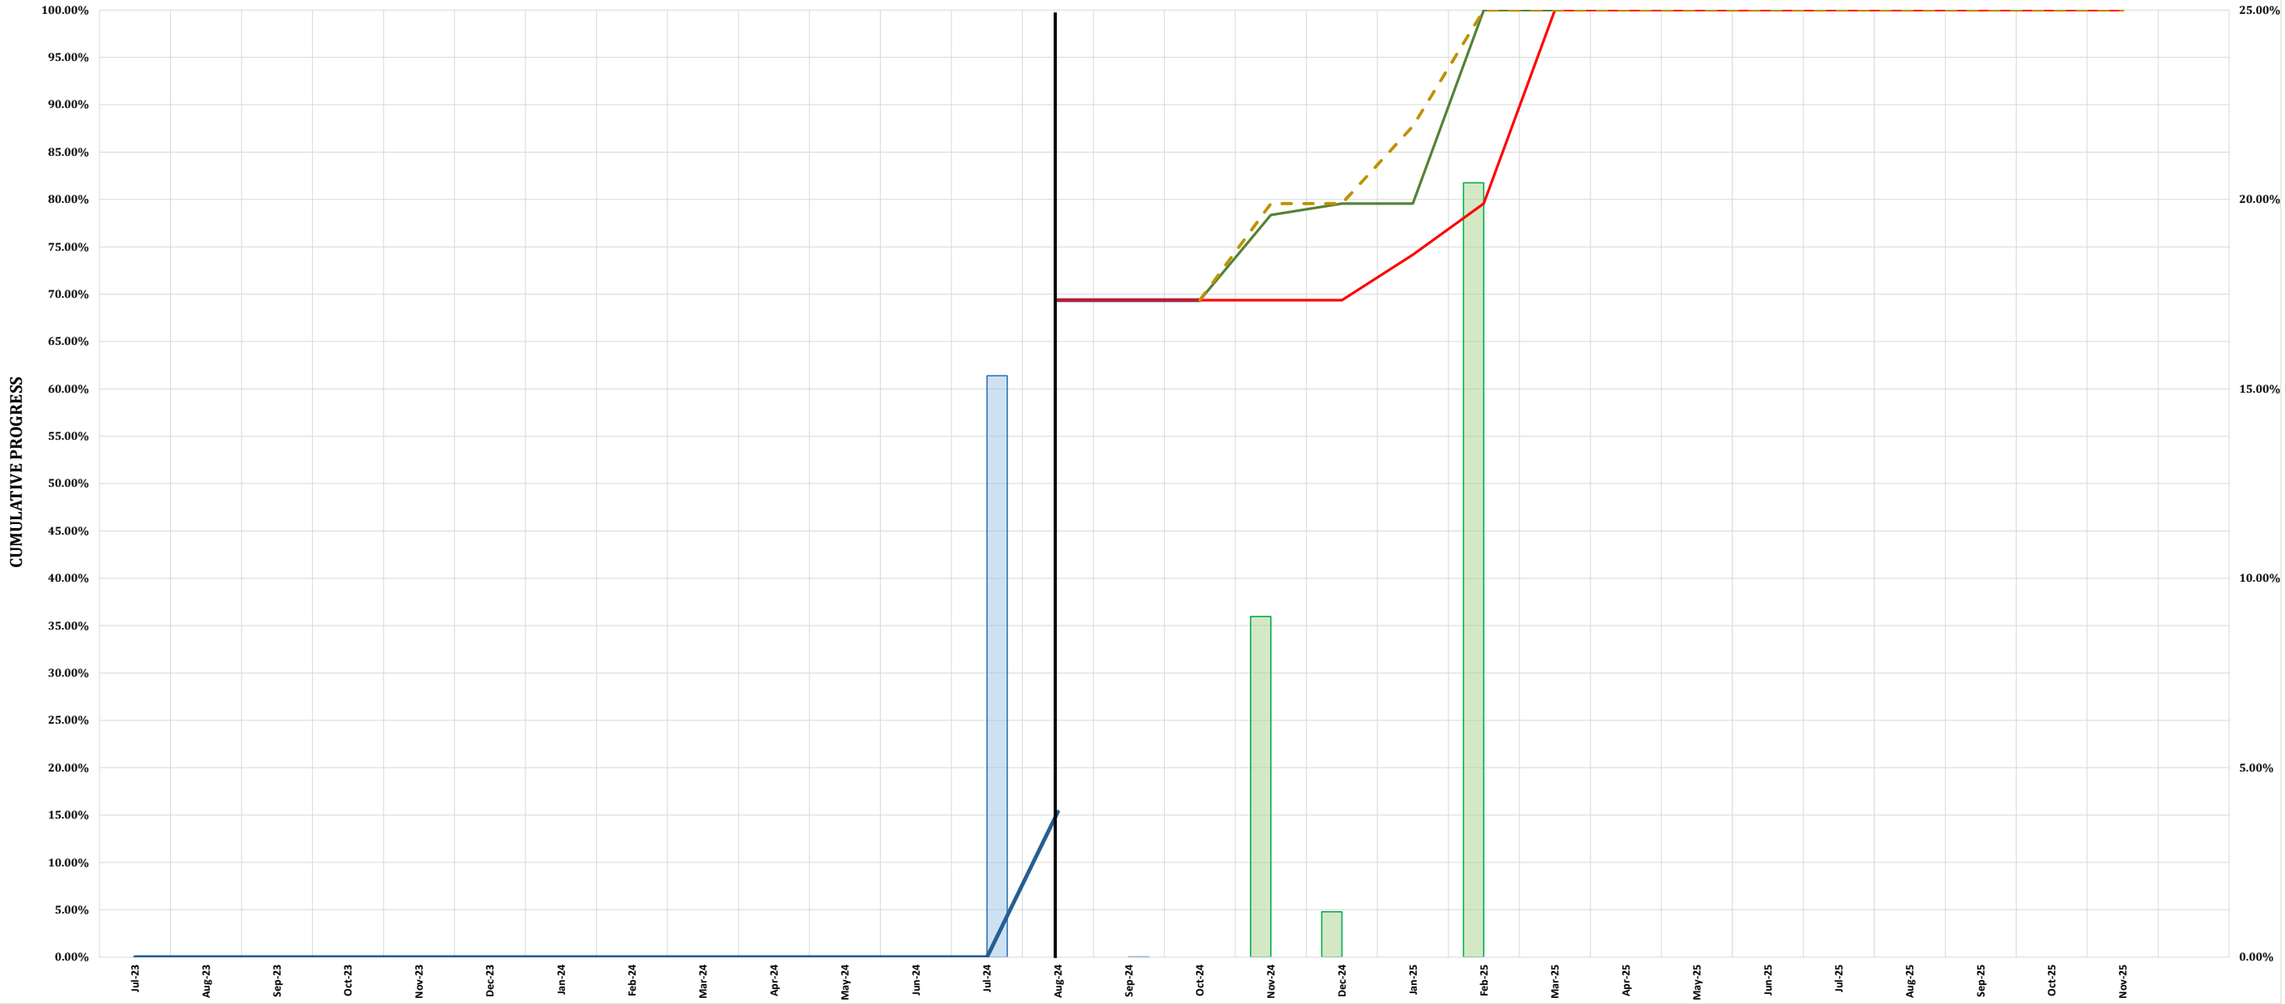


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														69.37%	69.37%	69.37%	78.36%	79.56%	79.56%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														69.37%	69.37%	69.37%	69.37%	69.37%	74.16%	79.56%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														69.37%	69.37%	69.37%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.99%	1.20%	0.00%	20.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.34%	0.00%	0.00%													
FORECAST																69.37%	79.56%	79.56%	87.74%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project


FINALIZATION

ROSETTI MARINO

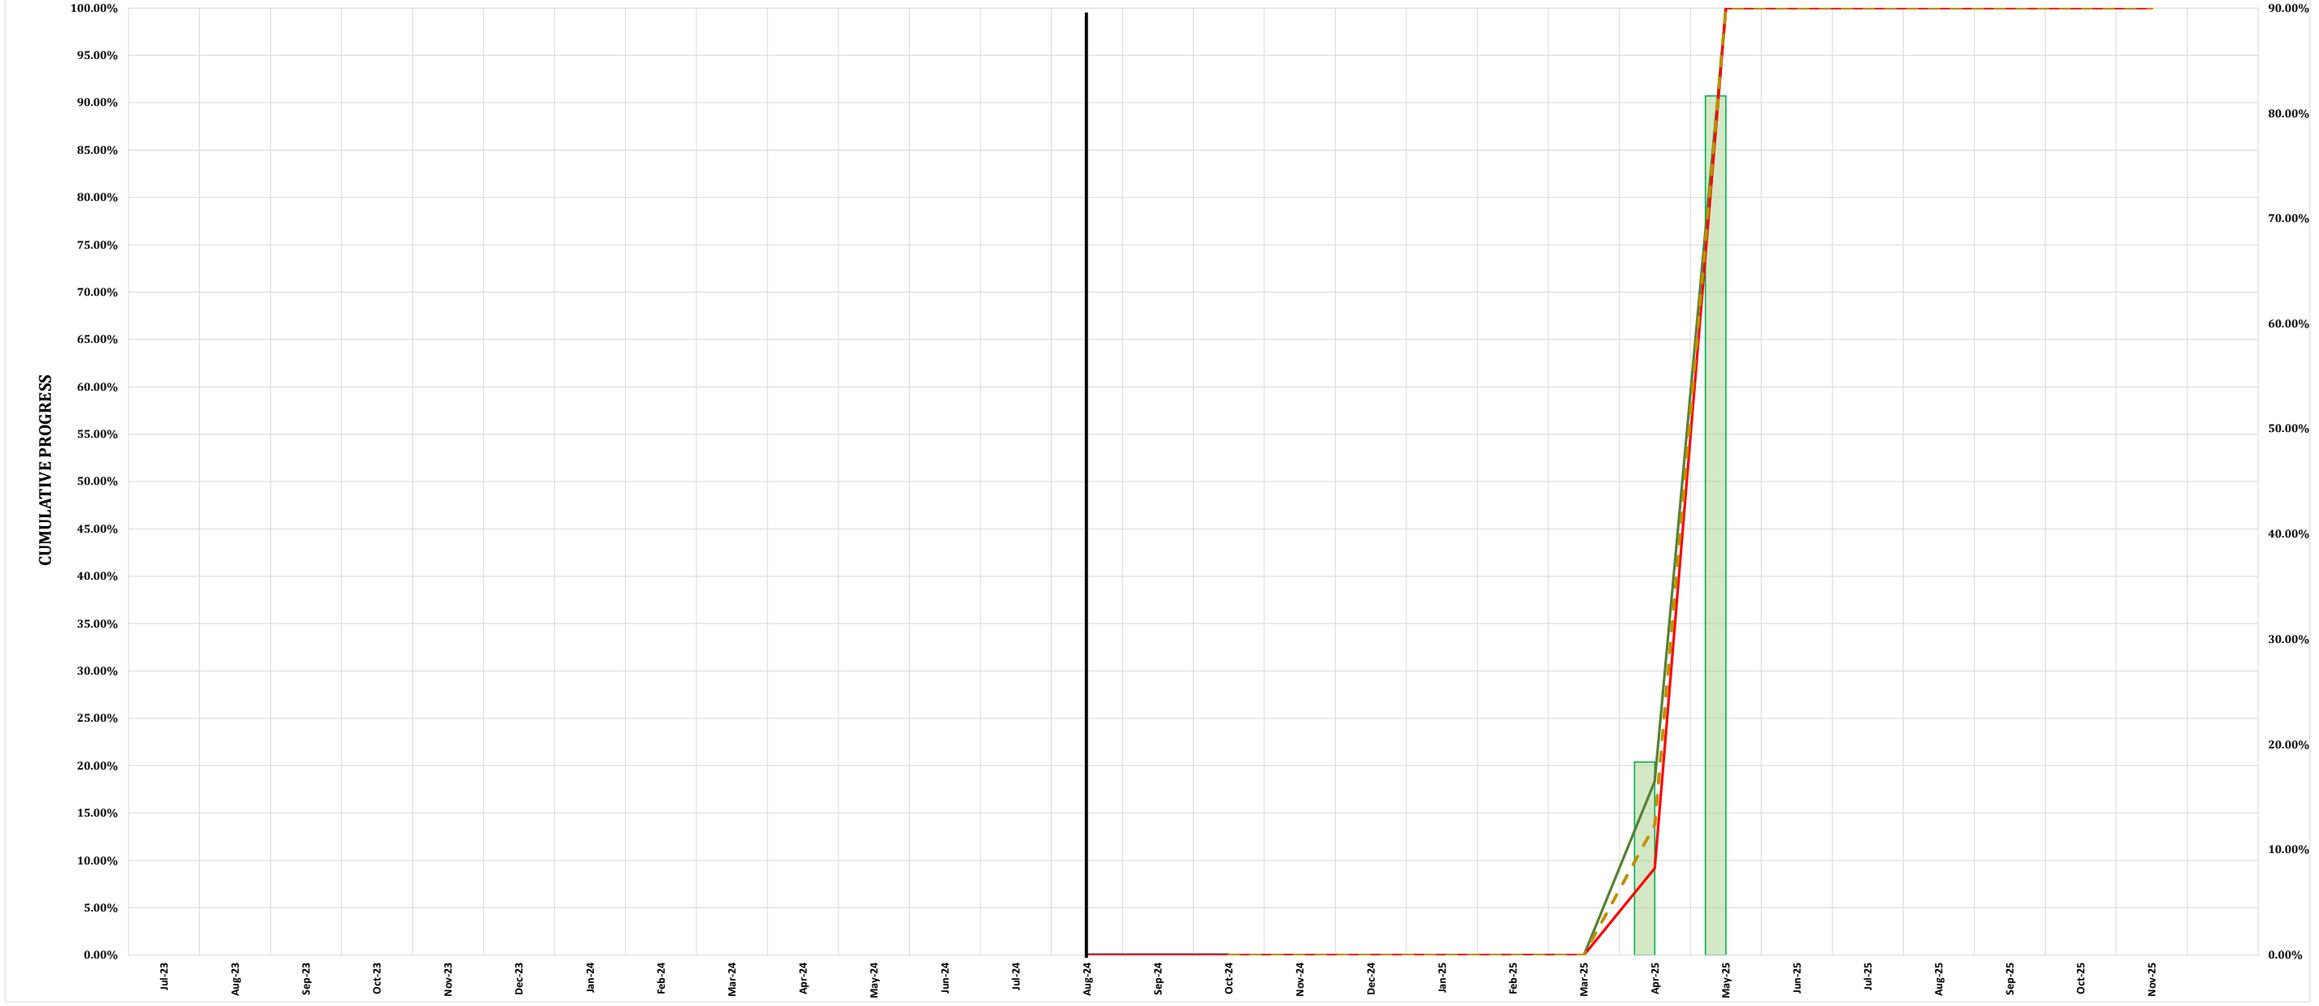

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.35%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.18%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														0.00%	0.00%	0.00%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.35%	81.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													
FORECAST																0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

FORECAST	PERIOD ACTUAL	PERIOD PLANNED	CUM. ACTUAL	CUM. LATE	CUM. LATE OLD	CUM. EARLY	
					0.00%		Jul-23
	0.00%	0.00%			0.00%		Aug-23
	0.00%	0.00%			0.00%		Sep-23
	0.00%	0.00%			0.00%		Oct-23
	0.00%	0.00%			0.00%		Nov-23
	0.00%	0.00%			0.00%		Dec-23
	0.00%	0.00%			0.00%		Jan-24
	0.00%	0.00%			0.00%		Feb-24
	0.00%	0.00%			0.00%		Mar-24
	0.00%	0.00%			0.00%		Apr-24
	0.00%	0.00%			0.00%		May-24
	0.00%	0.00%			0.00%		Jun-24
	0.00%	0.00%			0.00%		Jul-24
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Aug-24
	0.61%	7.57%	0.61%	0.00%	0.00%	7.57%	Sep-24
4.93%	4.32%	14.70%	4.93%	0.00%	16.37%	22.27%	Oct-24
43.18%		28.39%		1.83%	52.23%	50.66%	Nov-24
76.58%		32.07%		7.34%	96.38%	82.73%	Dec-24
90.76%		12.16%		22.27%	100.00%	94.89%	Jan-25
97.03%		2.00%		75.68%	100.00%	96.89%	Feb-25
100.15%		3.11%		99.56%	100.00%	100.00%	Mar-25
100.15%		0.00%		99.56%	100.00%	100.00%	Apr-25
100.15%		0.00%		99.56%	100.00%	100.00%	May-25
100.15%		0.00%		99.56%	100.00%	100.00%	Jun-25
100.15%		0.00%		100.00%	100.00%	100.00%	Jul-25
100.15%		0.00%		100.00%	100.00%	100.00%	Aug-25
100.15%		0.00%		100.00%	100.00%	100.00%	Sep-25
100.15%		0.00%		100.00%	100.00%	100.00%	Oct-25
100.15%		0.00%		100.00%	100.00%	100.00%	Nov-25

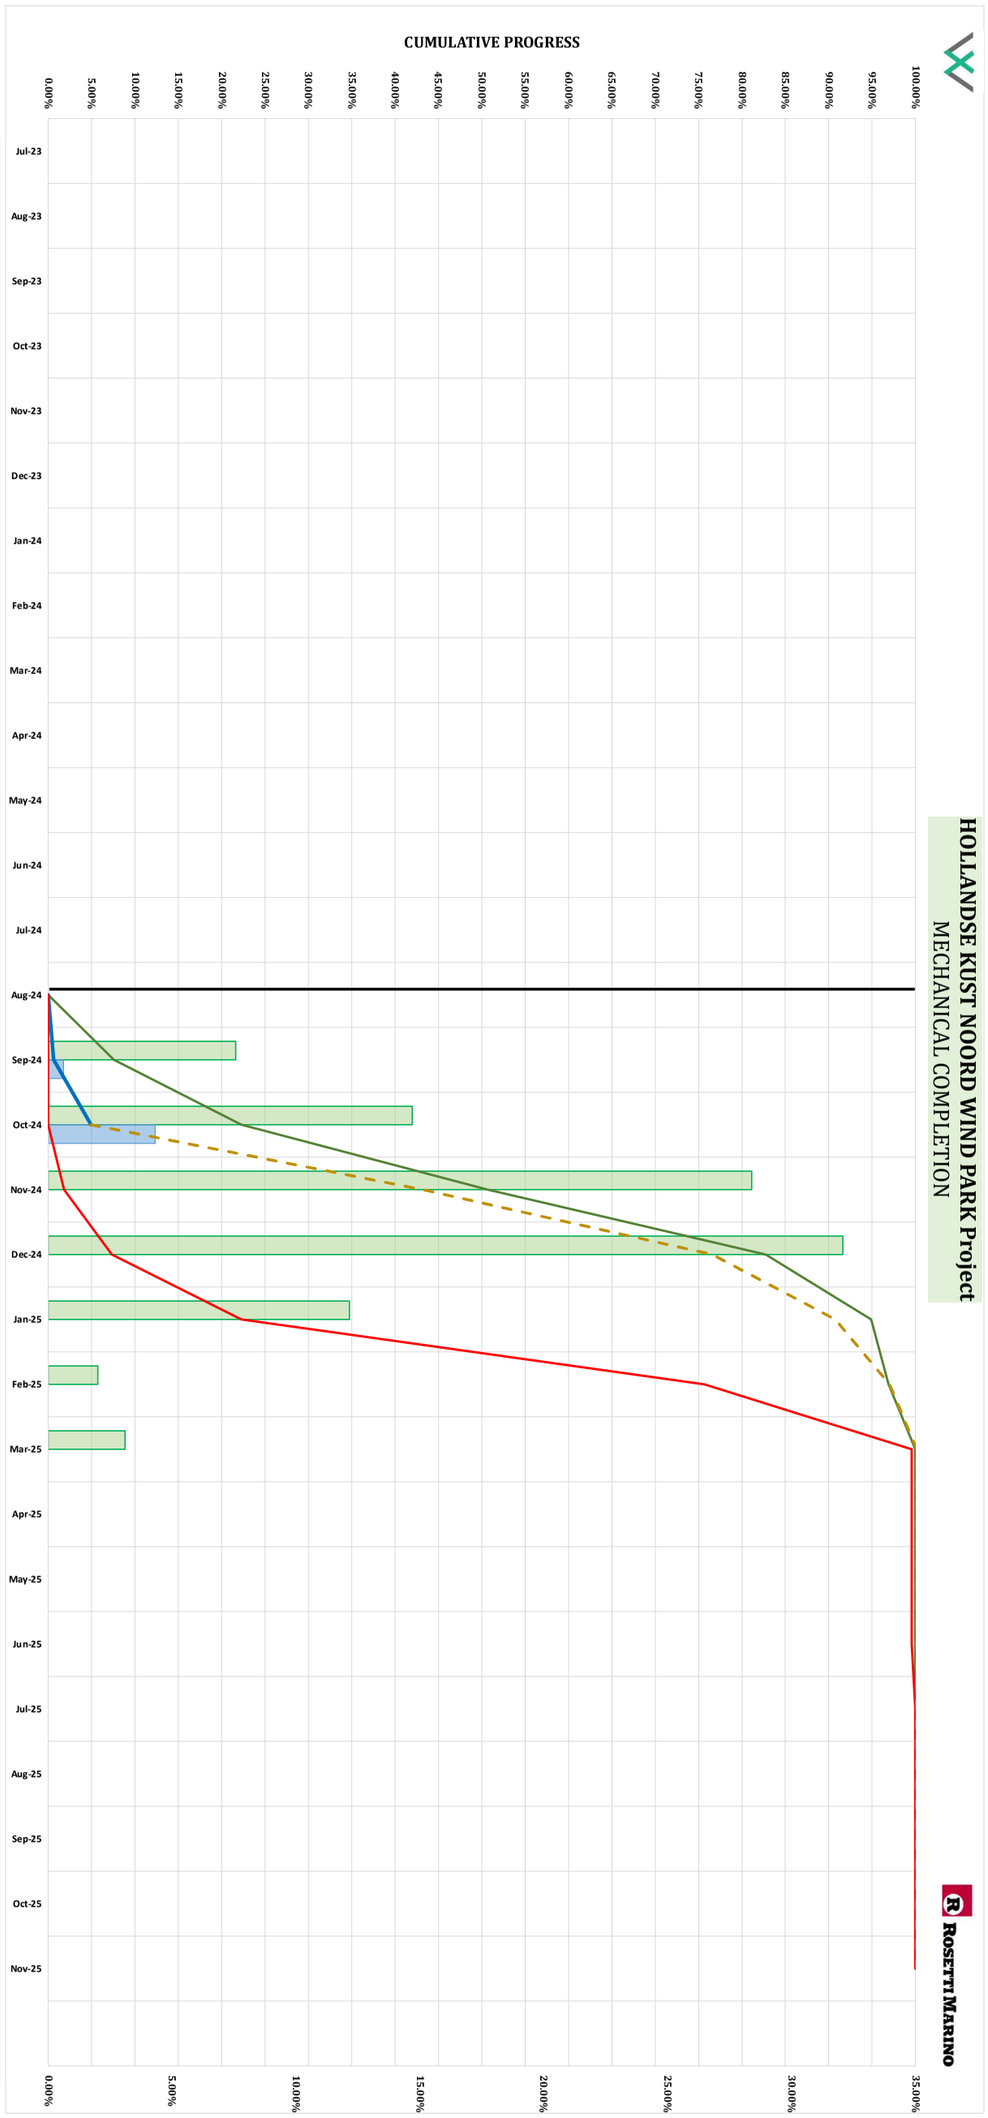

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
MECHANICAL COMPLETION

ROSETTI MARINO
