
HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

PROCUREMENT OVERALL

ROSETTI MARINO

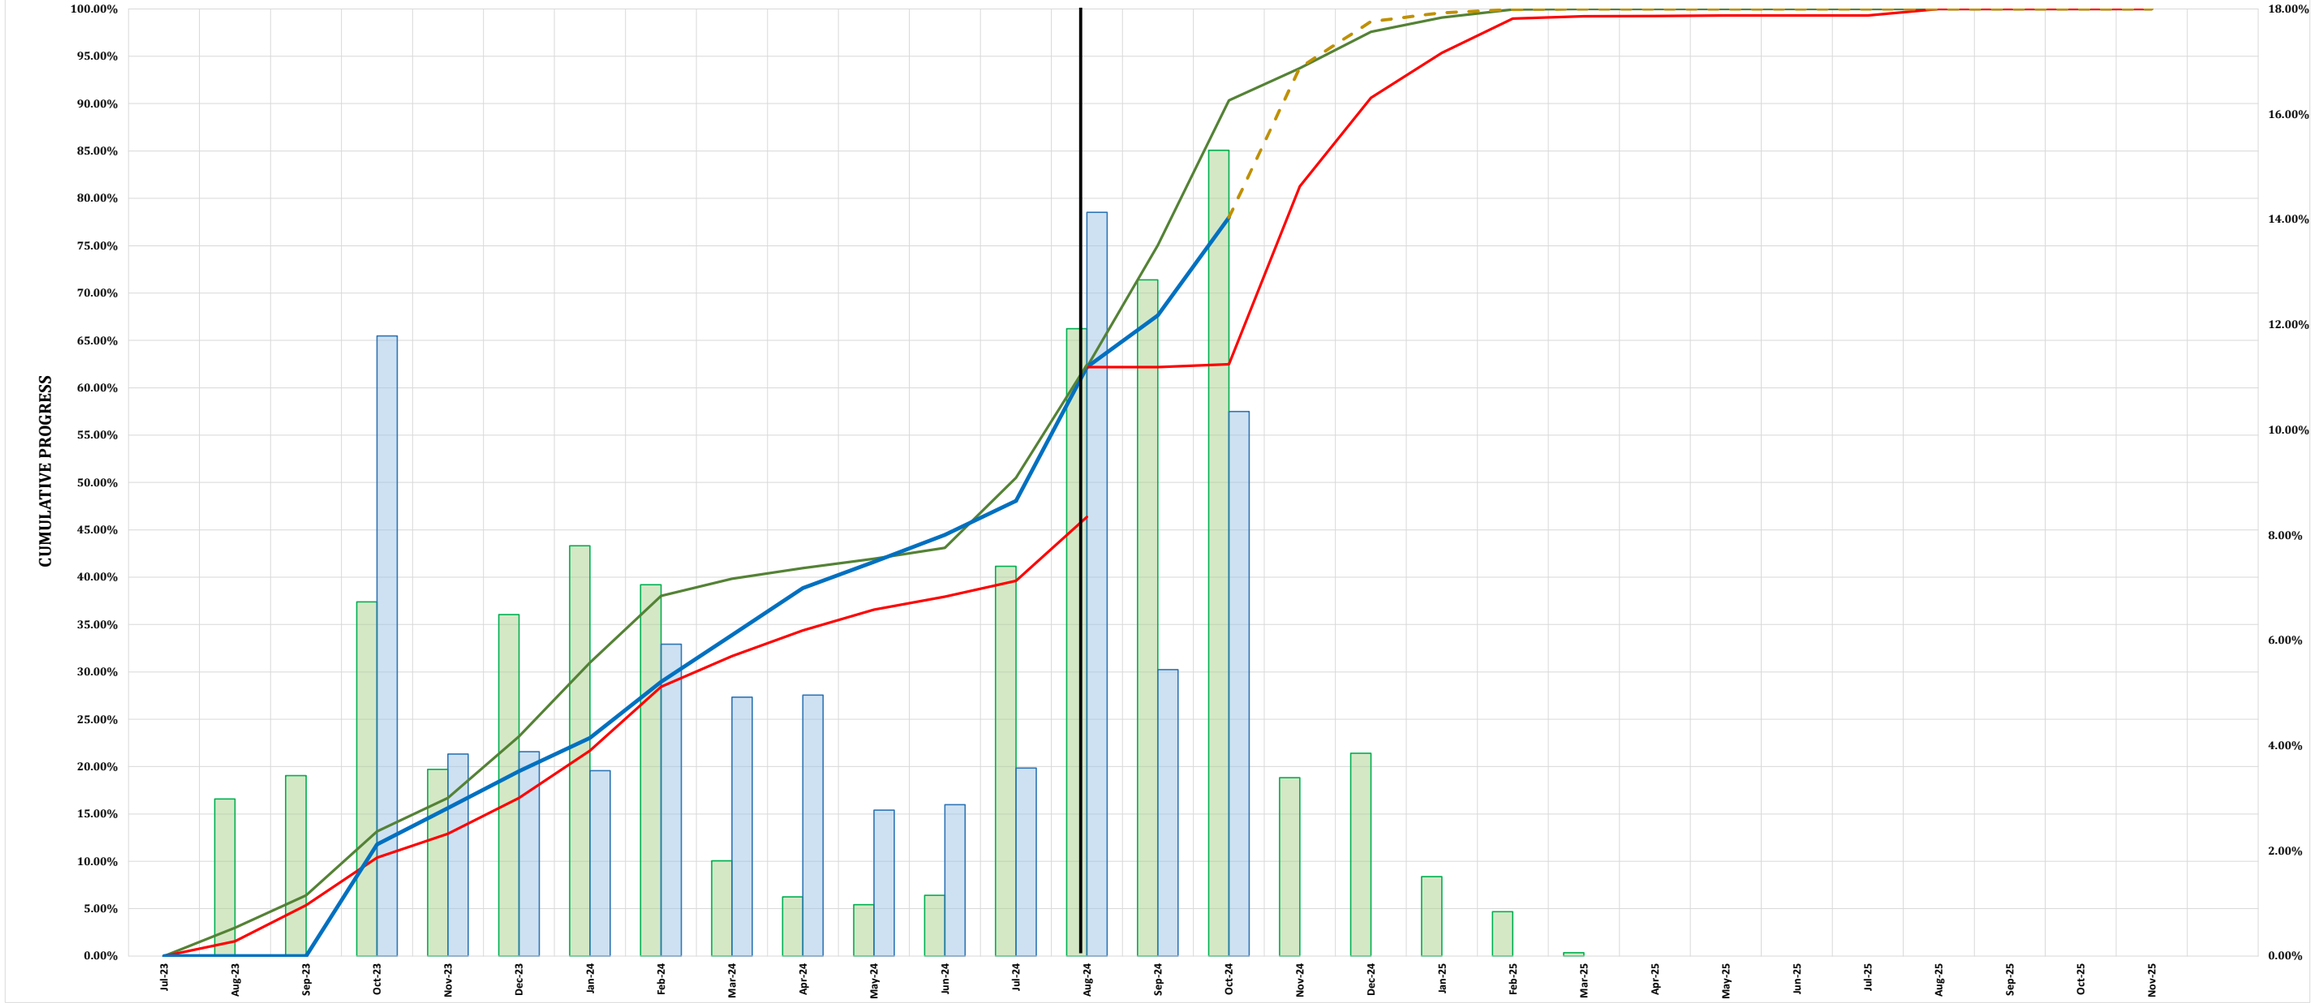


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														62.18%	75.03%	90.35%	93.74%	97.59%	99.10%	99.94%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														62.18%	62.18%	62.47%	81.26%	90.61%	95.37%	98.97%	99.21%	99.26%	99.29%	99.29%	99.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													48.05%	62.18%	67.63%	77.98%													
PERIOD PLANNED		2.98%	3.43%	6.73%	3.55%	6.49%	7.79%	7.06%	1.81%	1.12%	0.98%	1.15%	7.41%	11.93%	12.85%	15.32%	3.39%	3.85%	1.51%	0.84%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	11.78%	3.84%	3.88%	3.52%	5.93%	4.92%	4.96%	2.77%	2.88%	3.57%	14.13%	5.44%	10.35%													
FORECAST																77.98%	93.81%	98.66%	99.60%	99.94%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

EQUIPMENT

ROSETTI MARINO

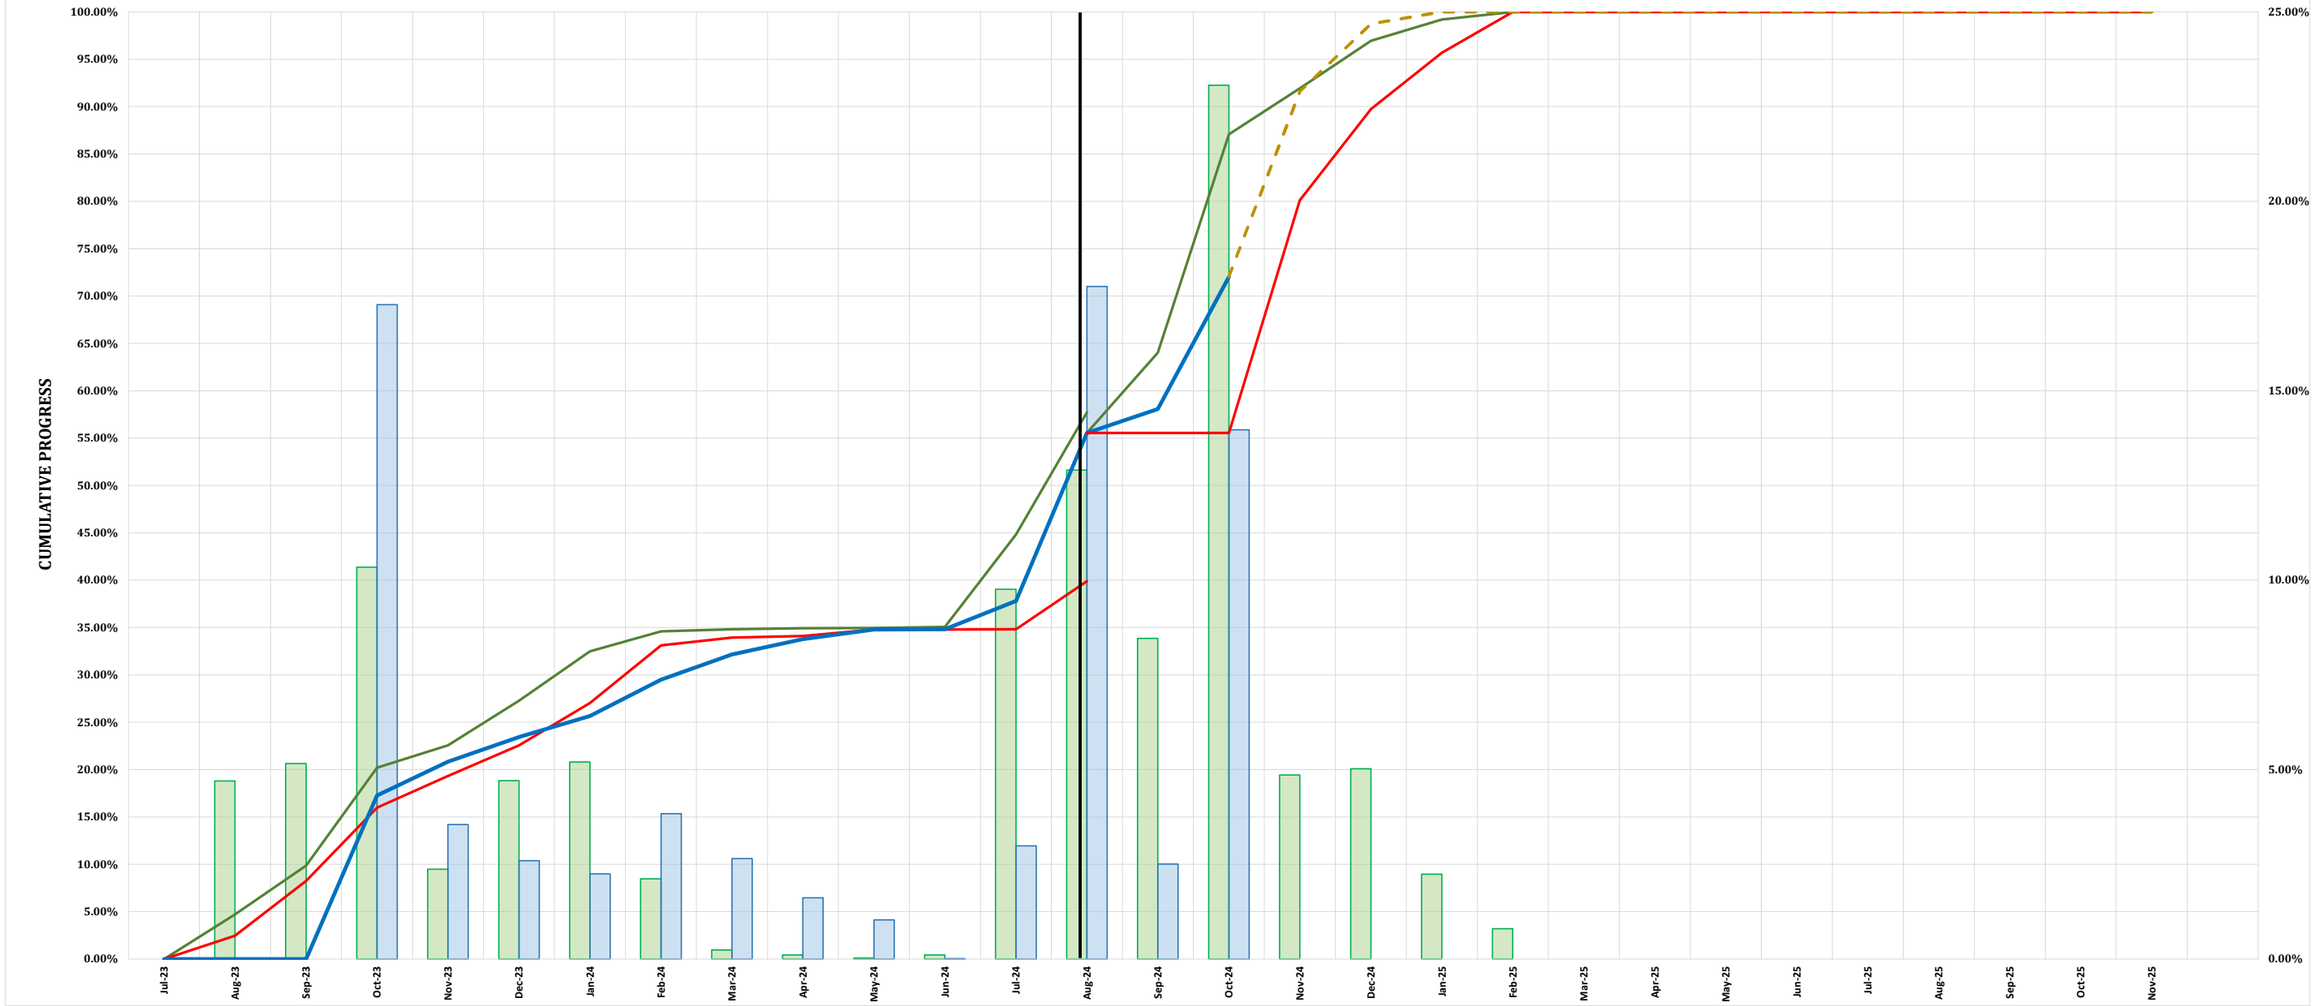


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														55.55%	64.01%	87.08%	91.94%	96.96%	99.20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														55.55%	55.55%	55.55%	80.12%	89.74%	95.70%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													37.80%	55.55%	58.06%	72.03%													
PERIOD PLANNED		4.70%	5.16%	10.34%	2.37%	4.70%	5.20%	2.12%	0.24%	0.10%	0.03%	0.10%	9.76%	12.90%	8.46%	23.07%	4.86%	5.02%	2.24%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	17.28%	3.55%	2.60%	2.24%	3.84%	2.65%	1.61%	1.03%	0.01%	2.99%	17.76%	2.51%	13.97%													
FORECAST																72.03%	91.60%	98.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

BULK MATERIAL - STEEL

ROSETTI MARINO

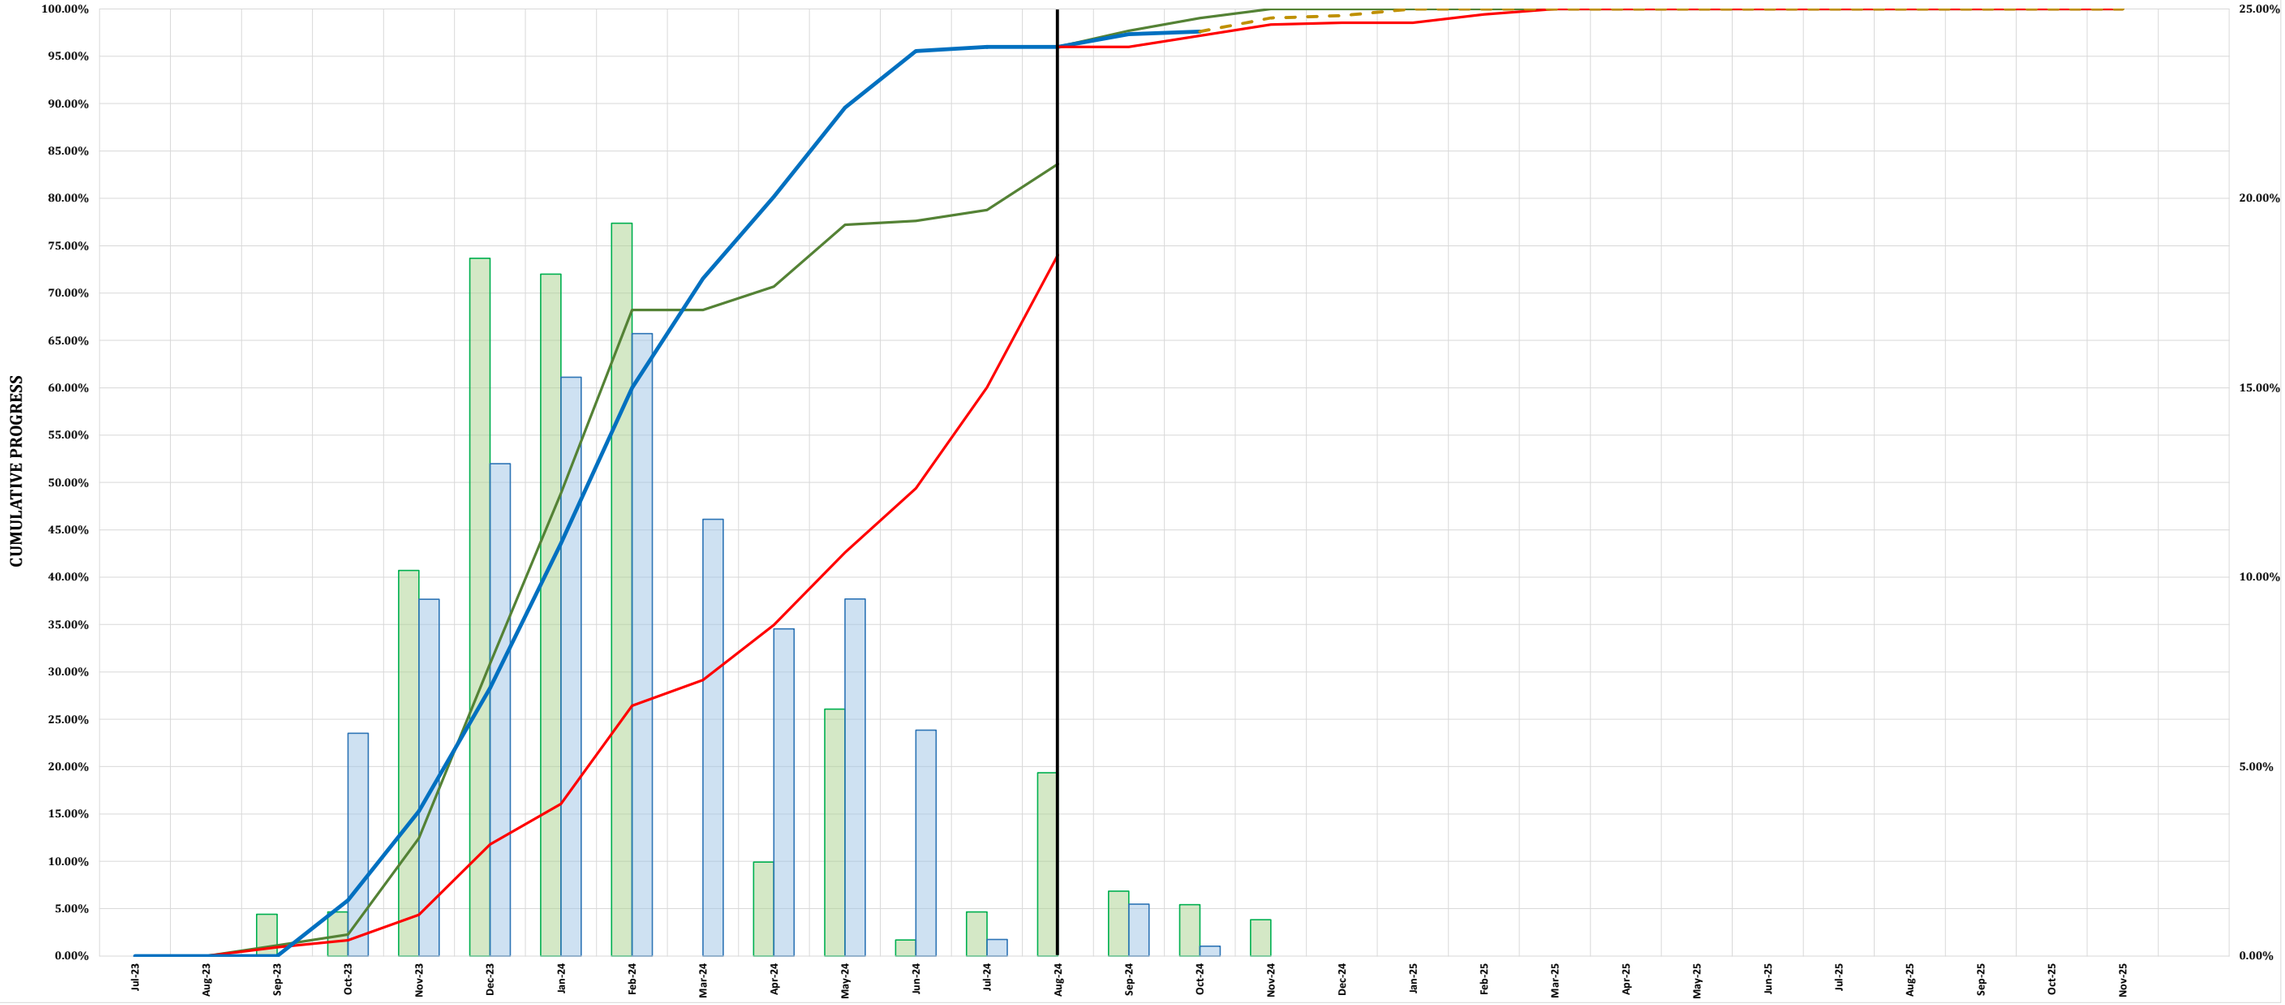


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														95.98%	97.69%	99.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														95.98%	95.98%	97.18%	98.34%	98.53%	98.53%	99.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													95.98%	95.98%	97.35%	97.60%													
PERIOD PLANNED		0.00%	1.10%	1.16%	10.18%	18.42%	18.00%	19.34%	0.00%	2.48%	6.52%	0.42%	1.16%	4.84%	1.71%	1.35%	0.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	5.88%	9.41%	13.00%	15.28%	16.43%	11.53%	8.63%	9.43%	5.96%	0.44%	0.00%	1.37%	0.26%													
FORECAST																97.60%	99.05%	99.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

BULK MATERIAL - PIPING & VALVES

ROSETTI MARINO

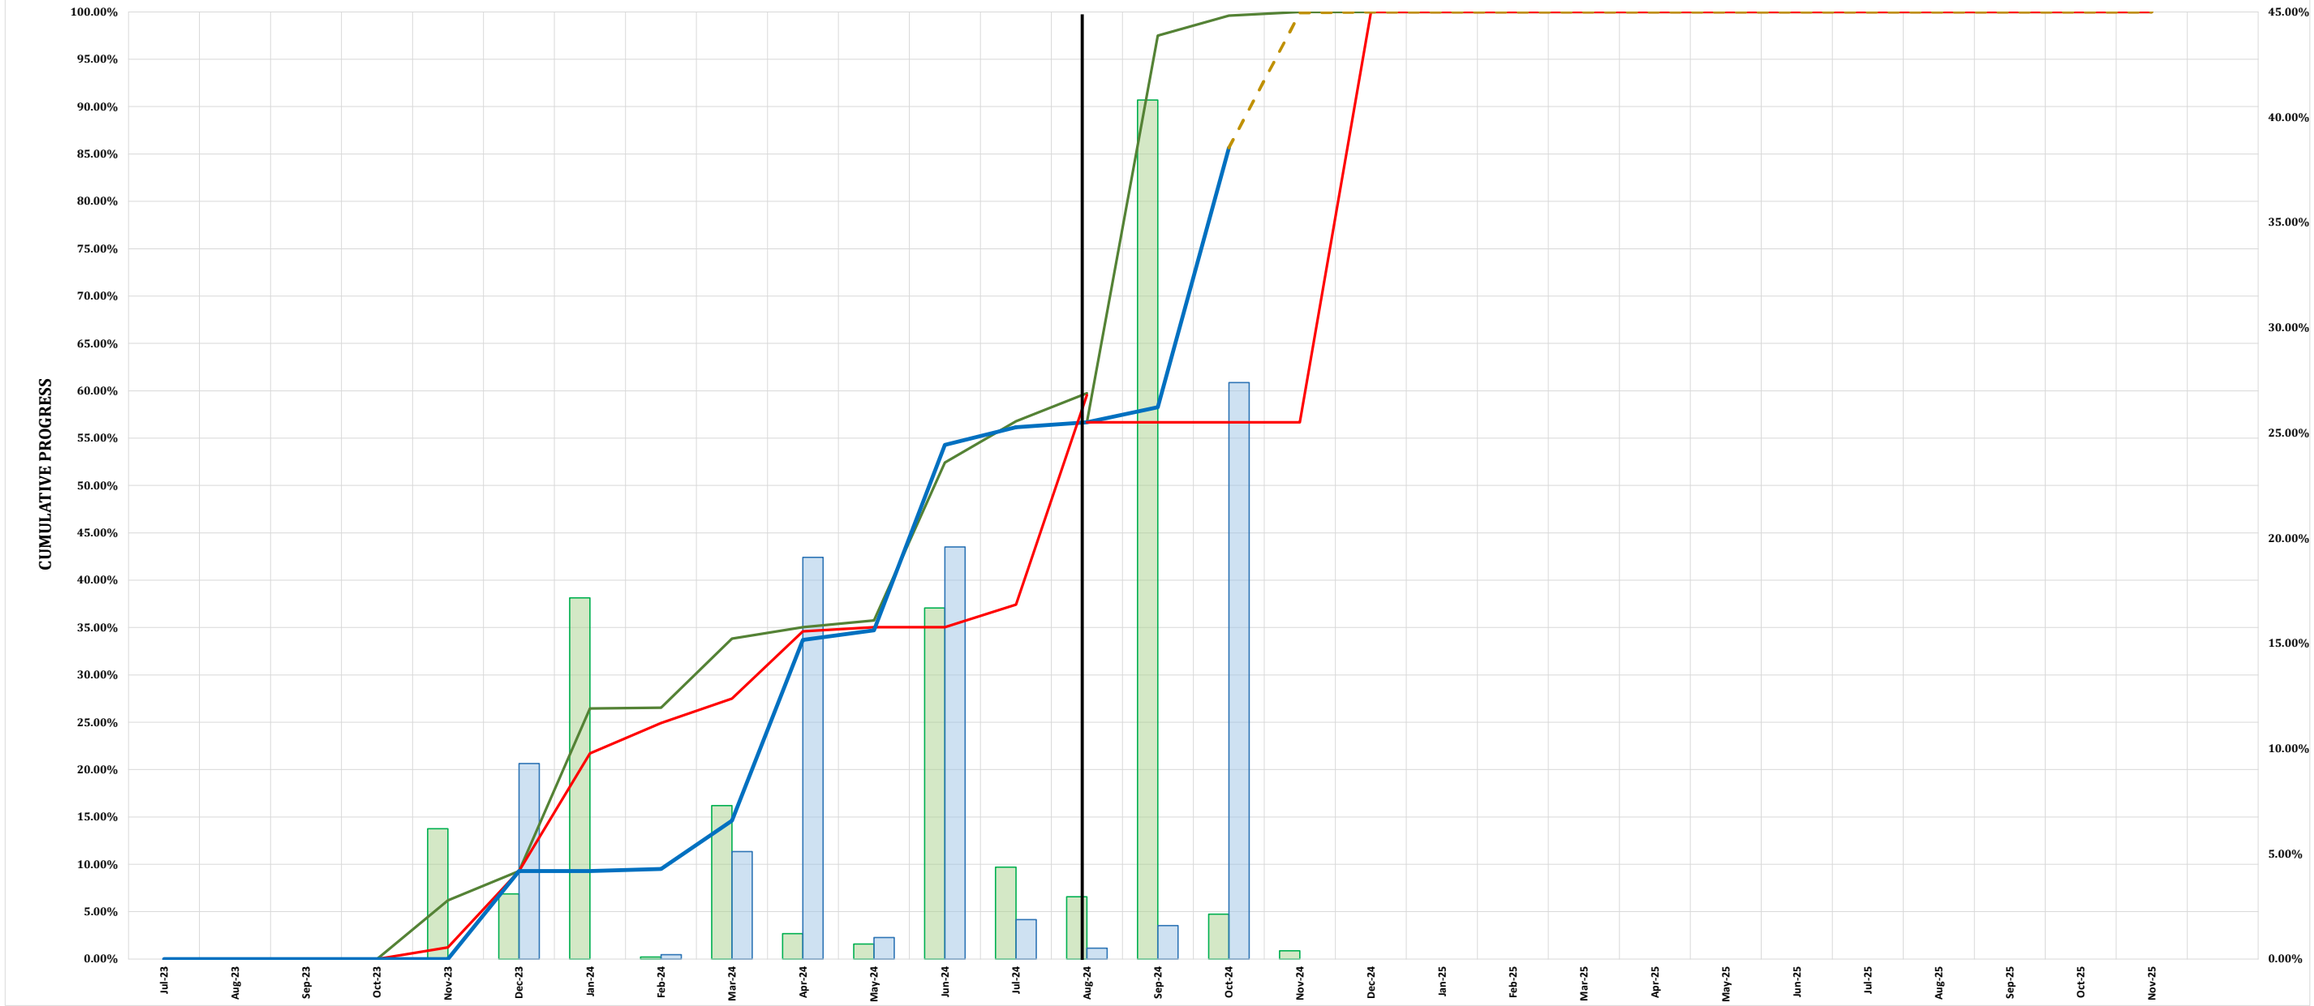


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														56.67%	97.49%	99.61%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														56.67%	56.67%	56.67%	56.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													56.15%	56.67%	58.26%	85.65%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	6.19%	3.10%	17.15%	0.10%	7.29%	1.21%	0.71%	16.67%	4.36%	2.96%	40.81%	2.13%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.29%	0.00%	0.21%	5.11%	19.08%	1.02%	19.58%	1.87%	0.52%	1.59%	27.39%													
FORECAST																85.65%	99.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

BULK MATERIAL - ELECTRICAL, INSTRUMENTATION & CONTROL

ROSETTI MARINO

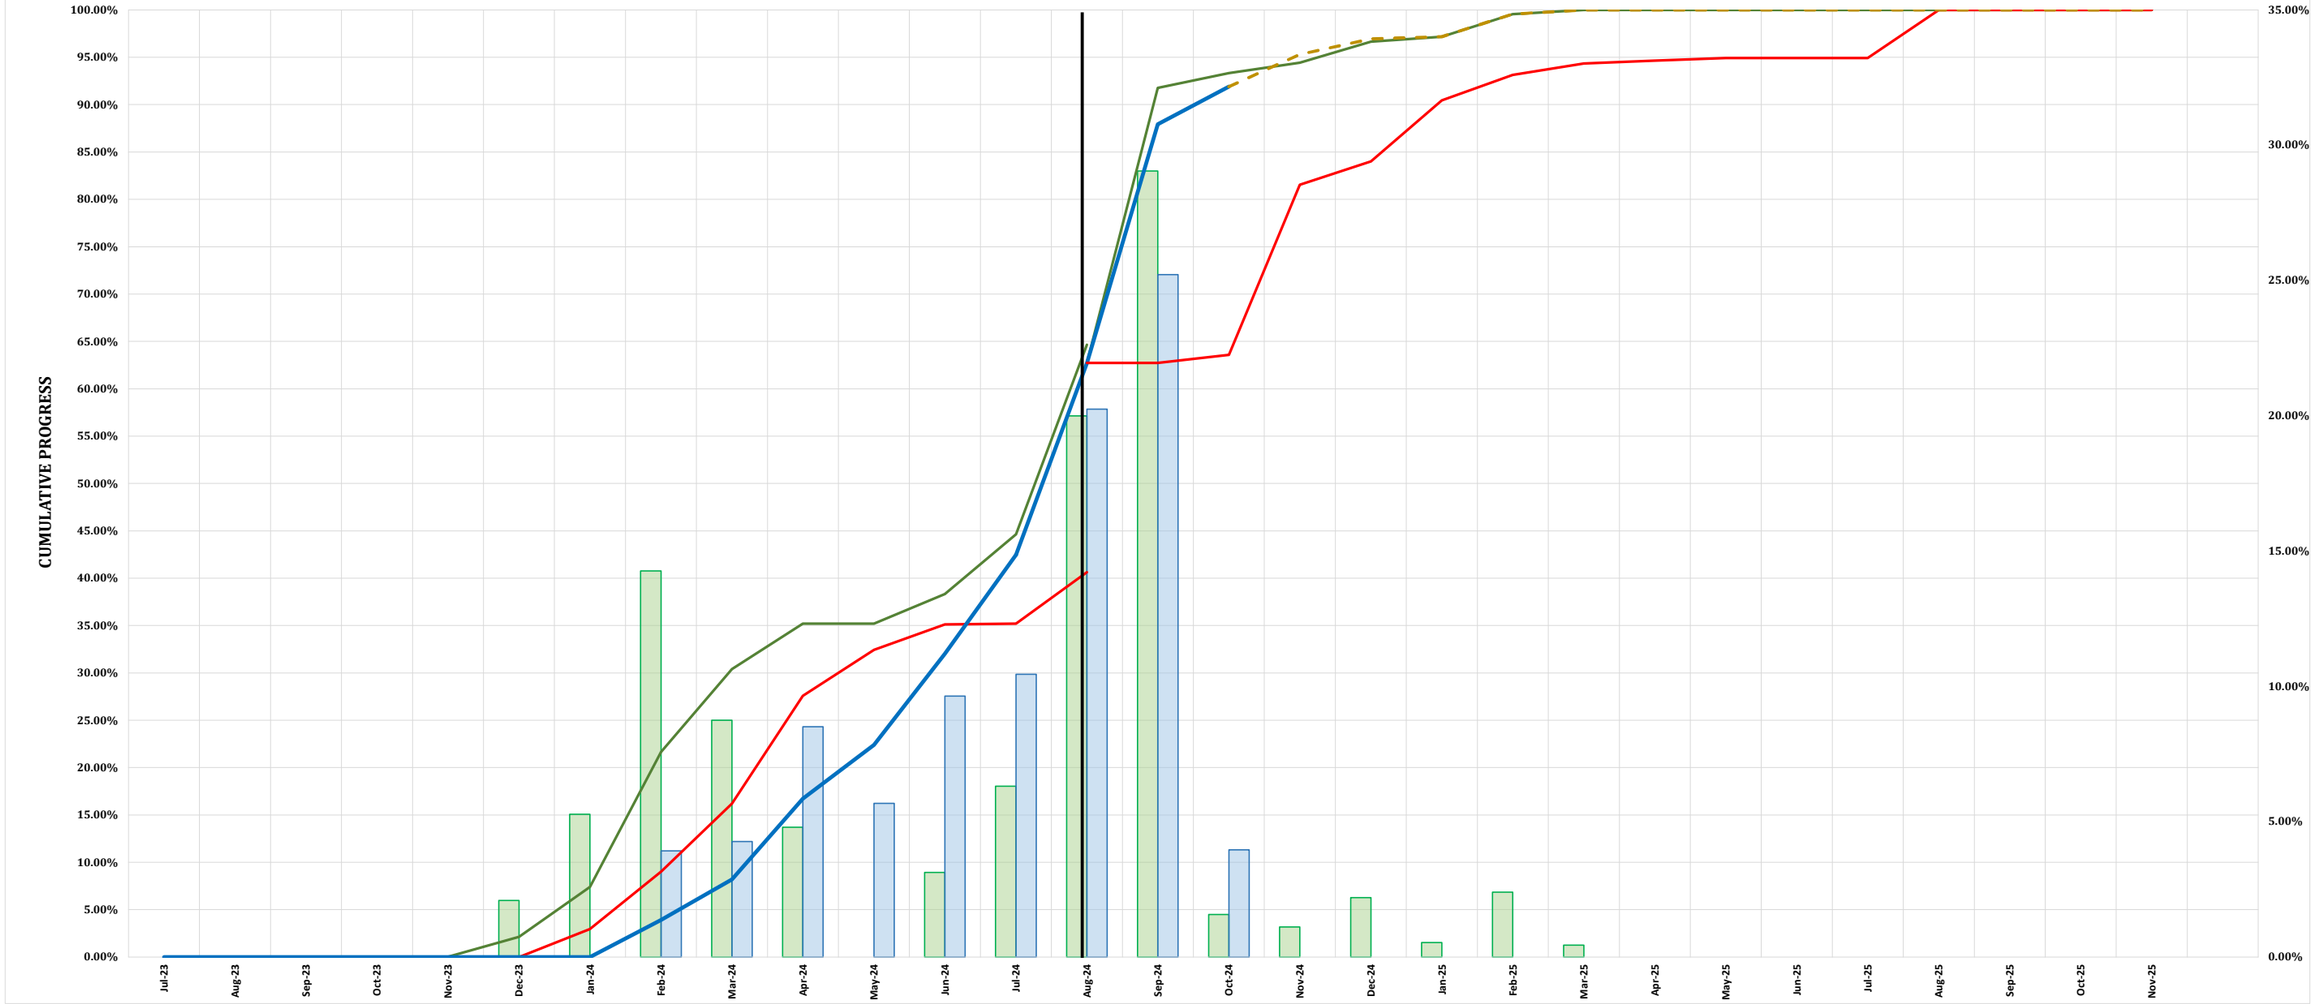


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														62.72%	91.76%	93.33%	94.44%	96.64%	97.17%	99.56%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														62.72%	62.72%	63.59%	81.55%	84.00%	90.46%	93.14%	94.34%	94.65%	94.92%	94.92%	94.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													42.47%	62.72%	87.94%	91.90%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	2.09%	5.27%	14.27%	8.75%	4.79%	0.00%	3.13%	6.32%	20.00%	29.05%	1.57%	1.11%	2.20%	0.54%	2.39%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.92%	4.27%	8.51%	5.68%	9.64%	10.45%	20.25%	25.22%	3.96%													
FORECAST																91.90%	95.30%	96.94%	97.17%	99.56%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

BULK MATERIAL - INSULATION & COATING

ROSETTI MARINO

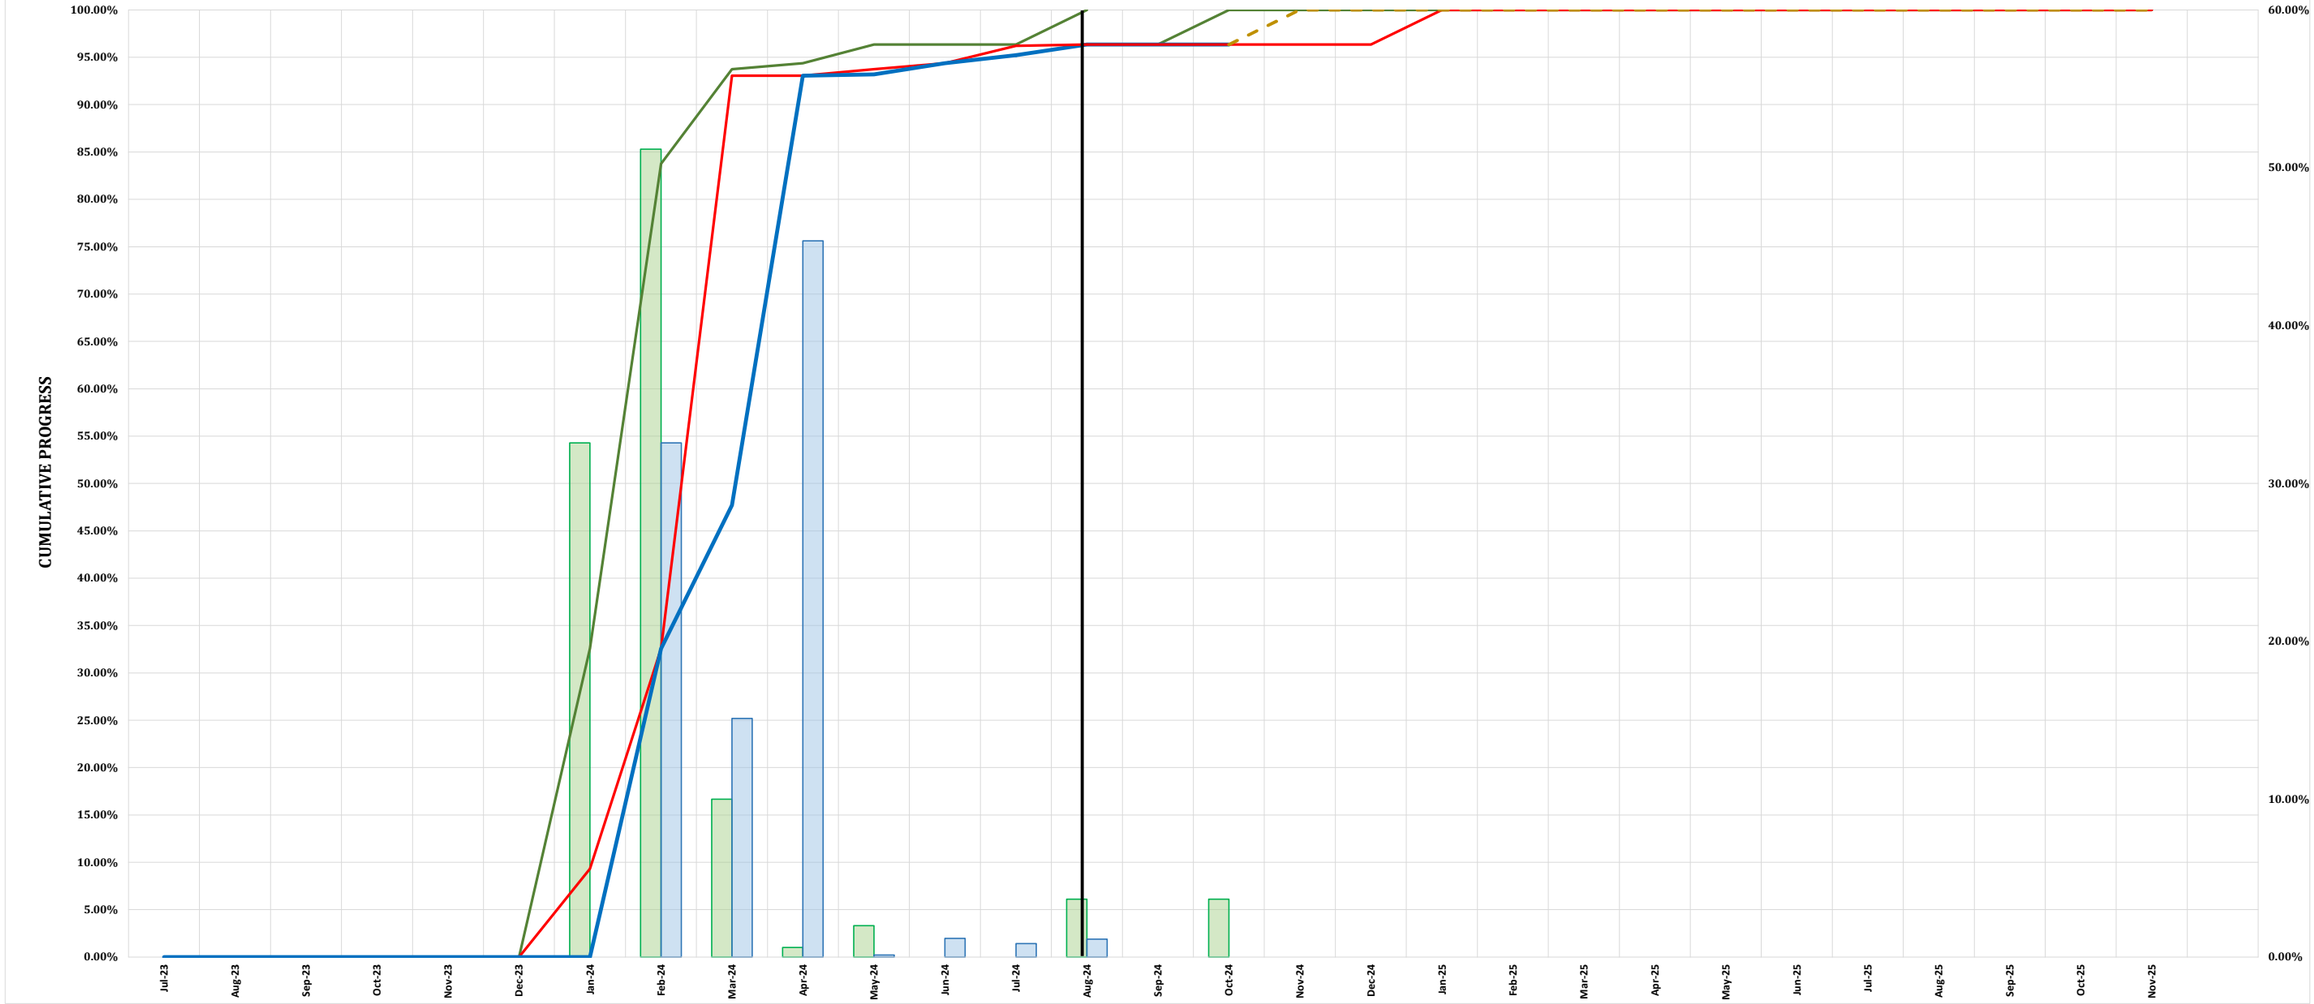


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														96.34%	96.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														96.34%	96.34%	96.34%	96.34%	96.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													95.22%	96.34%	96.34%	96.34%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.57%	51.18%	10.00%	0.61%	1.98%	0.00%	0.00%	3.66%	0.00%	3.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.57%	15.12%	45.37%	0.13%	1.18%	0.84%	1.13%	0.00%	0.00%													
FORECAST																96.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

ALL OTHER MATERIAL

ROSETTI MARINO

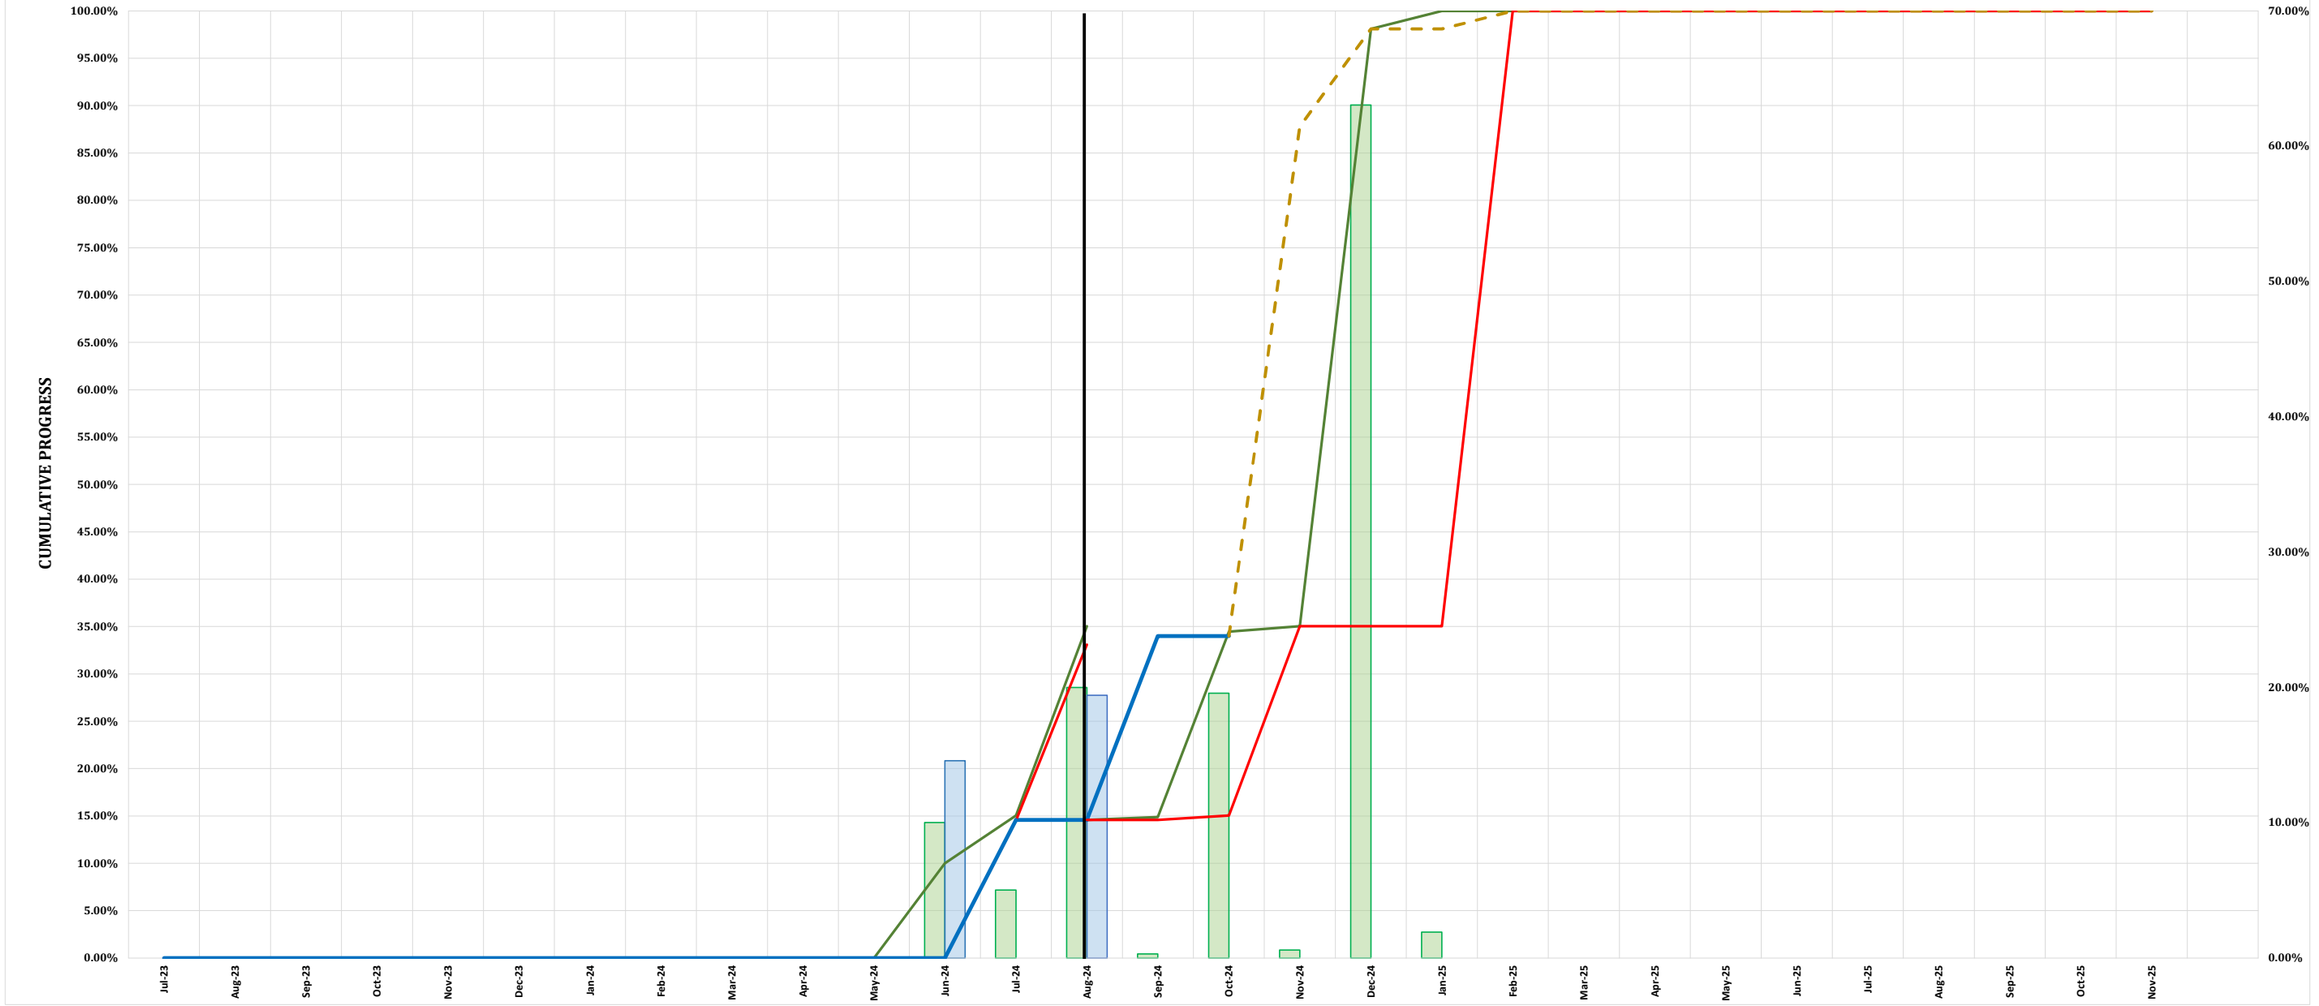


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														14.58%	14.88%	34.46%	35.04%	98.09%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														14.58%	14.58%	15.04%	35.04%	35.04%	35.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													14.58%	14.58%	34.00%	34.00%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.01%	5.03%	20.00%	0.30%	19.58%	0.58%	63.05%	1.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.58%	0.00%	19.42%	0.00%													
FORECAST																34.00%	87.80%	98.09%	98.09%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

OPTION

ROSETTI MARINO

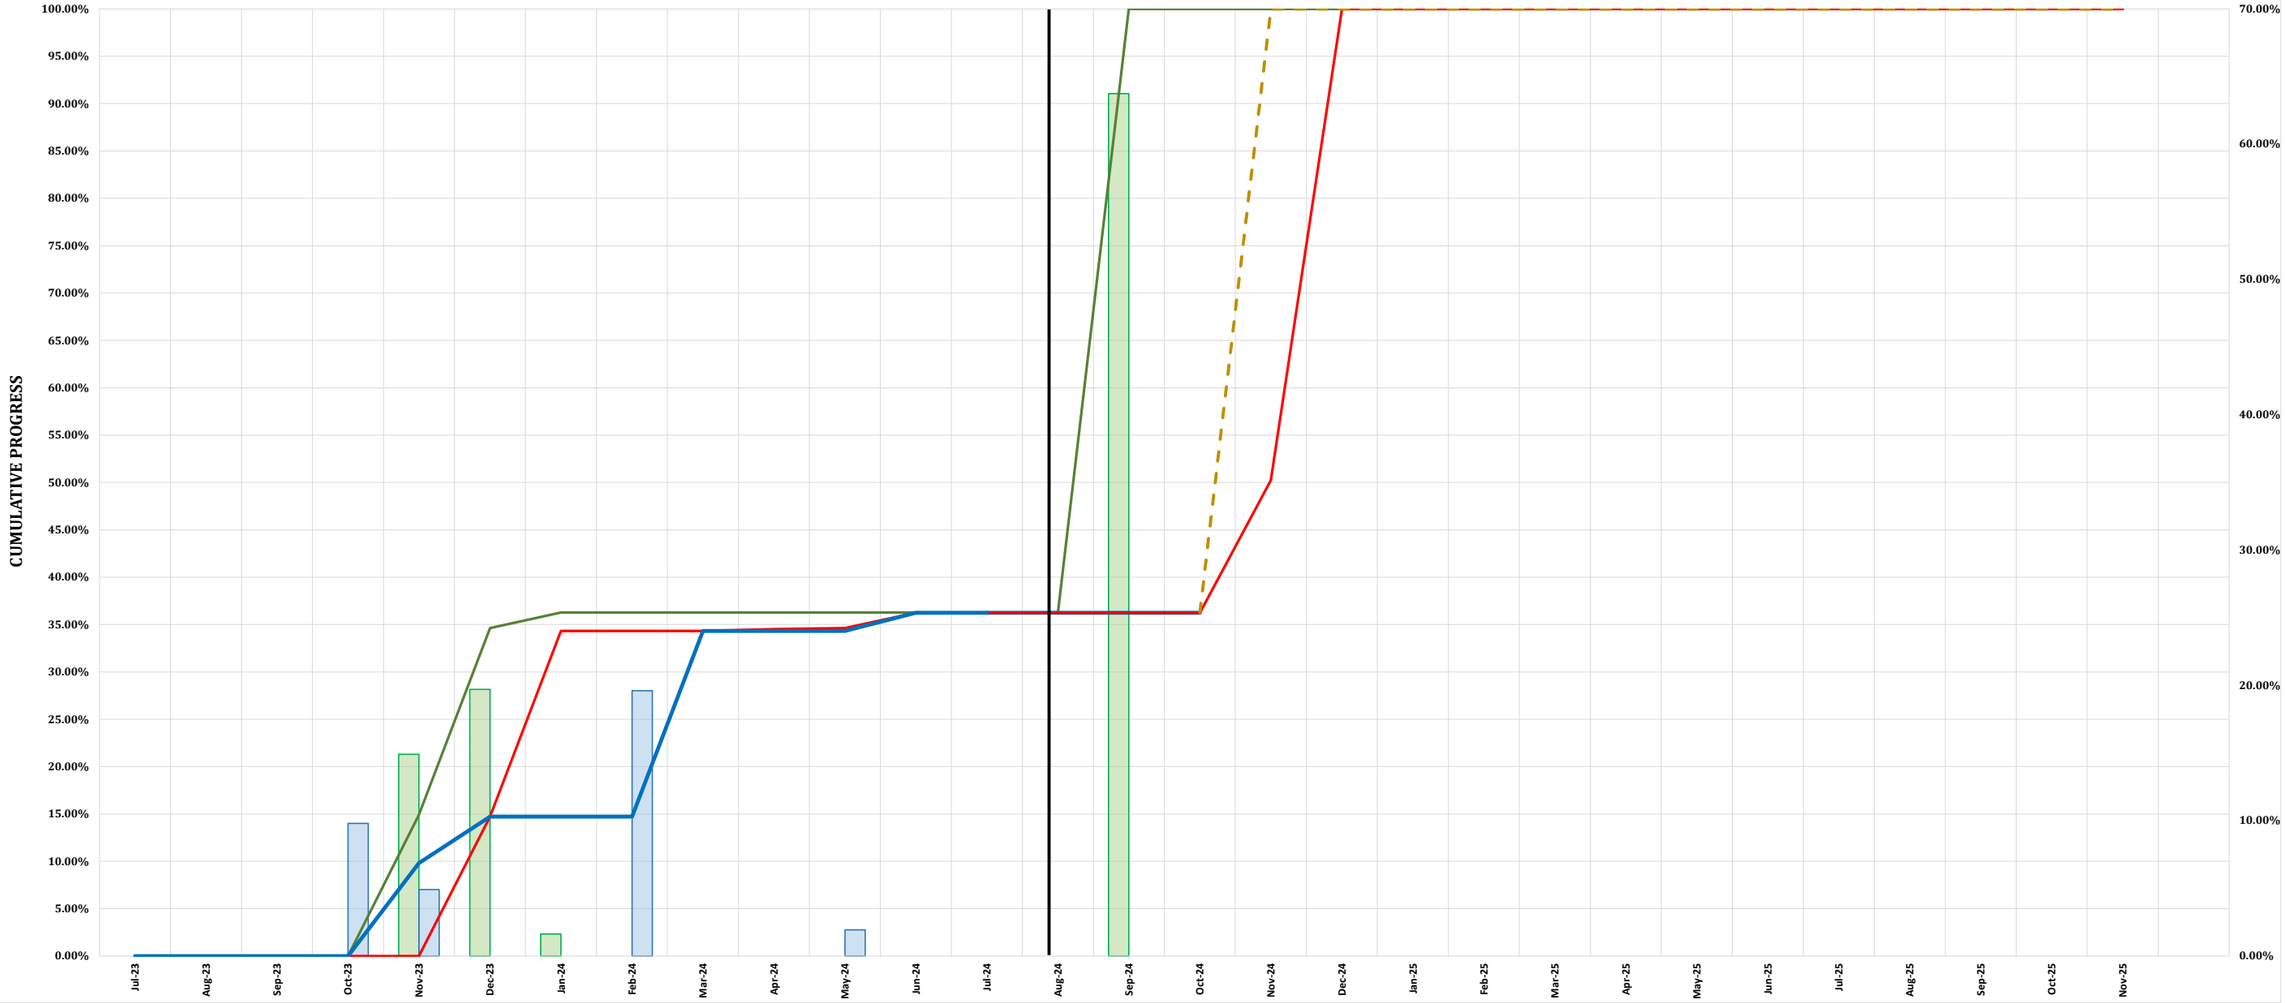

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														36.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														36.25%	36.25%	36.25%	50.24%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													36.25%	36.25%	36.25%	36.25%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	14.91%	19.72%	1.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	9.81%	4.90%	0.00%	0.00%	19.62%	0.00%	0.00%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													
FORECAST																36.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
