
HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

BASE LOAD POWER HUB OVERALL PROJECT

ROSETTI MARINO

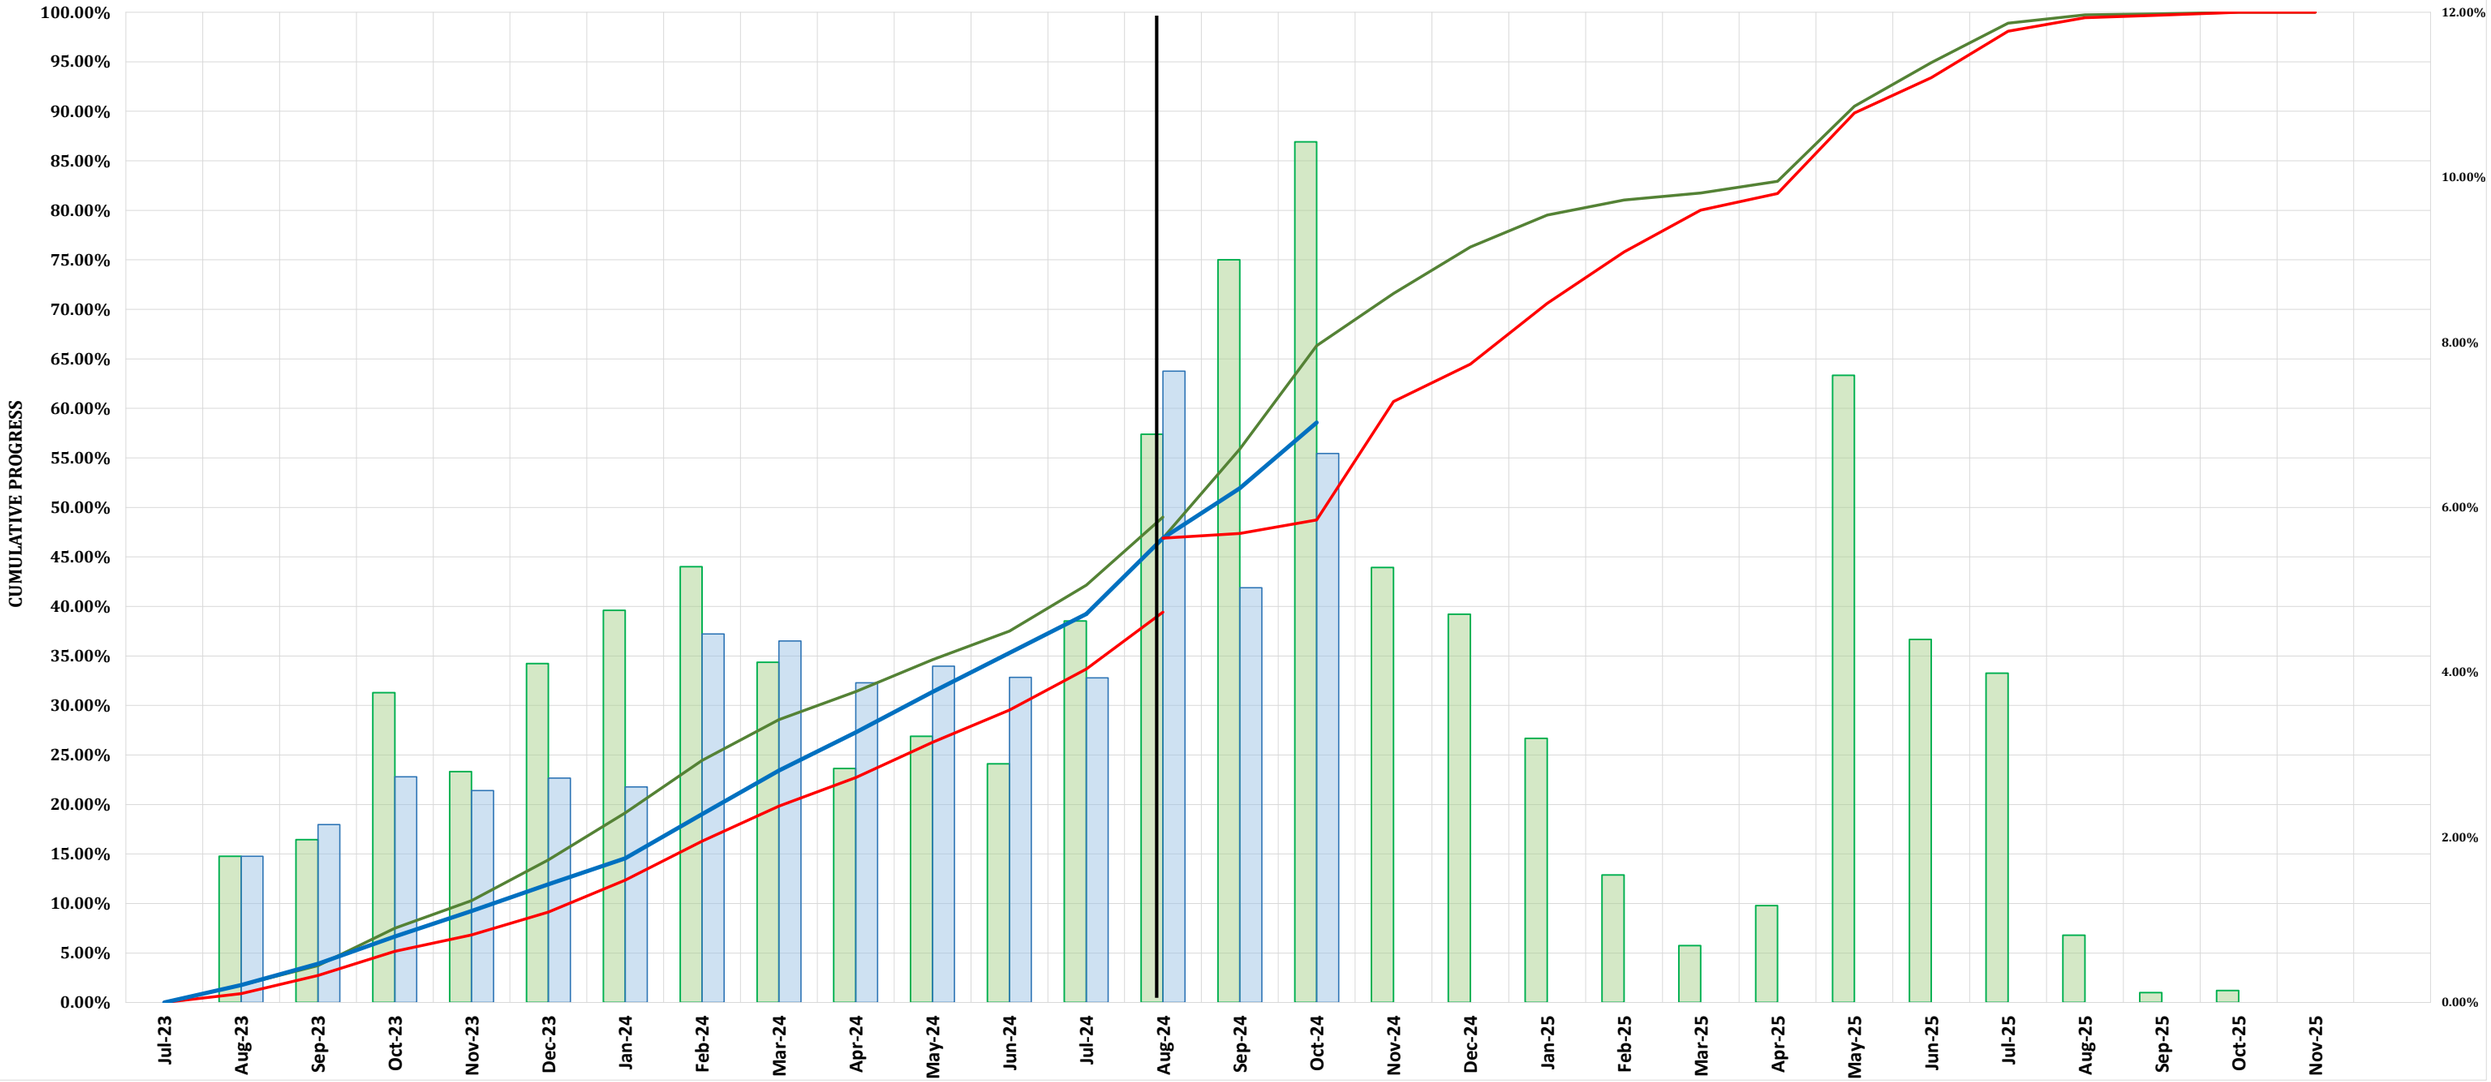


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														46.90%	55.90%	66.33%	71.60%	76.31%	79.51%	81.05%	81.75%	82.92%	90.52%	94.92%	98.92%	99.73%	99.85%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														46.90%	47.38%	48.74%	60.69%	64.47%	70.60%	75.80%	80.02%	81.70%	89.83%	93.40%	98.08%	99.44%	99.70%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													39.25%	46.90%	51.92%	58.58%													
PERIOD PLANNED		1.77%	1.97%	3.76%	2.80%	4.11%	4.75%	5.28%	4.13%	2.84%	3.23%	2.89%	4.62%	6.89%	9.00%	10.43%	5.27%	4.71%	3.20%	1.55%	0.69%	1.17%	7.60%	4.40%	3.99%	0.82%	0.12%	0.15%	0.00%
PERIOD ACTUAL		1.77%	2.16%	2.74%	2.57%	2.72%	2.61%	4.47%	4.38%	3.87%	4.08%	3.94%	3.94%	7.65%	5.03%	6.65%													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

ENGINEERING

ROSETTI MARINO

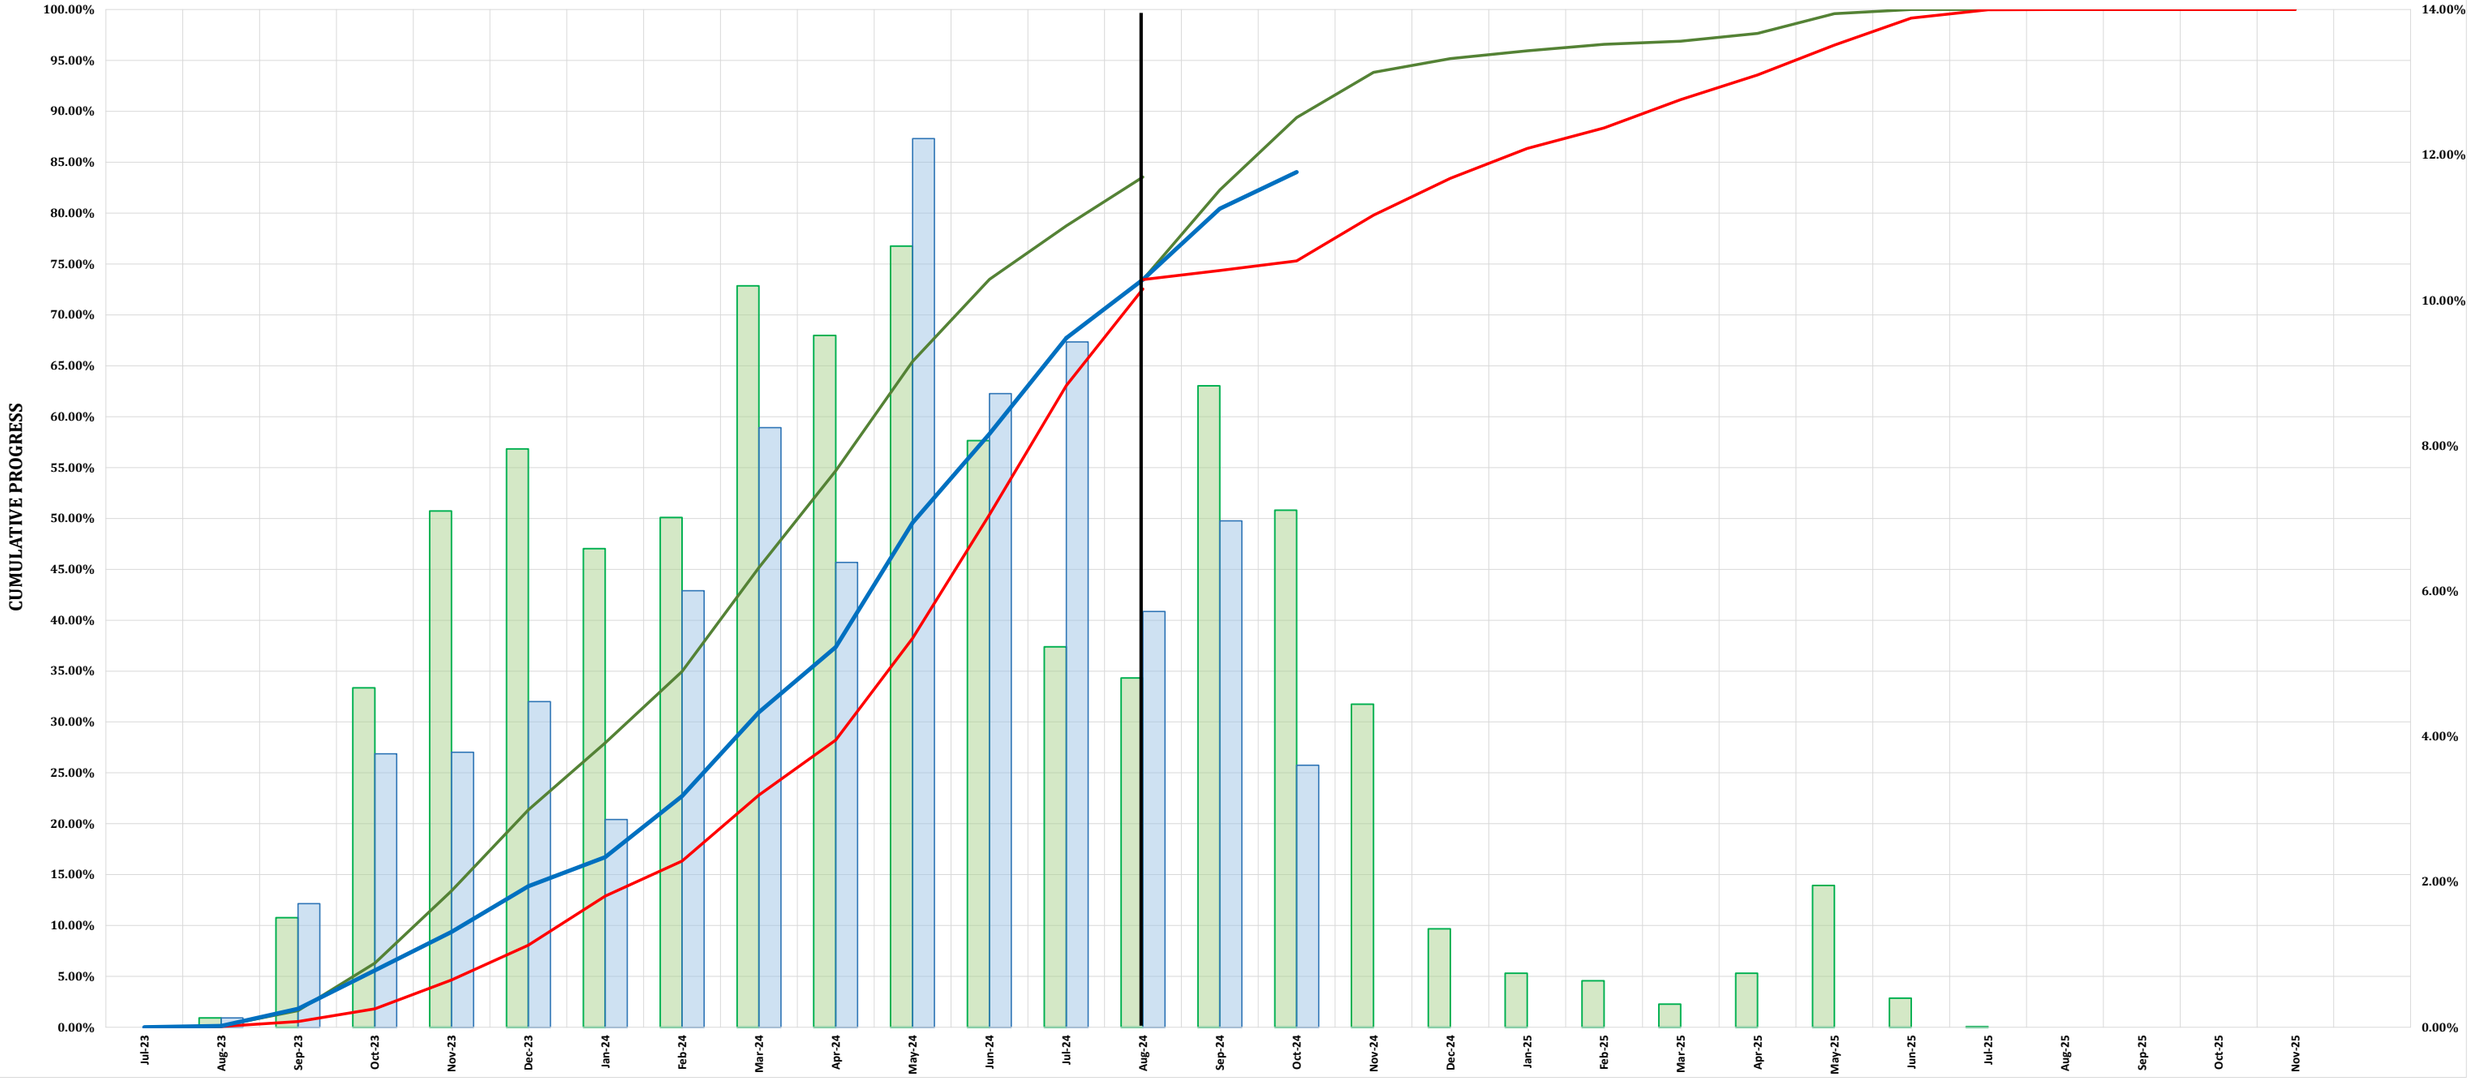


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														73.45%	82.28%	89.39%	93.84%	95.19%	95.94%	96.58%	96.90%	97.64%	99.59%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														73.45%	74.35%	75.30%	79.79%	83.43%	86.35%	88.38%	91.14%	93.58%	96.51%	99.16%	99.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													67.73%	73.45%	80.42%	84.03%													
PERIOD PLANNED		0.13%	1.51%	4.67%	7.10%	7.96%	6.58%	7.01%	10.20%	9.52%	10.75%	8.07%	5.24%	4.80%	8.82%	7.11%	4.45%	1.36%	0.74%	0.64%	0.32%	0.75%	1.95%	0.40%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.13%	1.70%	3.76%	3.78%	4.48%	2.86%	6.00%	8.25%	6.40%	12.22%	8.72%	9.43%	5.72%	6.97%	3.60%													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

PROCUREMENT

ROSETTI MARINO

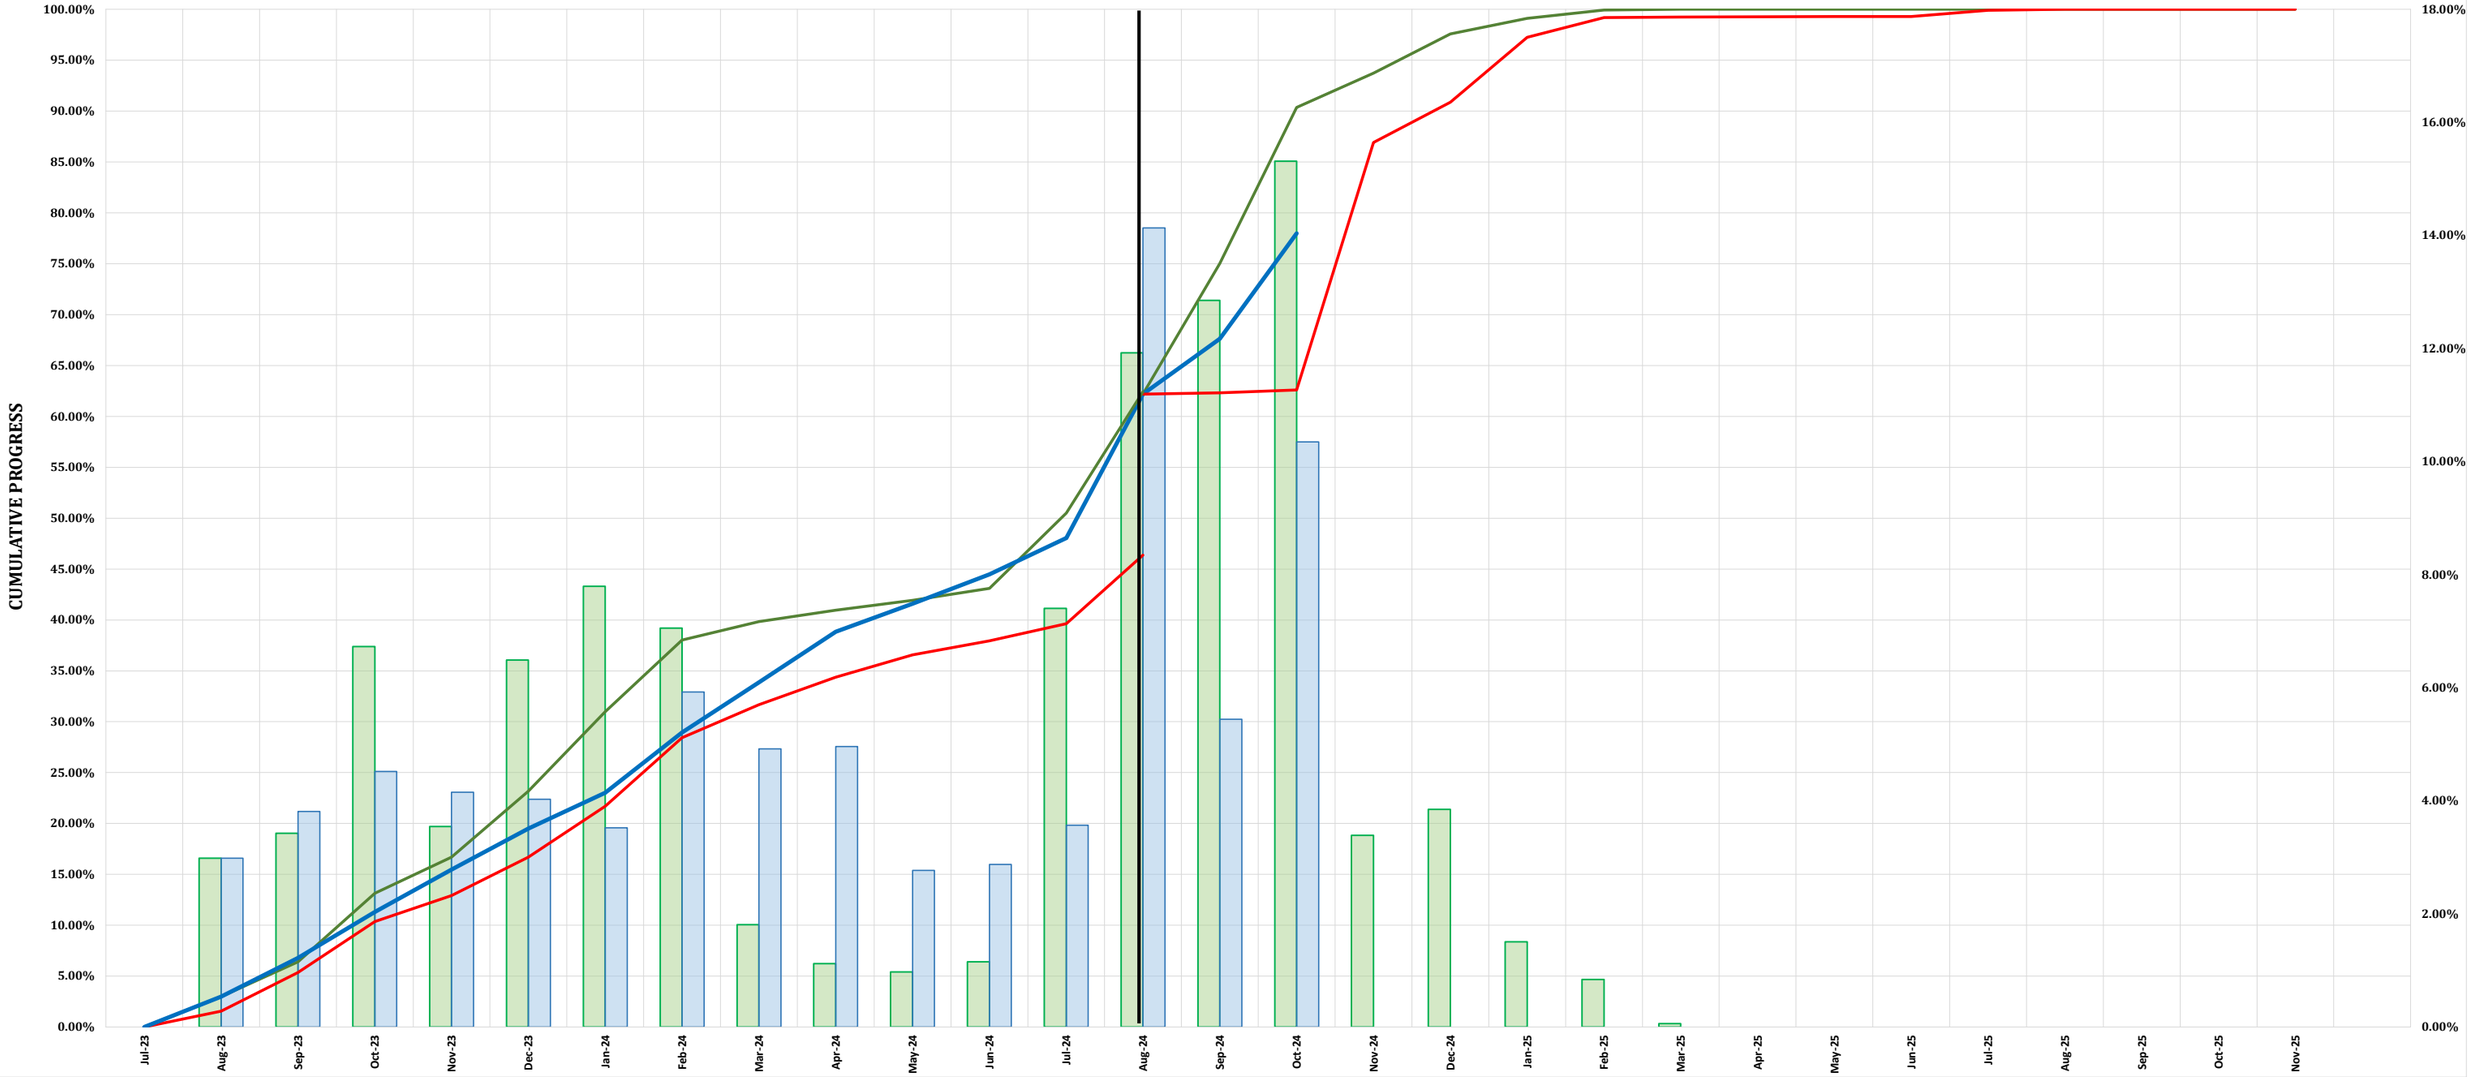


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														62.18%	75.03%	90.35%	93.74%	97.59%	99.10%	99.94%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														62.18%	62.31%	62.60%	86.91%	90.87%	97.25%	99.20%	99.25%	99.26%	99.29%	99.29%	99.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL													48.05%	62.18%	67.63%	77.98%													
PERIOD PLANNED		2.98%	3.43%	6.73%	3.55%	6.49%	7.79%	7.06%	1.81%	1.12%	0.98%	1.15%	7.41%	11.93%	12.85%	15.32%	3.39%	3.85%	1.51%	0.84%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		2.98%	3.81%	4.52%	4.15%	4.03%	3.52%	5.93%	4.92%	4.96%	2.77%	2.88%	3.57%	14.13%	5.44%	10.35%													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

FABRICATION


ROSETTI MARINO

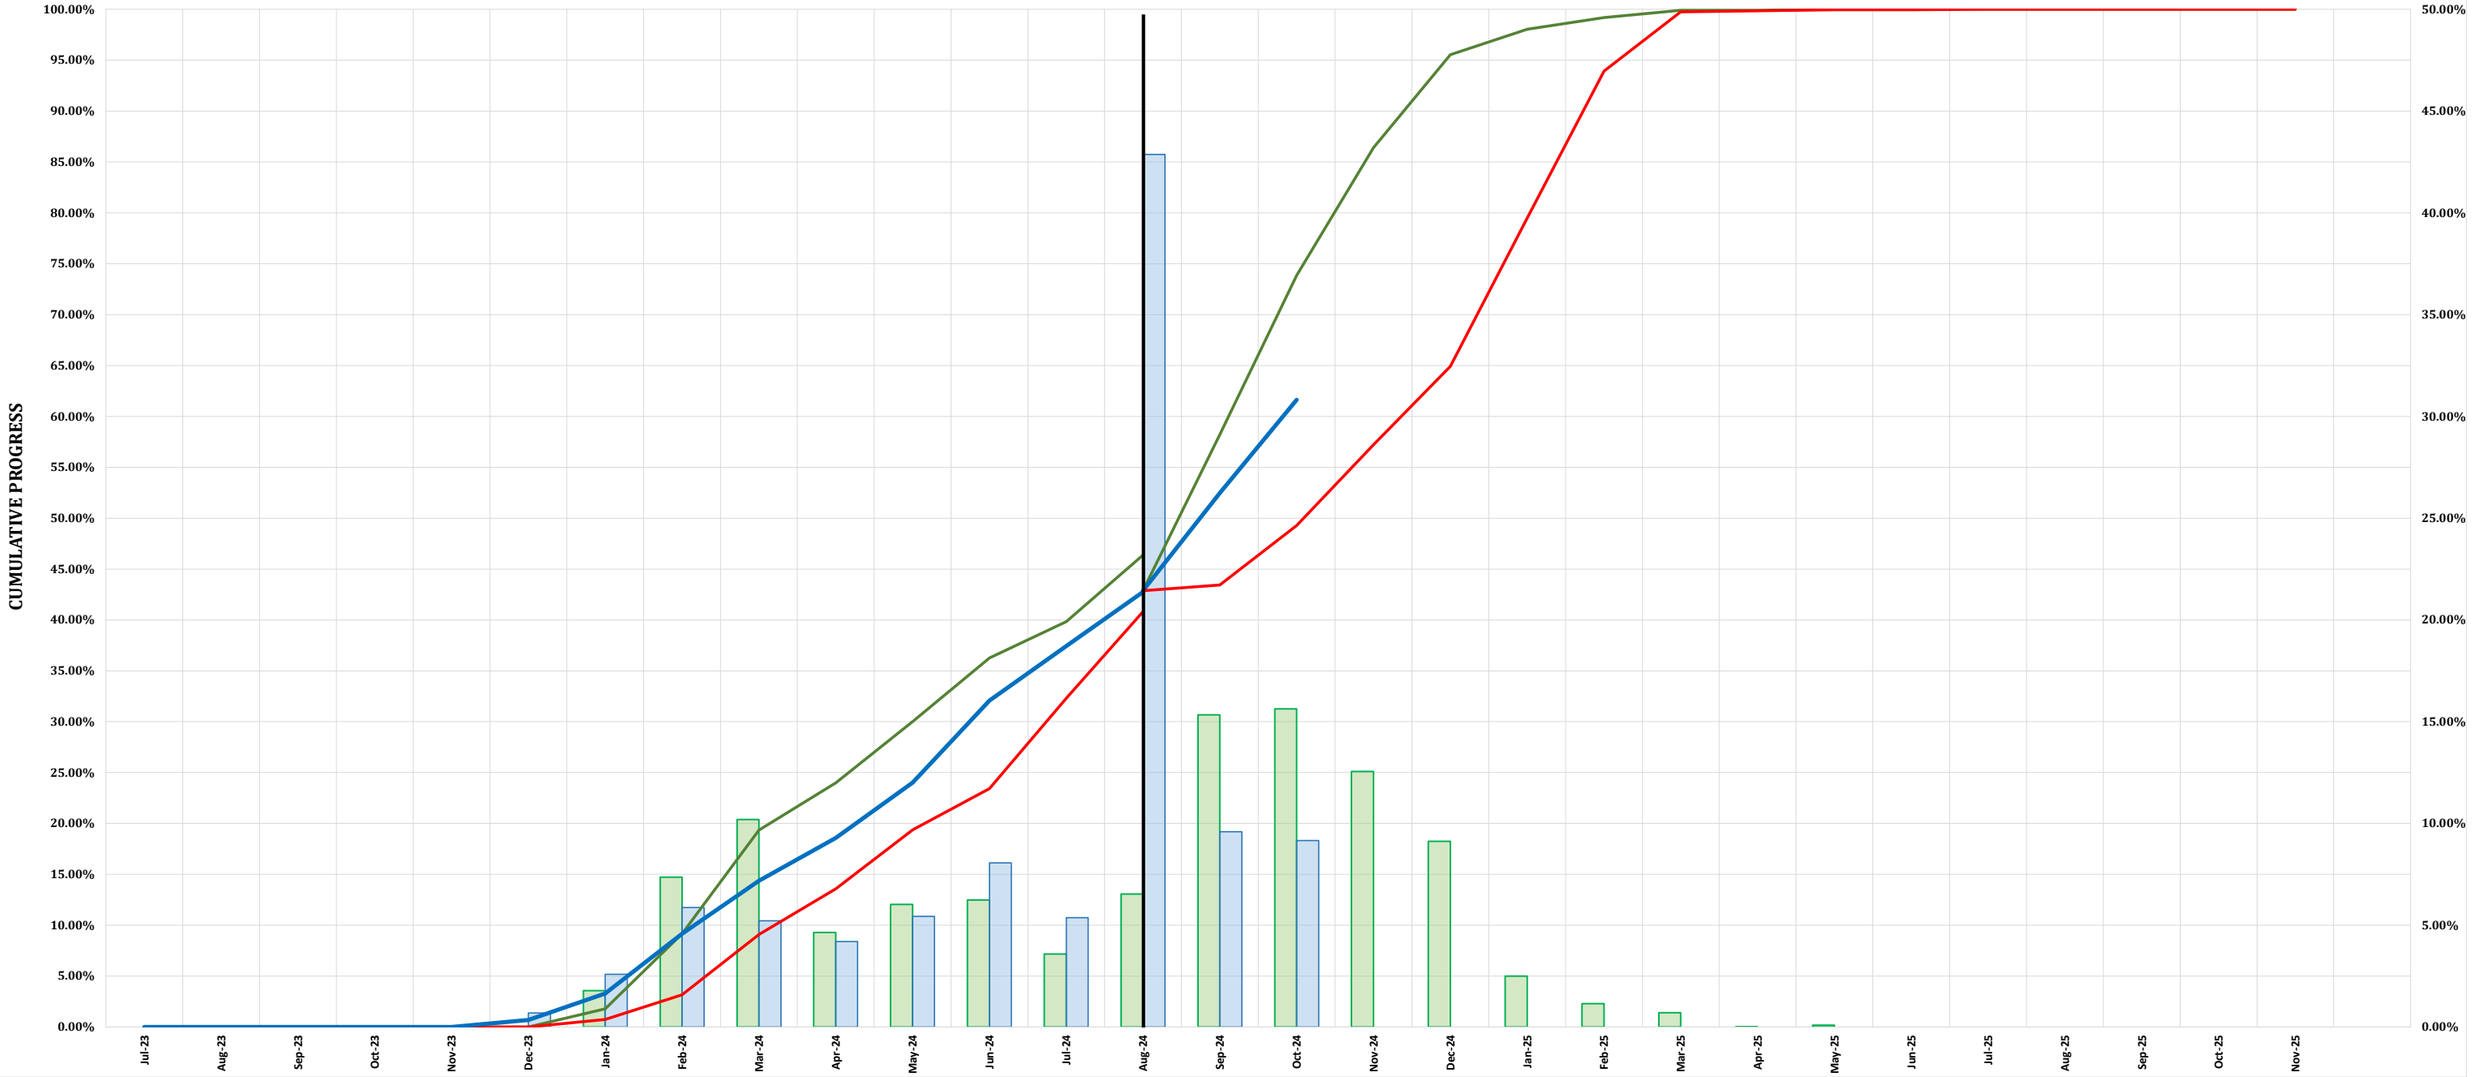

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														42.87%	58.21%	73.84%	86.40%	95.53%	98.03%	99.18%	99.89%	99.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														42.87%	43.43%	49.28%	57.21%	64.93%	79.48%	93.92%	99.74%	99.85%	99.95%	99.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														42.87%	52.46%	61.63%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.78%	7.37%	10.20%	4.65%	6.02%	6.23%	3.58%	6.54%	15.34%	15.63%	12.56%	9.13%	2.50%	1.15%	0.71%	0.02%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	2.59%	5.87%	5.21%	4.20%	5.43%	8.06%	5.38%	42.87%	9.59%	9.17%													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
ONSHORE COMMISSIONING & INTEGRATED TESTING


ROSETTI MARINO

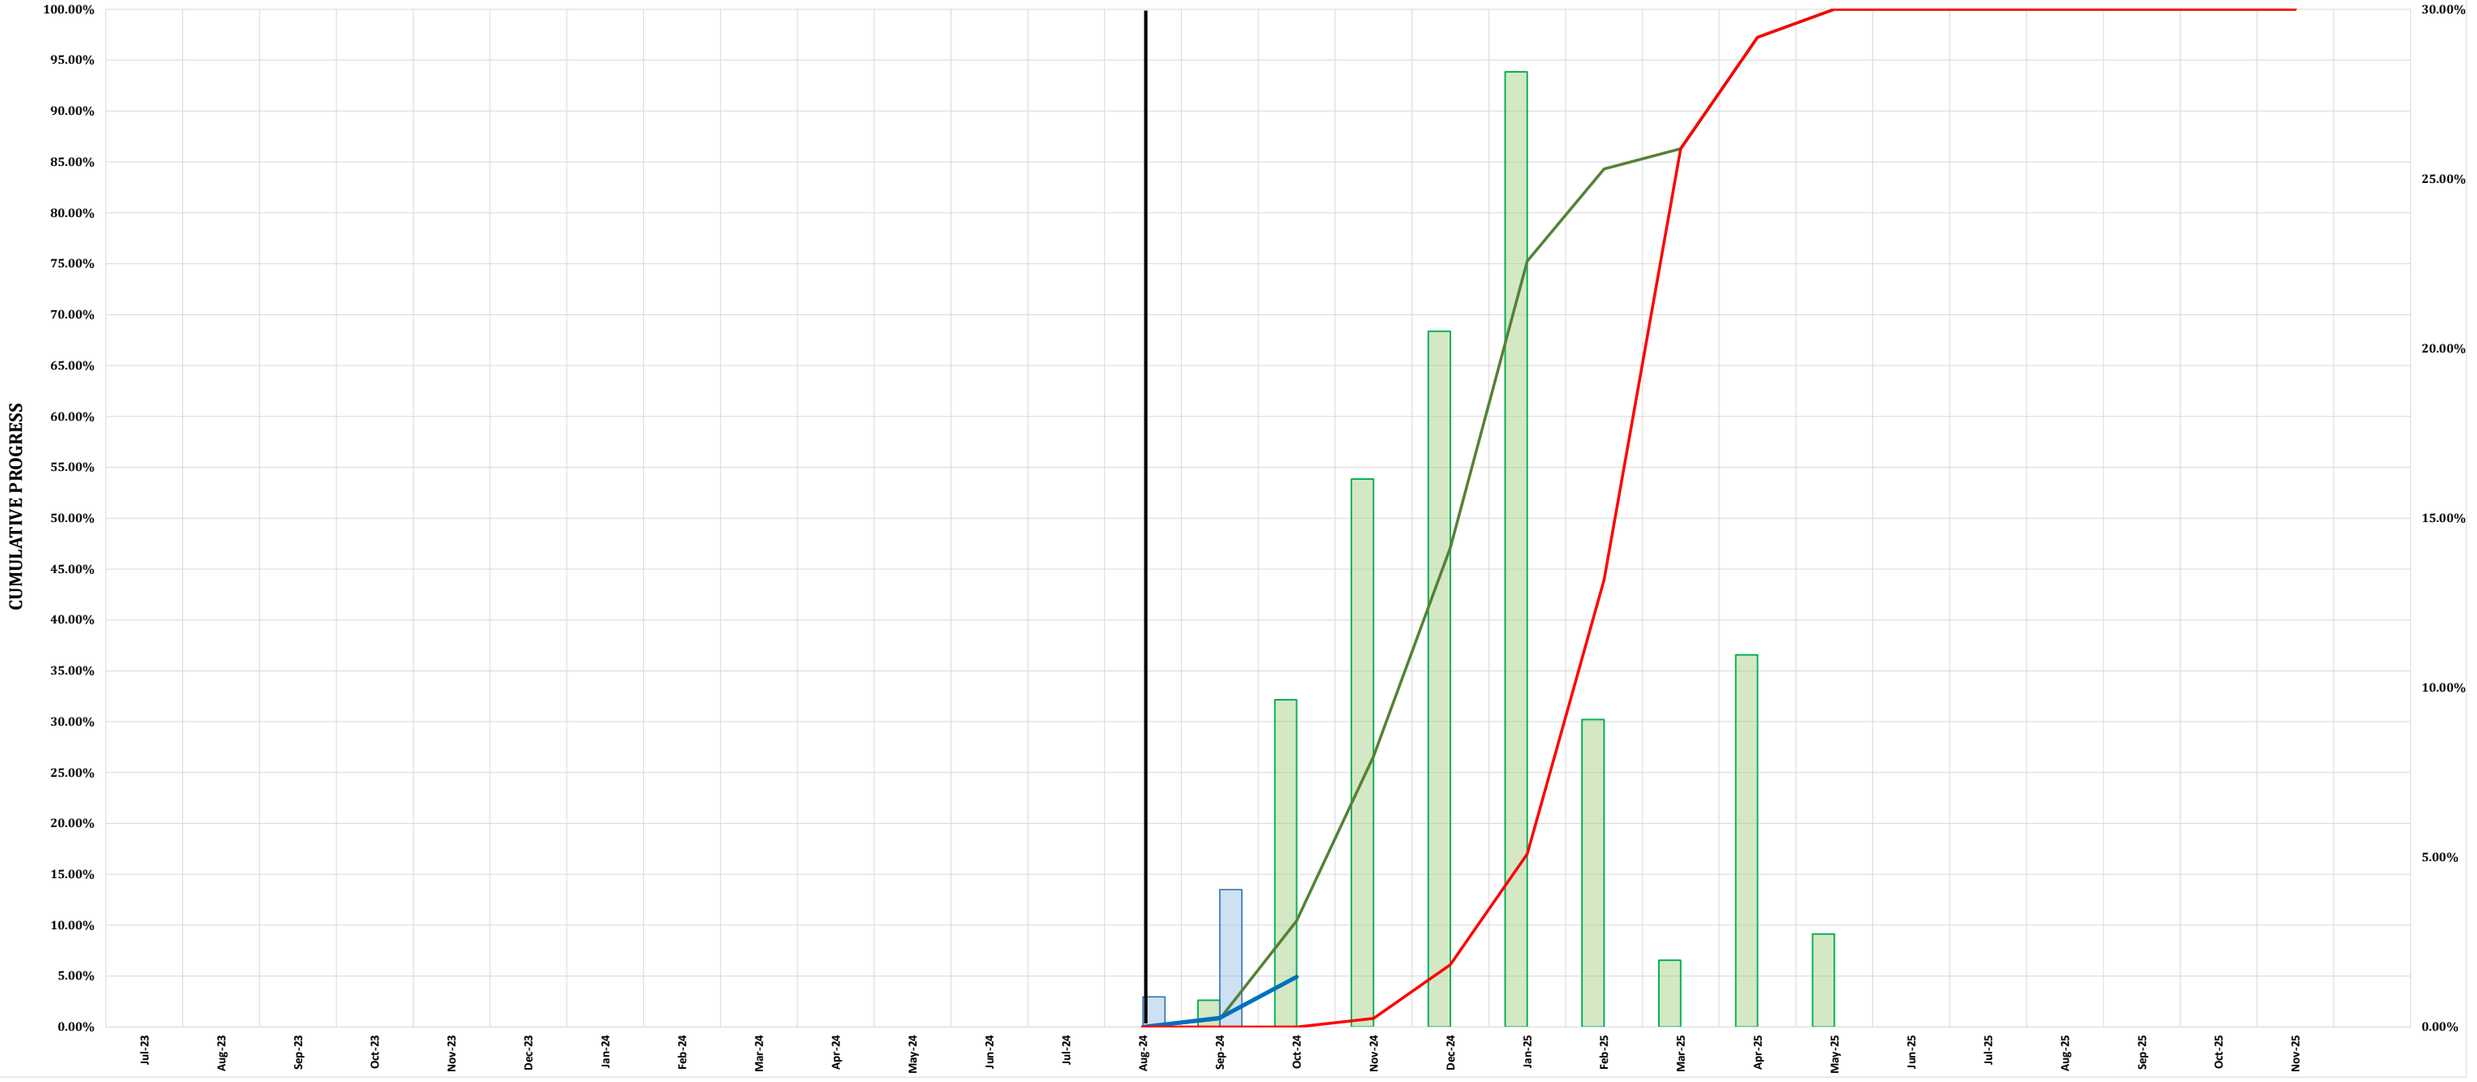

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														0.00%	0.79%	10.43%	26.59%	47.10%	75.25%	84.32%	86.29%	97.26%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	6.13%	17.00%	43.95%	86.29%	97.26%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														0.00%	0.89%	4.94%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.79%	9.64%	16.16%	20.51%	28.16%	9.07%	1.97%	10.97%	2.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.89%	4.05%													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project
TRANSPORTATION

ROSETTI MARINO

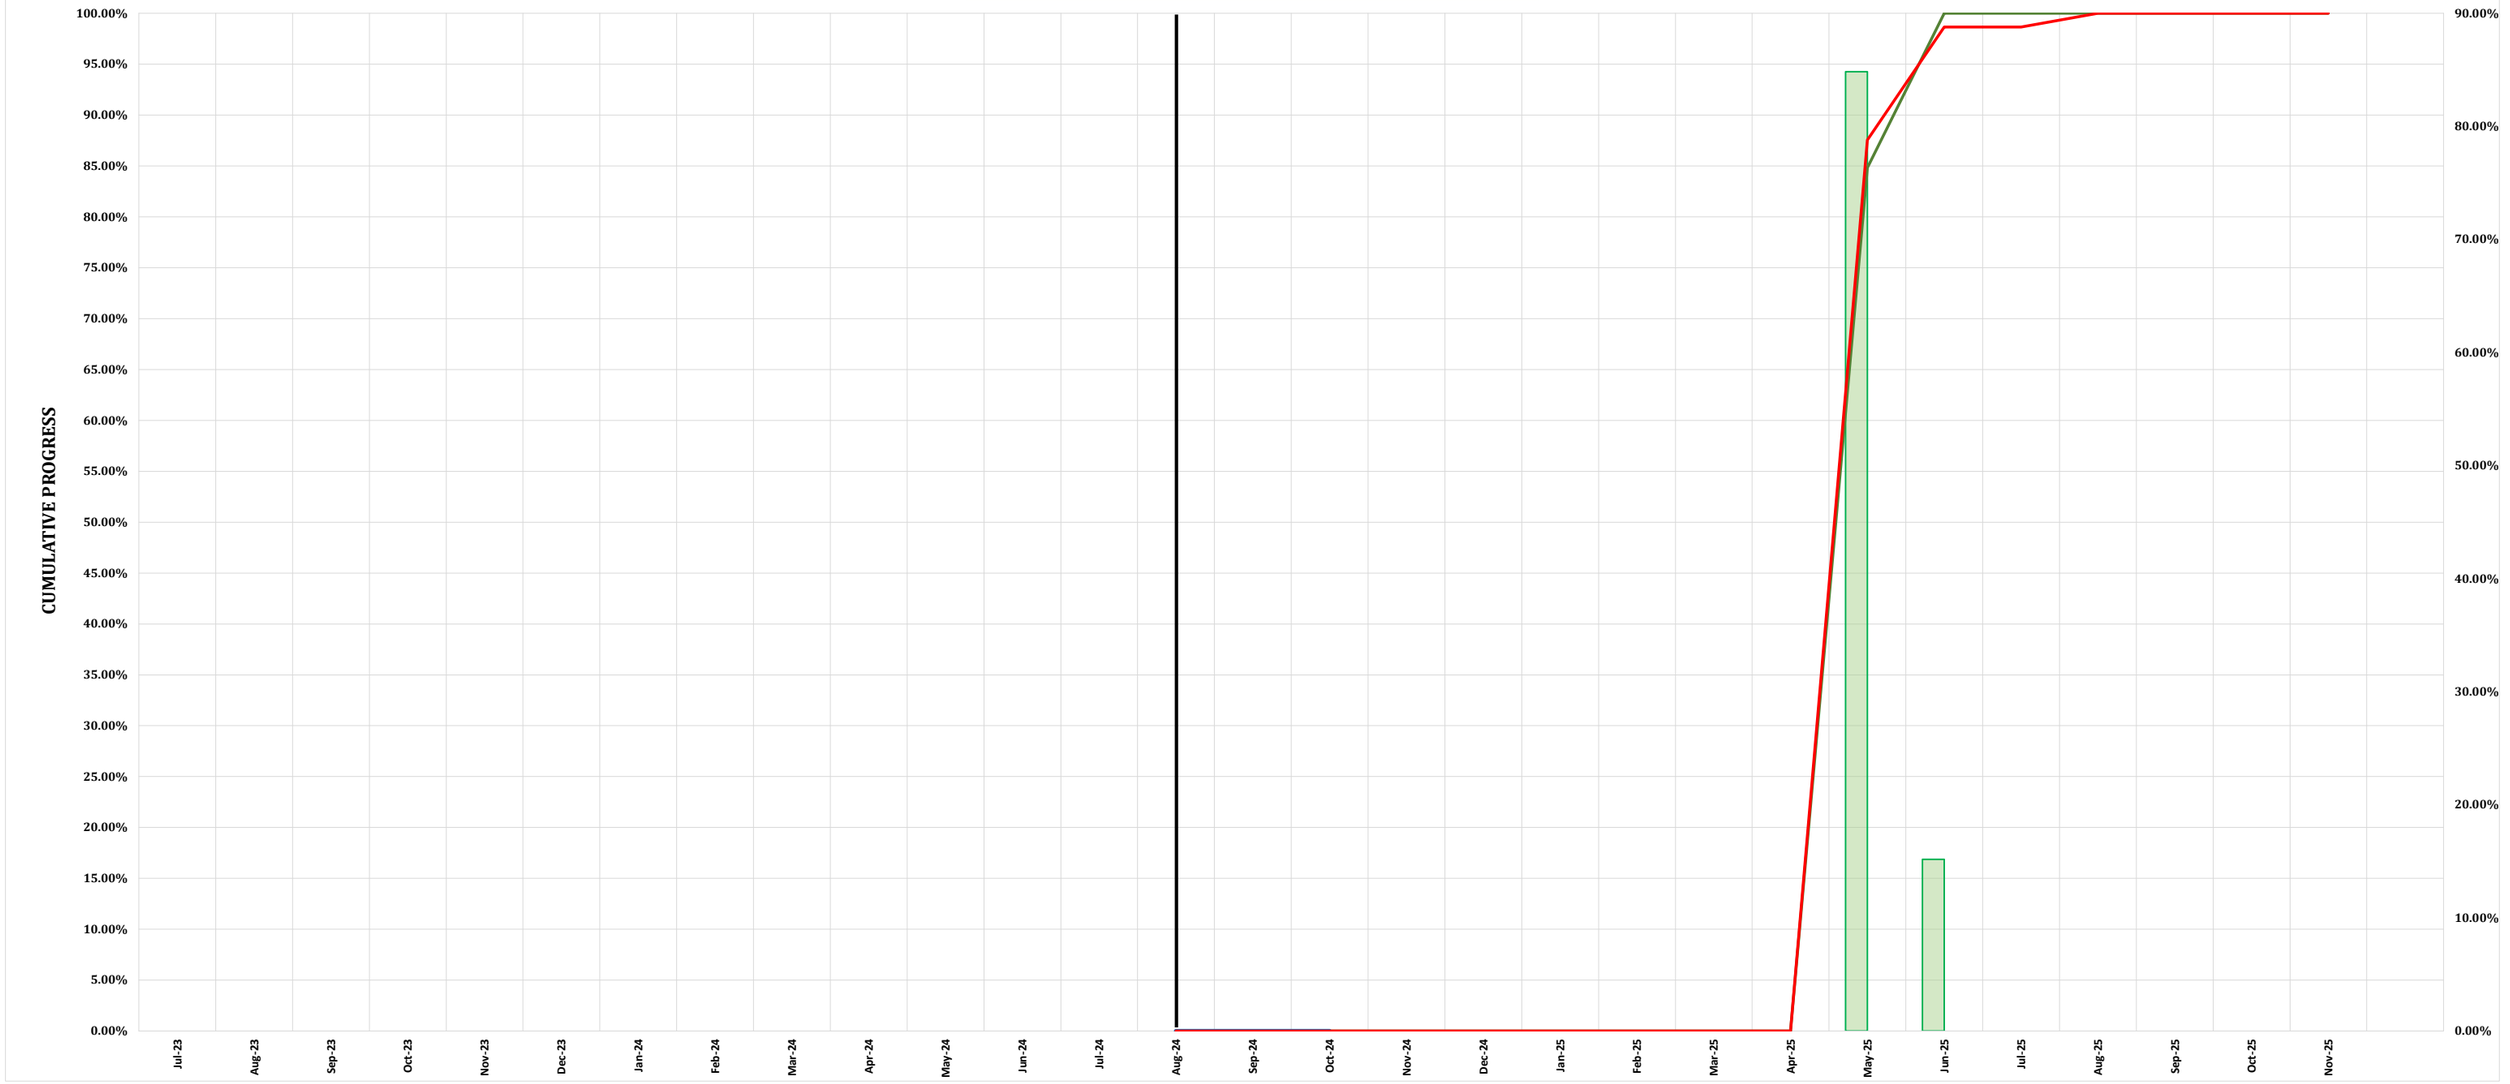


	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.55%	98.64%	98.64%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														0.00%	0.00%	0.00%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.83%	15.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

INSTALLATION AT PROJECT SITE

ROSETTI MARINO

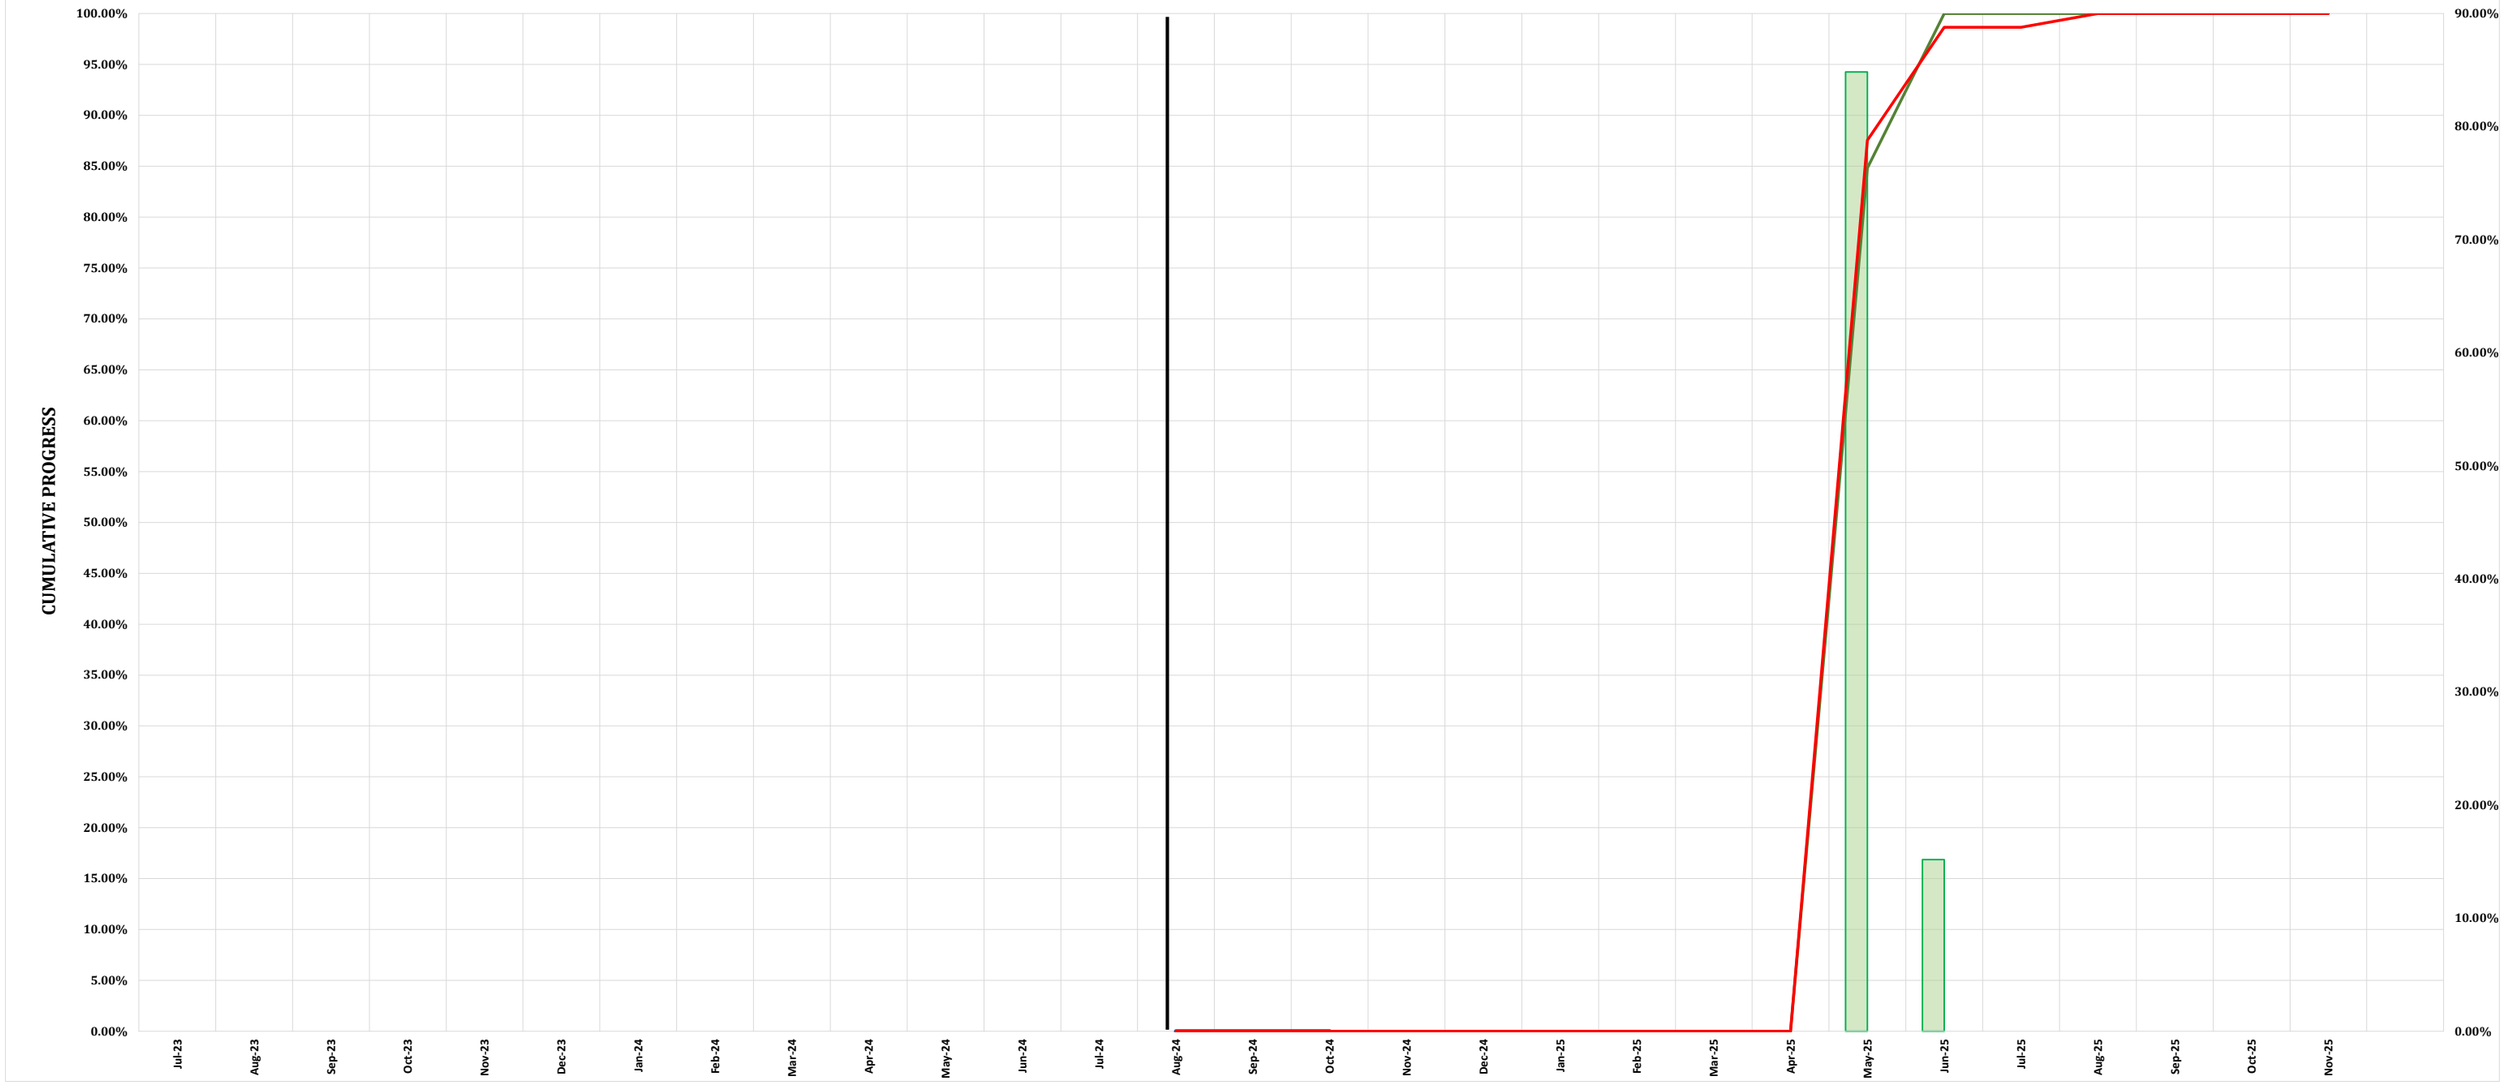

	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.55%	98.64%	98.64%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														0.00%	0.00%	0.00%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.83%	15.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													

HOLLANDSE KUST NOORD WIND PARK Project

OFFSHORE HOOK-UP, COMMISSIONING & START-UP

ROSETTI MARINO



	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25
CUM. EARLY														0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.84%	85.48%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. LATE														0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.68%	93.55%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CUM. ACTUAL														0.00%	0.00%	0.00%													
PERIOD PLANNED		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.84%	80.65%	14.52%	0.00%	0.00%	0.00%
PERIOD ACTUAL		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													
